

Έτοιμα και ασφαλή τα κλιματιστικά στα σχολεία;

Έλεγχος για την εγκατάσταση
κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία



ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ



Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

Πίνακας Περιεχομένων

Προλογισμός Γενικού Ελεγκτή	3
Πίνακας Συντομογραφιών	3
1. Σύνοψη αποτελεσμάτων ελέγχου	4
2. Εισαγωγή	13
3. Ανάλυση ευρημάτων και συστάσεις	14
4. Παραρτήματα.....	67

Προλογισμός Γενικού Ελεγκτή

Η εγκατάσταση κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία είναι ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο, το οποίο εφαρμόζεται παγκύπρια, με τις όποιες προκλήσεις αυτό συνεπάγεται. Πρόκειται για ένα έργο που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών μάθησης και εργασίας. Για να αποφευχθούν κίνδυνοι και να τηρηθούν τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα, απαιτούσε εξ αρχής καλό προγραμματισμό, συντονισμό και αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφάλειας.

Σοβαροί κίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία

Τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου μας προκαλούν σοβαρή ανησυχία. Σε τέσσερα από τα πέντε σχολεία που επισκεφθήκαμε 24/9/2026, τα οποία περιλαμβάνονταν μεταξύ των σχολείων όπου το ΥΠΑΝ δηλώνει ότι οι εργασίες εγκατάστασης έχουν ολοκληρωθεί, εκκρεμούν βασικές εργασίες. Εντοπίσαμε κλιματιστικά εγκατεστημένα σχεδόν δύο χρόνια αλλά μη συνδεδεμένα, άλλα που λειτουργούσαν εκ περιτροπής για αποφυγή υπερφόρτωσης, πρόχειρες ηλεκτρολογικές συνδέσεις και ηλεκτρικό πίνακα με αφαιρεμένη διάταξη ασφαλείας. Μας αναφέρθηκε, επίσης, περίπτωση όπου διακόπτης προστασίας έπεσε και επαναφέρθηκε επτά φορές την ίδια ημέρα.

Η εικόνα αυτή αναμφιβόλως προκύπτει λόγω της παράκαμψης των προβλεπόμενων σταδίων υλοποίησης, εις γνώση μάλιστα του ΥΠΑΝ. Κλιματιστικά τέθηκαν σε λειτουργία χωρίς να έχει προηγηθεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης καθώς και η τελική επιθεώρηση και έγκριση. Η πρακτική αυτή εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Η λειτουργία τέτοιων κλιματιστικών, κατά την άποψη μας, πρέπει να τερματιστεί άμεσα μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Απουσία καλού σχεδιασμού και συντονισμού

Σχετικά με την υλοποίηση του έργου (2023-2026) το ΥΠΑΝ ήταν απών στη μεγαλύτερη διάρκεια του Έργου, αφού επέλεξε να αναθέσει στις Σχολικές Εφορείες να διαχειριστούν μόνες ένα έργο για το οποίο δεν διέθεταν την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Κεντρικός συντονιστής από το ΥΠΑΝ ορίστηκε μόλις στην τρίτη φάση. Ο κατακερματισμός, η ανεπαρκής έρευνα αγοράς και τα περιοριστικά κριτήρια συμμετοχής περιόρισαν τον ανταγωνισμό, με συνέπειες στο χρόνο υλοποίησης και πιθανώς στις τιμές.

Ανάγκη διαφάνειας

Το ΥΠΑΝ με την πληροφόρηση που παρείχε στην Υπηρεσία μας κατά την περίοδο του ελέγχου δεν έδινε σαφή εικόνα για το αντικείμενο του Έργου (αριθμό σχολείων) και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Αναλυτική κατάσταση με όλα τα σχολεία δόθηκε στην Υπηρεσία μας μόνο μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και όπως αποδείχθηκε, με σοβαρά λάθη. Συναφές είναι και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κατάσταση δεν έχει δημοσιοποιηθεί από το ΥΠΑΝ, ώστε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τι πραγματικά ισχύει για κάθε σχολείο. Η δημοσιοποίησή της θα επέτρεπε παράλληλα να εντοπίζονται εύκολα τυχόν ανακρίβειες στην πληροφόρηση για την πρόοδο του Έργου.

Ένα δύσκολο έργο αναπόφευκτα θα συναντήσει προβλήματα. Αυτό που απαιτείται όμως είναι σωστός σχεδιασμός, ουσιαστικός συντονισμός και διαφάνεια. Και όταν πρόκειται για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών, δεν υπάρχουν περιθώρια για εκπτώσεις. Το ΥΠΑΝ θα πρέπει άμεσα να λάβει διορθωτικά μέτρα.

Ανδρέας Παπακωνσταντίνου
Γενικός Ελεγκτής

Πίνακας Συντομογραφιών

ΑΑ	Αναθέτουσα/ες Αρχή/ές
ΑΗΚ	Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
ΓΔ	Γενικός/ή Διευθυντής/τρια
ΓΛτΔ	Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
ΔΣΑ	Δυναμικό Σύστημα Αγορών
Οδηγός	Οδηγός Εγκατάστασης Συστημάτων Κλιματισμού σε Σχολικά Κτήρια του ΥΠΑΝ
ΗΜΥ	Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
ΟΦ	Οικονομικός/οί Φορέας/είς
ΣχΕΦ	Σχολική/ές Εφορεία/ες
ΤΕΣΕΚ	Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
ΥΠΑΝ	Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
BTU	British Thermal Unit, Μονάδα μέτρησης της θερμικής ενέργειας
e-Agora	Ηλεκτρονική αγορά που έχει αναπτυχθεί από το ΓΛτΔ με σκοπό τη διευκόλυνση των αγορών χαμηλής αξίας από τις ΑΑ. Λειτουργεί ως ψηφιακή πλατφόρμα όπου οι ΟΦ μπορούν να αναρτούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, δίνοντας τη δυνατότητα στο Δημόσιο Τομέα να πραγματοποιεί γρήγορες και απλοποιημένες προμήθειες/υπηρεσίες.
eProcurement	Διαδικτυακή εφαρμογή για την εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στη διεξαγωγή των Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων.
kVA	Kilovolt-amperes, Μονάδα μέτρησης της φαινομενικής ισχύος

1. Σύνοψη αποτελεσμάτων ελέγχου

Η εγκατάσταση κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία (εφεξής το «Έργο») εξαγγέλθηκε το 2023 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αποτελεί παρέμβαση για τη βελτίωση των συνθηκών μάθησης και εργασίας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο (παρόλο που πρέπει να σημειώσουμε ότι Ιούλιο – Αύγουστο τα σχολεία είναι κλειστά).

Πρόκειται, παράλληλα, για σύνθετο και απαιτητικό έργο, καθώς σημαντικό μέρος των σχολικών κτηριακών εγκαταστάσεων είναι παλαιό και, σε αρκετές περιπτώσεις, η εγκατάσταση κλιματιστικών προϋποθέτει προηγούμενη αναβάθμιση ή αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, γεγονός που αυξάνει το τεχνικό αντικείμενο, το κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης. Επίσης η εξεύρεση διαθέσιμων πιστοποιημένων ηλεκτρολόγων αποτελεί επίσης μια πρόκληση.

Το Έργο αφορούσε αρχικά την εφαρμογή κλιματιστικών σε 209 σχολεία και η υλοποίηση θα γινόταν σε τρεις φάσεις. Το Έργο ανατέθηκε από το ΥΠΑΝ στις μητροπολιτικές σχολικές εφορείες, οι οποίες ανέλαβαν την υλοποίηση. Το Έργο δεν φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων, δηλαδή εντός του 2026, αφού αντιμετώπισε διάφορες δυσκολίες. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί τέλη του 2028 με την εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία.

1.1 Σοβαροί Κίνδυνοι από παράκαμψη της νόμιμης διαδικασίας

Ανεξαρτήτως της σημασίας του έργου καθώς και των τυχόν πιέσεων που ενδεχομένως να ασκούνται στο ΥΠΑΝ για την ταχεία υλοποίηση του έργου, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται, εις γνώση μάλιστα του Υπουργείου, να λειτουργούν κλιματιστικά σε σχολεία χωρίς πρώτα να υπάρχει το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία τελικού ελέγχου.

Το ίδιο το Υπουργείο σε πρόσφατη ανακοίνωση του στις 18/5/2026, μεταξύ άλλων αναφερόταν για τη σημασία που αποδίδει στην ασφάλεια των μαθητών: «.....(το έργο) προϋποθέτει την αναβάθμιση ή ενίσχυση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων, ώστε η λειτουργία των κλιματιστικών να γίνεται με πλήρη ασφάλεια για τους μαθητές, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και για τις ίδιες τις σχολικές υποδομές».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης «.....κάθε περίπτωση αξιολογείται τεχνικά και προωθείται με τρόπο που να διασφαλίζει τόσο την ταχύτητα υλοποίησης όσο και την τήρηση όλων των απαιτούμενων προτύπων ασφάλειας. Σε ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των παιδιών και των σχολείων δεν μπορεί και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία έκπτωση».


Παραταύτα, από επιτόπιο έλεγχο της Υπηρεσίας μας στις 24/9/2026 σε συγκεκριμένα σχολεία, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα του Υπουργείου με την ένδειξη ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν, εντοπίσαμε σοβαρές παραβάσεις της προβλεπόμενης - νόμιμης διαδικασίας.

Από τα πέντε σχολεία που επισκεφθήκαμε, τα οποία το ΥΠΑΝ παρουσίαζε ως ολοκληρωμένα, στα τέσσερα εκκρεμούσαν βασικές εργασίες. Πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκαν τα εξής:

- κλιματιστικά να είναι τοποθετημένα για σχεδόν 2 χρόνια (λήγει η εγγύηση) αλλά να μην είναι συνδεδεμένα,

- κλιματιστικά λειτουργούσαν εκ περιτροπής ώστε να αποφεύγεται υπερφόρτωση,
- υπάρχουν πρόχειρες ηλεκτρολογικές συνδέσεις εκτεθειμένες σε κοινή θέα,
- ηλεκτρικός πίνακας με αφαιρεμένη τη διάταξη ασφαλείας (μανδάλωση) της θύρας, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πρόσβαση στον πίνακα χωρίς την προηγούμενη απομόνωση της ηλεκτρικής παροχής. Ενδεχομένως αυτό έγινε λόγω της ανάγκης συχνής επαναφοράς του διακόπτη μετά από πτώση λόγω υπερφόρτωσης και
- Μας αναφέρθηκε περίπτωση κατά την οποία διακόπτης προστασίας ηλεκτρικού πίνακα έπεσε και επαναφέρθηκε επτά φορές εντός της ίδιας ημέρας.

Τα πιο πάνω ευρήματα αφορούν τις σχολικές μονάδες που επισκεφθήκαμε και δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά του συνόλου. Ωστόσο, η φύση και η σοβαρότητά τους καθιστούν, κατά την άποψη μας, αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων (βλ. Σύσταση Ελεγκτικής Υπηρεσίας, πιο κάτω).

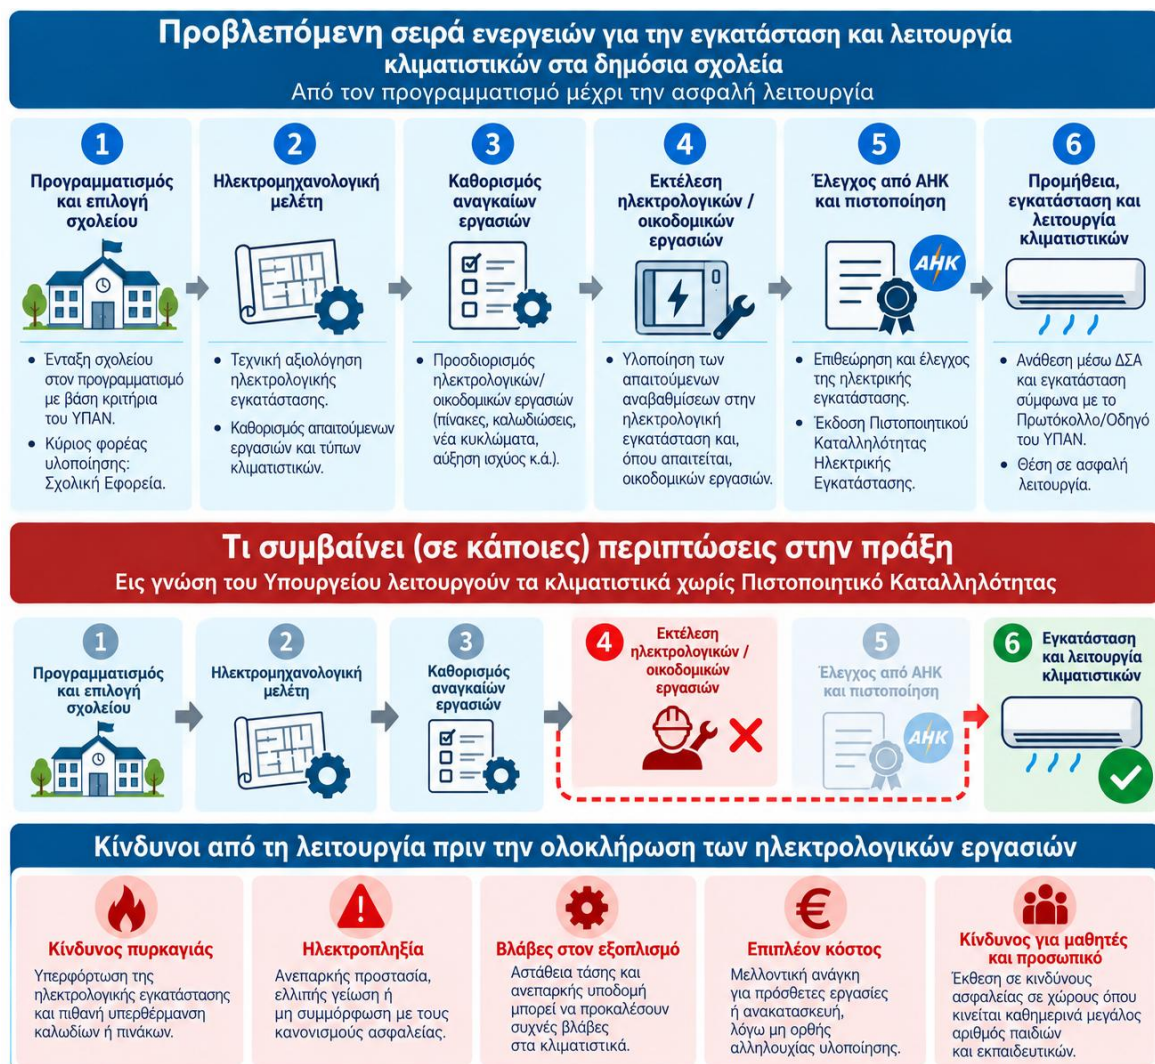

Σύσταση Ελεγκτικής Υπηρεσίας

- Άμεση αποσύνδεση και τερματισμός λειτουργίας κλιματιστικών τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε σχολεία στα οποία δεν έχουν περάσει τα στάδια τελικής επιθεώρησης, ελέγχου και πιστοποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Να εξετασθούν τυχόν ευθύνες για τα άτομα στο Υπουργείο ή/και στις Σχολικές Εφορείες που επέτρεψαν τη λειτουργία των κλιματιστικών χωρίς να έχει πρώτα ολοκληρωθεί η κανονική – νόμιμη διαδικασία. Το Υπουργείο καθώς ή/και οι Σχολικές Εφορείες δεν νομιμοποιούνται να παρακάμπτουν τη προβλεπόμενη διαδικασία η οποία θεσπίστηκε ώστε να διασφαλίζεται το ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας προς προστασία της δημόσιας υγείας.

Σημαντική Υποσημείωση: Σημειώνουμε ότι τα πιο πάνω που αφορούν στα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου, ο οποίος διεξήχθη μετά την ολοκλήρωση του κανονικού ελέγχου και την ετοιμασία προσχεδίου της Έκθεσης, στάλθηκαν στο ΥΠΑΝ για σχόλια την προηγούμενη της δημοσίευσης της Έκθεσης. Η απάντηση του ΥΠΑΝ για το συγκεκριμένο θέμα επισυνάπτεται αυτούσια στο **Παράρτημα IV**.

1.2 Ανακολουθία στόχων και χρονοδιαγραμμάτων από το ΥΠΑΝ

Το ΥΠΑΝ δεν περιέγραψε με σαφήνεια το πραγματικό αντικείμενο του Έργου. Εντοπίζονται από το 2023 μέχρι σήμερα, σχετικές δημόσιες αναφορές από το ΥΠΑΝ που καθόριζαν το αντικείμενο ως εξής:

- Εφαρμογή κλιματιστικών σε τρεις φάσεις
- Εφαρμογή κλιματιστικών σε 209 σχολεία που επιλέχθηκαν στη βάση κριτηρίων
- Καθολική εφαρμογή κλιματιστικών, όπου απαιτείται
- Εφαρμογή κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία
- Εφαρμογή κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία πλην κάποιων εξαιρέσεων όπου δεν είναι εφικτό

Αφού η Υπηρεσία μας ολοκλήρωσε το έλεγχο της (στη βάση των πληροφοριών – απαντήσεων που δόθηκαν από το ΥΠΑΝ για τις τρεις φάσεις και τα 209 επιλεγμένα σχολεία) και απέστειλε τον Αύγουστο 2026 προσχέδιο της Ειδικής Έκθεσης προς το ΥΠΑΝ για τα δικά του σχόλια (όπου παρουσιάζονταν μεταξύ άλλων τα ποσοστά υλοποίησης του Έργου), το ΥΠΑΝ ενημέρωσε την ΕΥ ότι:

- το Έργο δεν αφορά μόνο στα 209 επιλεγμένα σχολεία αλλά όλα τα σχολεία παγκύπρια χωρίς διακριτές φάσεις και
- ότι το όλο Έργο θα ολοκληρωθεί το 2028

Η ίδια η Υπουργός ενώ επιβεβαίωνε ότι το Έργο θα ολοκληρωνόταν μέχρι τα τέλη του 2026 (οπότε προφανώς αναφερόταν για τις τρεις πρώτες φάσεις που αφορούσαν τα 209 σχολεία), πρόσφατα (και αφού ουσιαστικά ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της Υπηρεσίας μας), μας ανέφερε ότι το Έργο αφορά στα 758 σχολεία και θα ολοκληρωθεί το 2028.

Η Υπηρεσία μας μετά την διαφοροποίηση του ΥΠΑΝ (λίγες μέρες πριν τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης μας) αποφάσισε:

- Όπως προχωρήσει στη δημοσιοποίηση της Έκθεσης με τις αναφορές για τις τρεις φάσεις. Η κατάσταση υλοποίησης στα 209 σχολεία που είχαν ενταχθεί στις τρεις φάσεις παρέχει σαφή

εικόνα της προόδου του συγκεκριμένου σκέλους του Έργου, το οποίο προβλεπόταν να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026.

- Να ζητήσει αναλυτική κατάσταση με όλα τα σχολεία και την πρόοδο υλοποίησης σε κάθε σχολείο. Στη βάση αυτή προέβη σε επιτόπιο έλεγχο για να εξετάσει την αξιοπιστία της αναλυτικής κατάστασης (βλ. σημείο 1.1).

Άποψη της ΕΥ:

- Από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν μας δεν προκύπτει ότι εξαρχής είχε καθοριστεί με σαφήνεια το συνολικό αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος υλοποίησης του Έργου.
- Ο κεντρικός συντονισμός από το ΥΠΑΝ ήταν περιορισμένος κατά σημαντικό μέρος της περιόδου υλοποίησης, ενώ κεντρικός συντονιστής ορίστηκε τον Απρίλιο 2026.
- Περί τα τέλη του 2025 και κατά το 2026 προκύπτει ενεργότερη εμπλοκή του ΥΠΑΝ στον συντονισμό του Έργου.
- Πριν από τη λήξη του αρχικού χρονοδιαγράμματος, το αντικείμενο παρουσιάστηκε πλέον ως παγκύπρια εγκατάσταση στα 758 σχολεία και ο χρόνος ολοκλήρωσης μετατέθηκε από το 2026 στο 2028

Σύσταση Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Το ΥΠΑΝ οφείλει να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα αναλυτική κατάσταση όλων ανεξαιρέτως των δημόσιων σχολείων, υποδεικνύοντας για το κάθε ένα, αν και πότε προγραμματίζεται η εγκατάσταση κλιματιστικών και σε ποιο βαθμό βρίσκεται σήμερα η υλοποίηση. Η συγκεκριμένη κατάσταση θα πρέπει να τυγχάνει συνεχούς επικαιροποίησης ώστε να γνωρίζει ο κάθε πολίτης πως εξελίσσεται η υλοποίηση του Έργου. Αυτό πέραν της επιβαλλόμενης διαφάνειας, θα επιτρέψει τη δυνατότητα ελέγχου για την ορθότητα της πληροφόρησης.

1.3 Κατάσταση του Έργου μέχρι τον Ιούλιο 2026 για τα 209 σχολεία

(όπως αναφέραμε πιο πάνω, με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το ΥΠΑΝ μας ενημέρωσε ότι πέραν των 209 σχολείων βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση κλιματιστικών στα υπόλοιπα σχολεία. Συνεπώς τα πιο κάτω στοιχεία αναδεικνύουν το βαθμό υλοποίησης για τα 209 σχολεία και όχι για το σύνολο των δημόσιων σχολείων).


(α) Χρόνος

Μέχρι τον Ιούλιο 2026 (σημείο που ολοκληρώθηκε ο έλεγχος μας) η κατάσταση προόδου του Έργου (όπως καθορίστηκε για τα 209 σχολεία) είχε ως εξής:

- Οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί σε 81 από τις 219 περιπτώσεις (παρόλο που το έργο αφορά 209 σχολεία, προκύπτουν 219 περιπτώσεις αφού οι εργασίες σε 10 από αυτά τα σχολεία θα υλοποιηθούν σε δύο φάσεις) δημόσιων σχολείων που έχουν ενταχθεί στο υπό αναφορά Έργο (ποσοστό 37%), σε 79 εκκρεμούσαν οι ηλεκτρολογικές εργασίες, σε 52 ήταν σε εξέλιξη η εγκατάσταση των κλιματιστικών, έξι ήταν σε αναμονή ελέγχου από την ΑΗΚ, ενώ σε ένα σχολείο δεν είχαν αρχίσει οι εργασίες.


- Η πρόοδος υλοποίησης του Έργου παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ των ΣχΕφ. Το υψηλότερο ποσοστό ολοκλήρωσης καταγράφεται στη ΣχΕφ Λάρνακας, όπου οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε 19 από τα 22 σχολεία (86%). Ακολουθεί η ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας με 12 από τα 28 σχολεία (43%), η ΣχΕφ Λεμεσού με 23 από τα 57 σχολεία (40%), η ΣχΕφ Πάφου με 9 από τα 23 σχολεία (39%) και τέλος η ΣχΕφ Λευκωσίας με 18 από τα 89 σχολεία (20%). Τα ποσοστά βέβαια από μόνα τους δεν αποτυπώνουν τη συνολική προσπάθεια της κάθε σχολικής εφορείας αφού με βάση τις τρεις φάσεις, επιλέχθηκε διαφορετικός αριθμός σχολείων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Μέχρι τον Ιούλιο 2026

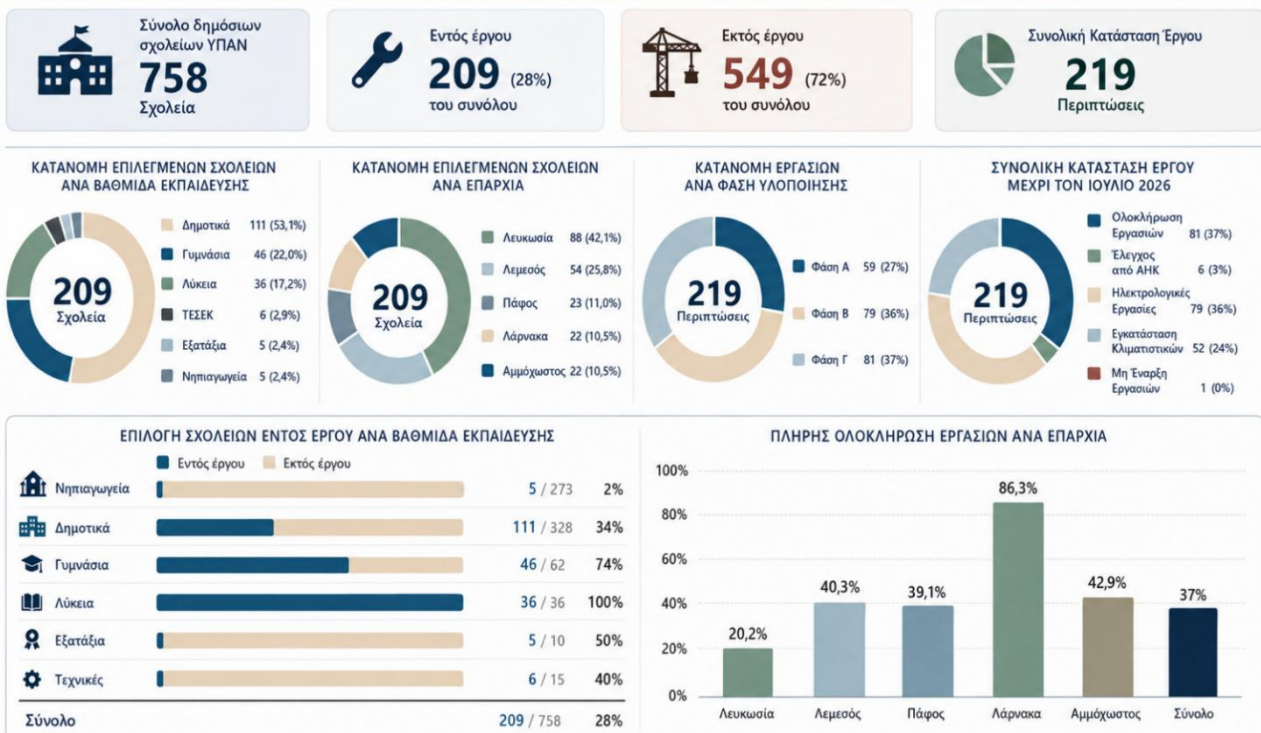


* Το έργο αφορά 209 σχολεία όμως προκύπτουν 219 περιπτώσεις αφού οι εργασίες στα 10 σχολεία θα υλοποιηθούν σε δύο φάσεις

Συνολική Κατάσταση Ολοκλήρωσης ανά ΣχΕφ - Ιούλιος 2026

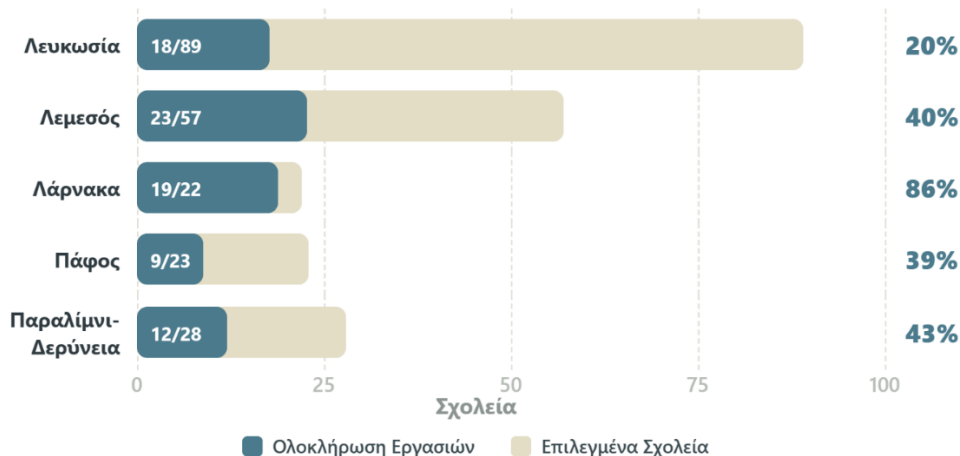

- Η υλοποίηση του Έργου στις τρεις φάσεις τον Ιούλιο 2026 είχε ως εξής:

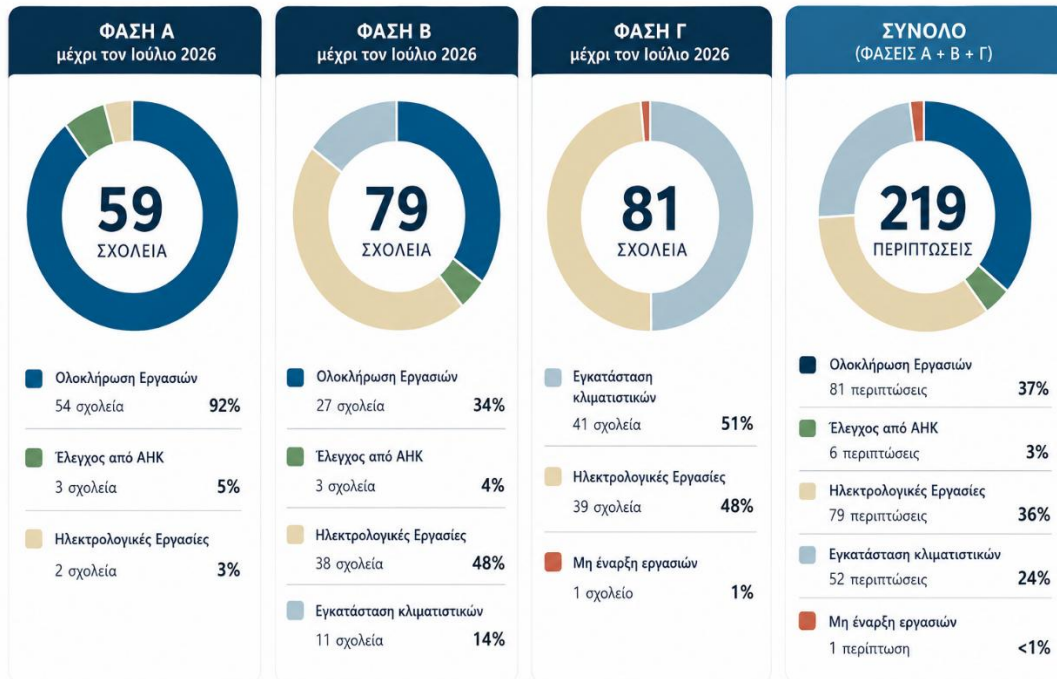


- Από τα πιο πάνω, αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του 2026, θα προκύψουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Έργου (εγκατάσταση κλιματιστικών σε 209 σχολεία).
- Πέραν των 209 σχολείων, το Υπουργείο δεν ήταν σε θέση, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, να μας υποβάλει ολοκληρωμένο πλάνο για τα υπόλοιπα σχολεία, με συγκεκριμένο προγραμματισμό και χρονοδιαγράμματα ανά σχολείο. Η Υπηρεσία μας ζήτησε μια τέτοια κατάσταση η οποία να αποτυπώνει το πλήρες πλάνο εγκατάστασης κλιματιστικών ανά σχολείο/επαρχία του Υπουργείου με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αλλά το Υπουργείο δεν ήταν σε θέση να μας την δώσει (μας δόθηκε η αναλυτική κατάσταση με όλα τα σχολεία μετά από διάστημα πέραν των 2 ετών και αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος). Η αδυναμία αυτή καταδεικνύει ελλείψεις στον συνολικό προγραμματισμό και στην έγκαιρη αποτύπωση του Έργου.

(β) Κατασκευαστές Κλιματιστικών

- Στο Έργο εγκαταστάθηκαν ή προγραμματίζεται να εγκατασταθούν συνολικά 5.165 κλιματιστικά, από τα οποία 1.278 αφορούν τη Φάση Α, 2.123 τη Φάση Β και 1.764 τη Φάση Γ. Από το σύνολο των πιο πάνω κλιματιστικών, τα 4.526 (ποσοστό 88%) είναι του κατασκευαστή Midea και τα υπόλοιπα 639 (ποσοστό 12%) του κατασκευαστή Gree. Η συγκέντρωση του συνόλου των κλιματιστικών σε δύο κατασκευαστές καταδεικνύει την ανάγκη εξέτασης των παραγόντων που οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, χωρίς αυτό να συνιστά κατ' ανάγκη από μόνο του περιορισμό του ανταγωνισμού.

Αριθμός κλιματιστικών ανά κατασκευαστή

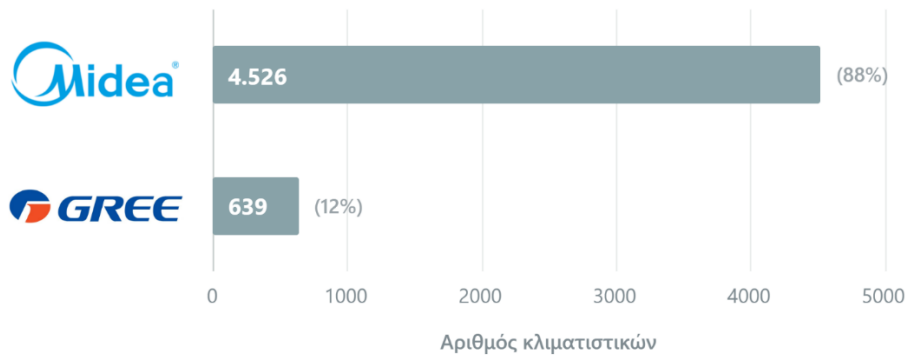

(γ) Κόστος

- Με βάση τα στοιχεία τα οποία μάς είχαν δοθεί από τις ΣΧΕΦ, μέχρι τον Ιούλιο 2026 το τρέχον κόστος του Έργου ανερχόταν σε €9.819.430 πλέον ΦΠΑ. Παρόλο ότι από τα στοιχεία τα οποία έχουμε λάβει διαπιστώνεται υπέρβαση της εκτιμώμενης δαπάνης σε αρκετούς διαγωνισμούς, σε υψηλά μάλιστα ποσοστά σε αρκετές περιπτώσεις, δεν μπορεί η υπέρβαση αυτή να ποσοτικοποιηθεί, λόγω της διαφορετικής μορφής, περιεχόμενο και ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων που μας έχουν δοθεί από τις ΣΧΕΦ.
- Η αποκεντρωμένη ανάθεση περιόρισε τη δυνατότητα συγκέντρωσης της ζήτησης και, κατ' επέκταση, αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας.

Τρέχον κόστος Έργου μέχρι τον Ιούλιο 2026




Προβλήματα Υλοποίησης του Έργου

- Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός του Έργου παρουσίασαν, ειδικά στα αρχικά στάδια, σημαντικές αδυναμίες. Η υλοποίηση ανατέθηκε το 2024 στις Σχολικές Εφορείες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Παραλιμνίου-Δερύνειας παρά την περιορισμένη τεχνική τους στελέχωση. Η ανάθεση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις ΣΧΕΦ σε ένα μεγάλο έργο αύξησε τον φόρτο εργασίας τους, χωρίς να τεκμηριώνεται ότι θα μπορούσαν επαρκώς να ανταποκριθούν, ενώ ο κεντρικός συντονιστικός ρόλος του ΥΠΑΝ ήταν περιορισμένος, ιδιαίτερα κατά τα αρχικά στάδια. Ενδεικτικό το γεγονός ότι το ΥΠΑΝ όρισε κεντρικό συντονιστή τον Απρίλιο 2026, όταν το Έργο βρισκόταν ήδη στην τρίτη και τελευταία φάση του.

- Ο τριετής σχεδιασμός του Έργου υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας τον Οκτώβριο 2025, ενώ είχε αρχικά αναφερθεί ότι θα ολοκληρωνόταν μέχρι τον Ιανουάριο 2024. Το γεγονός αυτό προκαλεί ερωτήματα κατά πόσο ο σχεδιασμός ολοκληρώθηκε εγκαίρως ώστε να δρομολογηθούν οι ανάλογες εργασίες. Η παροχή πληροφοριών από το ΥΠΑΝ προς την Υπηρεσία μας γενικότερα παρουσίασε ουσιώδεις καθυστερήσεις, γεγονός που δυσχέρανε τη διενέργεια και έγκαιρη ολοκλήρωση του ελέγχου.
- Ο Οδηγός Εγκατάστασης Συστημάτων Κλιματισμού σε Σχολικά Κτήρια, ο οποίος εκδόθηκε από το ΥΠΑΝ τον Μάρτιο 2024 για υποβολή των ΣΧΕΦ κατά την εκτέλεση του Έργου, δεν επικαιροποιήθηκε ώστε να περιλάβει τα Δυναμικά Συστήματα Αγορών (ΔΣΑ) που δημιουργήθηκαν μεταγενέστερα. Η μη επικαιροποίηση του Οδηγού περιορίζει την παρεχόμενη καθοδήγηση προς τις ΣΧΕΦ ως προς τη χρήση των ΔΣΑ, γεγονός το οποίο επηρεάζει αρνητικά την ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση του Έργου.
- Ο σχεδιασμός του Έργου δεν συνοδευόταν από αναλυτικό προϋπολογισμό ανά φάση, ανά ΣΧΕΦ ή ανά είδος δαπάνης (μελέτες, προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών, ηλεκτρολογικές εργασίες). Η απουσία αναλυτικού προϋπολογισμού περιορίζει τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού αποκλίσεων, αξιολόγησης της οικονομικότητας και πρόβλεψης τελικού κόστους του Έργου.
- Περιορισμένη ήταν η συμμετοχή οικονομικών φορέων (ΟΦ) στα τέσσερα Δυναμικά Συστήματα Αγορών (ΔΣΑ). Μέχρι τον Ιούνιο 2026 είχαν εγκριθεί τέσσερις ΟΦ στα ΔΣΑ Εγκαταστατών και ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων αντίστοιχα, ένας ΟΦ στο ΔΣΑ Μελετητών και κανένας στο ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων 150 kVA, με αποτέλεσμα την υποβολή μικρού αριθμού προσφορών και την ανεπαρκή ανάπτυξη ανταγωνισμού.
- Στους διαγωνισμούς εγκαταστατών κλιματιστικών και στους διαγωνισμούς ηλεκτρολόγων παρατηρήθηκε περιορισμένος ανταγωνισμός, υπερβάσεις των εκτιμώμενων αξιών και μη ενιαία εφαρμογή των διαδικασιών ανάθεσης από τις ΣΧΕΦ. Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι ιδιαίτερα υψηλές τεχνικές και επαγγελματικές απαιτήσεις που είχαν καθοριστεί από το ΥΠΑΝ ως προϋποθέσεις συμμετοχής, κυρίως στα έγγραφα του ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων, συνέβαλαν στον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και προσφορών. Η προετοιμασία και η έρευνα αγοράς που προηγήθηκαν δεν διασφάλισαν επαρκή συμμετοχή οικονομικών φορέων. Τα κριτήρια που τέθηκαν ήταν ιδιαίτερα υψηλά χωρίς αυτά να είναι αναλογικά των απαιτήσεων του Έργου.

Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς ανά ΔΣΑ

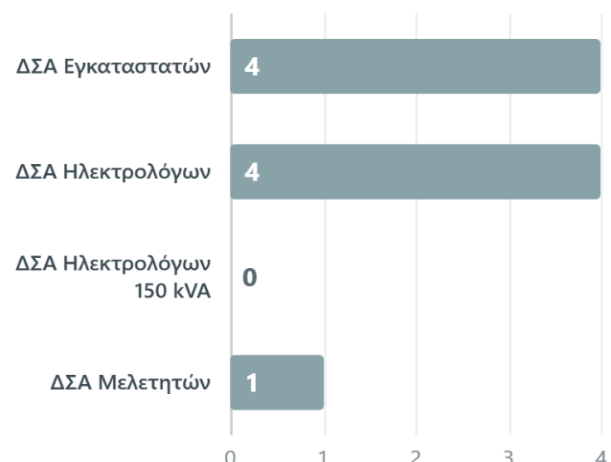

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια του ελέγχου το ΥΠΑΝ και το ΓΛΤΔ προχώρησαν σε διορθωτικές ενέργειες, περιλαμβανομένης της δημιουργίας νέου ΔΣΑ για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μέχρι 150 kVA καθώς και της επανεξέτασης ορισμένων κριτηρίων συμμετοχής, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αυξημένης συμμετοχής.

- Το μεγάλο χρονικό διάστημα που αρκετές φορές μεσολαβεί από την εγκατάσταση των κλιματιστικών μέχρι την ολοκλήρωση των ηλεκτρολογικών εργασιών και τον έλεγχο τους από την ΑΗΚ, δημιουργεί κίνδυνο να περιοριστεί η πραγματική αξιοποίηση της εγγύησης καλής λειτουργίας τους, ανάλογα με τους σχετικούς όρους της κάθε σύμβασης. Αυτό προκύπτει αφού ελλείψει ενός καλά σχεδιασμένου προγραμματισμού, κάποιες εργασίες π.χ. εγκατάσταση κλιματιστικών, προηγήθηκαν της αναβάθμισης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Διευκρίνιση

Ο έλεγχός μας δεν επεκτάθηκε στο θέμα σκοπιμότητας της απόφασης για εγκατάσταση κλιματιστικών ή/και του συγκεκριμένου τύπου κλιματιστικών που εγκαθίστανται με το υπό αναφορά έργο στα δημόσια σχολεία. Δεν εξετάσαμε, επομένως, κατά πόσο υπήρχαν άλλες λύσεις που θα μπορούσαν να επιτύχουν το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα, με χαμηλότερο κόστος και μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Σχετικά εντοπίσαμε επιστημονική μελέτη ερευνητών¹ με τίτλο «Climate change resilience of school premises in Cyprus: An examination of retrofit approaches and their implications on thermal and energy performance», η οποία δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο 2021, η οποία εξέτασε διαφορετικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της θερμικής και ενεργειακής συμπεριφοράς των σχολικών κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη και τις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την υπερθέρμανση και να βελτιώσουν τη θερμική συμπεριφορά των κτιρίων. Η μελέτη αυτή δεν αναδεικνύει ότι η εγκατάσταση κλιματιστικών ήταν λανθασμένη. Δείχνει όμως ότι το θέμα είναι ευρύτερο από την απλή επιλογή και εγκατάσταση ενός κλιματιστικού.

Γι' αυτό και το ζήτημα δεν μπορεί να περιορίζεται στο «πόσα κλιματιστικά εγκαταστάθηκαν». Θερμομόνωση, ενεργειακά αποδοτικά παράθυρα, σκίαση, αερισμός, φωτοβολταϊκά και κλιματισμός αποτελούν διαφορετικά κομμάτια του ίδιου προβλήματος και θα πρέπει να εξετάζονται ως τέτοια και ταυτόχρονα αφού υπάρχει αλληλεπίδραση.

¹ C. Heracleous, A. Michael, A. Savvides, C. Hayles

2. Εισαγωγή

2.1 Κύριες πληροφορίες για τον ελεγχόμενο φορέα

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), μέσω των Τεχνικών του Υπηρεσιών, είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την αναβάθμιση και τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων και εγκαταστάσεων της Δημοκρατίας. Οι ευθύνες του περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών, την εφαρμογή και επίβλεψη έργων, την αναβάθμιση κτηριακών δομών, τη διαχείριση συμβολαίων καθώς και την τεχνική και οικονομική στήριξη σε Σχολικές Εφορείες και Συνδέσμους Γονέων.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι Σχολικές Εφορείες, οι οποίες, δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας, είναι υπεύθυνες για τη συντήρηση, βελτίωση και γενικότερη διαχείριση των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΑΝ υλοποιεί το Έργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Κλιματιστικών στα Σχολικά Κτήρια» για την περίοδο 2024-2026.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ελεγχόμενο φορέα παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.moec.gov.cy/technikes_ypiresies

2.2 Σκοπός του ελέγχου

Σκοπός του παρόντος τεχνικού ελέγχου είναι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ΥΠΑΝ και των ΣΧΕΦ με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις και τις αρχές της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης αναφορικά με το Έργο. Περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της αποδοτικότητας, των οικονομιών κλίμακας, του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας καθώς και της ανταγωνιστικότητας των τιμών του Έργου.

Ο έλεγχος έγινε μέσω της εξέτασης δείγματος δημόσιων διαγωνισμών, συμβάσεων, σχετικών εγγράφων και ανάλυσης πληροφοριών που υπέβαλαν οι ελεγχόμενοι φορείς (ΥΠΑΝ και ΣΧΕΦ), καθώς και με τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων.

2.3 Περιορισμοί ελέγχου

Ο έλεγχος επηρεάστηκε από την καθυστερημένη υποβολή ορισμένων στοιχείων κυρίως από το ΥΠΑΝ, τη μεταβαλλόμενη κατάσταση υλοποίησης του Έργου το οποίο είναι σε εξέλιξη και τη διαφορετική μορφή, περιεχόμενο και ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων που μας έχουν δοθεί, μεταξύ των ΣΧΕΦ.

3. Ανάλυση ευρημάτων και συστάσεις

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα κύρια ευρήματα του ελέγχου, μαζί με τις αντίστοιχες συστάσεις της Υπηρεσίας μας.

3.1 Θέμα: Σχεδιασμός Έργου

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και ο τρόπος υλοποίησης του Έργου εγκατάστασης κλιματιστικών στα σχολεία από το ΥΠΑΝ και τις ΣΧΕΦ.

3.1.1 Ιστορικό

Τον Οκτώβριο 2023, η Υπουργός Παιδείας με δηλώσεις της αναφέρθηκε στην εγκατάσταση των πρώτων κλιματιστικών σε αριθμό σχολείων εντός του 2023, στη βάση κριτηρίων που είχαν τεθεί, καθώς και την εκπόνηση τριετούς σχεδιασμού 2024–2026 από το ΥΠΑΝ για την εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα δημόσια σχολεία (εφεξής το «Έργο»). Ενόψει των πιο πάνω, τον Νοέμβριο 2023 ζητήσαμε ενημέρωση από το ΥΠΑΝ για το στάδιο του σχεδιασμού και τις διαδικασίες που θα ακολουθούσε για την υλοποίηση του εν λόγω Έργου.

Τον ίδιο μήνα, το ΥΠΑΝ μάς πληροφόρησε ότι είχε επιλέξει τα πρώτα 50 σχολεία για την εγκατάσταση κλιματιστικών, ως Φάση Α, με εκτιμώμενο κόστος €1,6 εκατομμύρια. Τα κριτήρια επιλογής περιλάμβαναν σχολεία με μεγαλύτερο αριθμό αιθουσών διδασκαλίας με νοτιοανατολικό προσανατολισμό, σχολεία με ενεργειακή κλάση κάτω από Β και Γ, τα οποία συνήθως αφορούσαν παλαιότερα σχολικά κτήρια, καθώς και σχολεία που βρίσκονταν στο κέντρο της Λευκωσίας ή σε παραλιακές πόλεις όπου καταγράφονταν οι υψηλότερες θερμοκρασίες και τα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι η τελική του πρόταση θα ολοκληρωνόταν μέχρι τον Ιανουάριο 2024 και η υλοποίηση της πρότασής του θα πραγματοποιείτο σε συνεργασία με τις ΣΧΕΦ, σε τρεις φάσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026.

Τον Δεκέμβριο 2023, η ΣΧΕΦ Λεμεσού κοινοποίησε στην Υπηρεσία μας την προκήρυξη διαγωνισμού (αρ. 30/2023-2024/ΑΔ) με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών για τις ανάγκες αριθμού σχολείων της επαρχίας Λεμεσού. Κατόπιν ελέγχου των εγγράφων του υπό αναφορά διαγωνισμού, αποστείλαμε γραπτώς τις παρατηρήσεις μας στη ΣΧΕΦ Λεμεσού, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στο ΥΠΑΝ και στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (ΓΛΤΔ), με την επισήμανση ότι η μεταφορά υπολοίπων του προϋπολογισμού σε ΣΧΕΦ για την εγκατάσταση κλιματιστικών σε σχολεία οδηγούσε σε κατάτμηση των διαγωνισμών του συνολικού εξαγγελθέντος Έργου, με όλες τις συνεπακόλουθες από αυτό συνέπειες.

Τον Ιανουάριο 2024, η Γενική Διευθύντρια (ΓΔ) του ΥΠΑΝ μάς πληροφόρησε ότι ο πιο πάνω διαγωνισμός είχε ακυρωθεί με οδηγίες της και, ότι η αρμόδια Διεύθυνση του ΓΛΤΔ θα προωθούσε τον επόμενο μήνα σχετική Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια κλιματιστικών στα σχολεία. Επίσης, ο Πρόεδρος της ΣΧΕΦ Λεμεσού μάς ενημέρωσε ότι είχαν αποφασίσει την ακύρωση του διαγωνισμού, κατόπιν της επισήμανσής μας ότι ο πιο πάνω διαγωνισμός δημιουργούσε κίνδυνο κατάτμησης του συνολικού εξαγγελθέντος Έργου.

Τον Απρίλιο 2024, το ΓΛΤΔ προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για τη δημιουργία του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) Εγκαταστατών (ΔΣΑ ΓΛ 08/2024) με αντικείμενο την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού Διαιρεμένου Τύπου για Ψύξη και Θέρμανση σε Σχολικά Κτήρια για

Παγκύπρια κάλυψη των αναγκών του ΥΠΑΝ, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής έως τις 27 Μαΐου 2024.

Ενόψει της πιο πάνω εξέλιξης, ζητήσαμε τον Ιούλιο 2025 από το ΥΠΑΝ όπως μας υποβάλει την τελική του πρόταση σχετικά με τον προγραμματισμό εγκατάστασης των κλιματιστικών ανά σχολείο και επαρχία, με τις προβλεπόμενες ποσότητες και ημερομηνίες εγκατάστασης και λειτουργίας τους, η οποία, όπως μας είχε πληροφορήσει τον Νοέμβριο 2023, θα ολοκληρωνόταν μέχρι τον Ιανουάριο 2024.

Τον Οκτώβριο 2025, το ΥΠΑΝ μάς πληροφόρησε ότι το Έργο είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2024 με τις ΣΧΕΦ να αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση των συσκευών κλιματισμού στα δημόσια σχολικά κτήρια και ότι, πριν από την έναρξη των εργασιών του Έργου, είχε εκδώσει τον «Οδηγό Εγκατάστασης Συστημάτων Κλιματισμού σε Σχολικά Κτήρια» στον οποίο περιγράφονταν όλα τα στάδια της εν λόγω διαδικασίας.

Επίσης, μας ενημέρωσε ότι χρειαζόταν η ετοιμασία ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης σε κάθε σχολικό κτήριο πριν από την εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού για εξακρίβωση της ανάγκης αναβάθμισης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ή/και αύξησης του ηλεκτρικού φορτίου, σημειώνοντας ότι με βάση παλαιότερες μετρήσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) απαιτείτο η ανέγερση υποσταθμού διανομής σε 26 σχολεία, με εκτιμώμενο χρόνο κατασκευής 24 μηνών έκαστος, για κάλυψη της ζήτησης του απαιτούμενου ηλεκτρικού φορτίου.

Επιπρόσθετα, μας ανέφερε ότι το πλάνο εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού και η κατάρτιση καταλόγου προτεραιότητας είχαν ανατεθεί στις ΣΧΕΦ Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Παραλιμνίου-Δερύνειας και ότι σειρά προτεραιότητας και επιλογής των σχολικών κτηρίων είχε προκύψει από την εφαρμογή των κριτηρίων εγκατάστασης που περιλαμβάνονταν στον πιο πάνω σχετικό Οδηγό. Επίσης, σημείωσε ότι η διαδικασία εγκατάστασης των συσκευών κλιματισμού ολοκληρώνεται με τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κάθε σχολείου από την ΑΗΚ και την έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού Καταλληλότητας.

Τέλος, μας απέστειλε πίνακες με σχολεία που είχαν συμπεριληφθεί στη Φάση Α, Β και Γ (επισυνάπτονται στο Παράρτημα V της έκθεσης) και το στάδιο υλοποίησης που βρισκόταν το κάθε σχολείο, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε λάβει από τις ΣΧΕΦ.

Τον Νοέμβριο 2025, η Υπηρεσία μας ζήτησε εκ νέου από το ΥΠΑΝ να υποβάλει την πιο πάνω τελική του πρόταση η οποία αφορούσε τον αρχικό προγραμματισμό για την υλοποίηση του Έργου, αφού αυτή ήταν απαραίτητη για τη διενέργεια και ολοκλήρωση του παρόντος ελέγχου από την Υπηρεσία μας.

Τον Φεβρουάριο 2026, το ΥΠΑΝ μάς ενημέρωσε ότι το πλάνο εγκατάστασης κλιματιστικών στα σχολεία είχε κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας με την προηγούμενη απαντητική επιστολή του τον Οκτώβριο 2025 και αποτύπωνε την τρέχουσα εικόνα των ενεργειών και δράσεων που είχαν πραγματοποιηθεί, καθώς και αυτών που είχαν προγραμματιστεί σε επόμενο στάδιο. Επίσης, μας ανέφερε ότι ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου Έργου εξελισσόταν σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολείων ήταν χρονοβόρα διαδικασία, και το Έργο αναμενόταν να ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι τον Δεκέμβριο 2026.

Σημειώνεται ότι το ΥΠΑΝ, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας μας ενόψει της πολυπλοκότητας του όλου Έργου, μας πληροφόρησε ότι τον Απρίλιο 2026 είχε ορίσει τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του ως αρμόδιο συντονιστή του Έργου, επισημαίνοντας ότι η διαχείριση των διαδικασιών μέσω των ΔΣΑ

εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΓΛΤΔ, ενώ η εφαρμογή των διαδικασιών ανάθεσης και υλοποίησης των σχετικών εργασιών έχει αναληφθεί από τις αρμόδιες ΣΧΕΦ.

Ο έλεγχος της Υπηρεσίας μας για το εν λόγω Έργο διενεργήθηκε στη βάση πληροφοριών/στοιχείων τα οποία ζητήσαμε και λάβαμε τόσο από το ΥΠΑΝ όσο και από τις ΣΧΕΦ κάθε Επαρχίας, και τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται στις ενότητες που ακολουθούν μαζί με τα ευρήματα και τις αντίστοιχες συστάσεις μας. Από τη μελέτη των πιο πάνω διαπιστώθηκε ότι η υλοποίηση του Έργου ανατέθηκε από το ΥΠΑΝ στις ΣΧΕΦ Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Παραλιμνίου-Δερύνειας, οι οποίες διέθεταν περιορισμένη επιστημονική και τεχνική στελέχωση σε σχέση με το εύρος των εργασιών που τους ανατέθηκαν. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε δυσανάλογος φόρτος εργασίας στις ΣΧΕΦ, χωρίς αυτές να διαθέτουν αντίστοιχο επίπεδο τεχνικής επάρκειας και στελέχωσης με εκείνο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΝ.

Επίσης, το ΥΠΑΝ καθυστέρησε πολύ να ορίσει κεντρικό συντονιστή/υπεύθυνο διαχείρισης του Έργου (Project manager), με αρμοδιότητα τον συνολικό συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου του Έργου για τη διασφάλιση υλοποίησης και ολοκλήρωσης του σε όλα τα δημόσια σχολεία, πρωτίστως με ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών και εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Σημειώνεται ότι, ενώ τα σχολεία για εγκατάσταση κλιματιστικών της πρώτης φάσης του Έργου επιλέχθηκαν το Φθινόπωρο του 2023, το ΥΠΑΝ όρισε κεντρικό συντονιστή τον Απρίλιο 2026, όταν το Έργο βρισκόταν στην τρίτη και τελευταία φάση υλοποίησης του.

Τέλος, το ΥΠΑΝ καθυστέρησε δύο χρόνια να μας αποστείλει τον τελικό τριετή σχεδιασμό 2024–2026 για την υλοποίηση του Έργου εγκατάστασης και λειτουργίας κλιματιστικών σε σχολικές αίθουσες διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία. Η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα να επηρεάσει τον προγραμματισμό του δειγματοληπτικού ελέγχου του Έργου από την Υπηρεσία μας και, κατ' επέκταση να καθυστερήσει και η έκδοση της παρούσας Έκθεσης.

Συστάσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας

- Σε μεγάλα/πολύπλοκα τεχνικά έργα σε σχολικές μονάδες, το ΥΠΑΝ να αναθέτει την υλοποίησή τους στις Τεχνικές Υπηρεσίες του οι οποίες είναι στελεχωμένες με επαρκή επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων της Μηχανικής και διαθέτουν Τομέα Προγραμματισμού Έργων, Τομέα Μελετών, Τομέα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Τομέα Εκτέλεσης Έργων και Διαχείρισης Συμβάσεων.
- Σε περίπτωση που τα έργα εκτελούνται από τις ΣΧΕΦ, πέραν του ότι θα πρέπει να προηγείται η επαρκής στελέχωση τους, το ΥΠΑΝ να ορίζει έγκαιρα κεντρικό συντονιστή/υπεύθυνο διαχείρισης του κάθε Έργου (Project manager) με αρμοδιότητα τον συνολικό συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου του, για τη διασφάλιση υλοποίησης και ολοκλήρωσής του εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Ο κεντρικός συντονιστής να έχει συχνή επικοινωνία και συνεννόηση με τον συντονιστή/υπεύθυνο κάθε ΣΧΕΦ, ενισχύοντας την εποπτική του αρμοδιότητα μέσω καθιερωμένων τυποποιημένων διαδικασιών παρακολούθησης της συμμόρφωσής τους.
- Το ΥΠΑΝ να ανταποκρίνεται έγκαιρα στην υποβολή στοιχείων τα οποία ζητούνται από την Υπηρεσία μας για ελέγχους που διεξάγονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, έτσι ώστε τυχόν ευρήματα/συστάσεις που προκύπτουν να υποβάλλονται έγκαιρα και να αξιοποιούνται, όπου κρίνεται σκόπιμο από τον ελεγχόμενο, προς όφελος του Έργου για το οποίο διεξάγεται ο έλεγχος.

- Το ΥΠΑΝ να δημοσιεύσει/αναρτήσει τον αναλυτικό τριετή σχεδιασμό για την εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα δημόσια σχολεία, για σκοπούς διαφάνειας και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών/γονέων/μαθητών.

3.1.2 Οδηγός Εγκατάστασης Κλιματιστικών του ΥΠΑΝ

Τον Μάρτιο 2024, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΝ ετοίμασαν και ανάρτησαν/δημοσίευσαν τον εν λόγω Οδηγό στην ιστοσελίδα τους. Σύμφωνα με τον Οδηγό, οι ΣχΕφ αναλαμβάνουν τη μελέτη και την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού στα δικά τους σχολικά κτήρια και θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνουν υπόψη την τελευταία έκδοση του Οδηγού και να παραδίδουν έκθεση προόδου των εργασιών κάθε έξι μήνες στο ΥΠΑΝ. Όλα τα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης του Έργου που συμπεριλαμβάνονται στον Οδηγό του ΥΠΑΝ παρουσιάζονται και περιγράφονται στο **Error! Reference source not found.** πιο κάτω:

Ο Οδηγός του ΥΠΑΝ ετοιμάστηκε τον Μάρτιο 2024 για υποβοήθηση των ΣχΕφ στην υλοποίηση του Έργου εγκατάστασης κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία. Έκτοτε, δεν επικαιροποιήθηκε/αναθεωρήθηκε ώστε να συμπεριλαμβάνει και τα ΔΣΑ (Εγκαταστατών, Μελετητών, Ηλεκτρολόγων) που είχαν δημιουργηθεί μεταγενέστερα από το ΓΛτΔ σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ.

Σε ερώτημα που υποβάλαμε στο ΥΠΑΝ κατά πόσο θα προέβαιναν σε αναθεώρηση του Οδηγού για διασφάλιση ενιαίας πολιτικής κατεύθυνσης από τις ΣχΕφ στη διαχείριση του Έργου, μας πληροφόρησαν ότι ο Οδηγός είχε συνταχθεί πριν την εφαρμογή των ΔΣΑ, με σκοπό να περιγράψει τις ανάγκες του ΥΠΑΝ σε σχέση με την εγκατάσταση κλιματισμού και να καθοδηγήσει τις ΣχΕφ ως προς τη διαδικασία υλοποίησης των σχετικών εργασιών (επιλογή κτηρίων, μέθοδοι εγκατάστασης, επιλογή μελετητών, επιλογή εγκαταστατών Η/Μ, κλπ). Τα ΔΣΑ που έχουν εφαρμοστεί βασίστηκαν στον εν λόγω Οδηγό και το ΥΠΑΝ δεν έκρινε ότι υπάρχουν αντικρουόμενες έννοιες σε αυτά. Με την πλήρη λειτουργία των ΔΣΑ και όταν εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός εγγεγραμμένων προσφοροδοτών στα σχετικά συστήματα, οι ΣχΕφ θα ακολουθούν τις διαδικασίες που προβλέπονται μέσω των ΔΣΑ που καθορίζονται από το ΓΛτΔ.

Σύσταση Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Το ΥΠΑΝ σε συνεργασία με το ΓΛτΔ, να επικαιροποιήσει/αναθεωρήσει τον Οδηγό, λαμβάνοντας υπόψη την προκήρυξη διαγωνισμών από τις ΣχΕφ μέσω των ΔΣΑ που είναι αναρτημένα στο eProcurement, ώστε να συμπεριλαμβάνει σαφείς πληροφορίες για τη χρήση των ΔΣΑ, τους ρόλους του ΥΠΑΝ, του ΓΛτΔ και των ΣχΕφ.

3.1.3 Απουσία καθορισμού αναλυτικού προϋπολογισμού του Έργου

Τον Οκτώβριο 2025, το ΥΠΑΝ μάς απέστειλε επιστολή στην οποία επισύναψε τον πιο πάνω Οδηγό καθώς και πίνακες που περιλάμβαναν το όνομα και τύπο (νηπιαγωγείο/δημοτικό/γυμνάσιο/λύκειο) του σχολείου ανά επαρχία, τον αριθμό κλιματιστικών που χρειάζονταν να εγκατασταθούν, τη φάση (Α ή Β ή Γ) για 219 σχολεία (επισυνάπτονται στο Παράρτημα V της παρούσας έκθεσης), χωρίς ωστόσο να αναφέρεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός του Έργου ανά φάση υλοποίησης ή/και ανά ΣχΕφ ή/και ανά είδος δαπάνης (προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, ηλεκτρολογικές εργασίες). Η απουσία αναλυτικού προϋπολογισμού αποτελεί σημαντική αδυναμία στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση του Έργου, καθώς δεν είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ των εκτιμώμενων ποσών που έπρεπε να είχαν καθοριστεί στον αρχικό σχεδιασμό και των αντίστοιχων

πραγματικών δαπανών που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Έργου, ώστε να αξιολογείται η λογικότητά τους.

Σύσταση Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Το ΥΠΑΝ να καταρτίσει αναλυτικό προϋπολογισμό του Έργου ανά είδος δαπάνης ή/και ανά φάση ή/και ανά επαρχία ή/και ανά ΣχΕφ, έστω και για τα εναπομείναντα στάδια/φάσεις του, αλλά και σε περίπτωση υλοποίησης επόμενου παρόμοιου έργου για τα εναπομείναντα δημόσια σχολεία στα οποία απαιτείται εγκατάσταση κλιματιστικών.

3.2 Θέμα: Υλοποίηση Έργου

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ο αριθμός των υφιστάμενων δημόσιων σχολείων που έχουν επιλεγεί για εγκατάσταση κλιματιστικών στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό αναφορά Έργου, η κατανομή τους ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, ανά επαρχία και ανά φάση υλοποίησης, καθώς και η πρόοδος των Φάσεων Α, Β και Γ. Στο Έργο έχουν ενταχθεί 209 διαφορετικά δημόσια σχολεία. Σε 10 από αυτά θα εκτελεστούν εργασίες σε δύο διαφορετικές φάσεις υλοποίησης, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, οπότε, παρόλο ότι το σύνολο των σχολείων που εμπίπτουν στο υπό αναφορά Έργο είναι 209, οι εργασίες ανά φάση υλοποίησης αναφέρονται σε συνολικά 219 περιπτώσεις. Επίσης παρουσιάζεται η συνολική κατάσταση υλοποίησης του Έργου, περιλαμβανομένου του αριθμού των κλιματιστικών που έχουν εγκατασταθεί ή/και θα εγκατασταθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω Έργου. Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το ΥΠΑΝ με επιστολές ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2025 και 23 Ιουνίου 2026, καθώς και στοιχεία που ζητήσαμε και λάβαμε από τις ΣχΕφ τον Ιούλιο 2026, ουσιώδη χρόνο ολοκλήρωσης του παρόντος ελέγχου, δεδομένου ότι το Έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επαρχία	Αριθμός επιλεγμένων σχολικών μονάδων	Επιλεγμένες σχολικές μονάδες με εργασίες σε δύο φάσεις	Σύνολο σχολικών μονάδων όπου θα γίνει υλοποίηση εργασιών
Λευκωσία	88	1	89
Λεμεσός	54	3	57
Λάρνακα	22	0	22
Αμμόχωστος	22	6	28
Πάφος	23	0	23
Σύνολο	209	10	219

Πίνακας 1: Αριθμός επιλεγμένων σχολείων και σύνολο σχολείων στις φάσεις υλοποίησης του Έργου.

3.2.1 Επιλογή δημόσιων σχολείων

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανομή των 758 υφιστάμενων δημόσιων σχολείων ανά επαρχία και βαθμίδα εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Εξατάξια, Εσπερινά, Αθλητικά, Μουσικά, Τεχνικές Σχολές και Ειδικά σχολεία), σύμφωνα με τους καταλόγους που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ και είχαν αναθεωρηθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Σημειώνεται ότι ο αριθμός αφορά σχολεία και όχι σχολικά κτήρια, καθώς ορισμένα σχολεία διαφορετικών βαθμίδων συστεγάζονται στο ίδιο σχολικό κτήριο, όπως π.χ. το Λύκειο και η ΤΕΣΕΚ Πόλης Χρυσοχούς.


Βαθμίδα / Επαρχία	Λευκωσία	Λεμεσός	Λάρνακα	Αμμόχωστος	Πάφος	Κερύνεια
Νηπιαγωγεία	107	64	52	16	34	0
Δημοτικά	124	84	61	19	39	1
Γυμνάσια	24	18	11	2	7	0
Λύκεια	13	10	5	2	6	0
Εξατάξια	1	3	2	2	2	0
Εσπερινά	1	1	1	1	1	0
Αθλητικά	2	2	2	2	2	0
Μουσικά	2	2	2	2	2	0
Τεχνικές	3	5	2	2	3	0
Ειδικά	4	2	1	1	1	0

Πίνακας 2: Αριθμός δημόσιων σχολείων ανά επαρχία και βαθμίδα εκπαίδευσης.

Πηγή: Αναρτημένοι κατάλογοι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ.

Το ΥΠΑΝ έχει επιλέξει 209 από τις 758 υφιστάμενες σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης για την εγκατάσταση κλιματιστικών στο πλαίσιο του υπό αναφορά Έργου, αριθμός που αντιστοιχεί στο 28% του συνόλου των δημόσιων σχολικών μονάδων.

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η επιλογή των δημόσιων σχολείων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, σε σχέση με τον συνολικό αριθμό δημόσιων σχολείων της αντίστοιχης βαθμίδας.

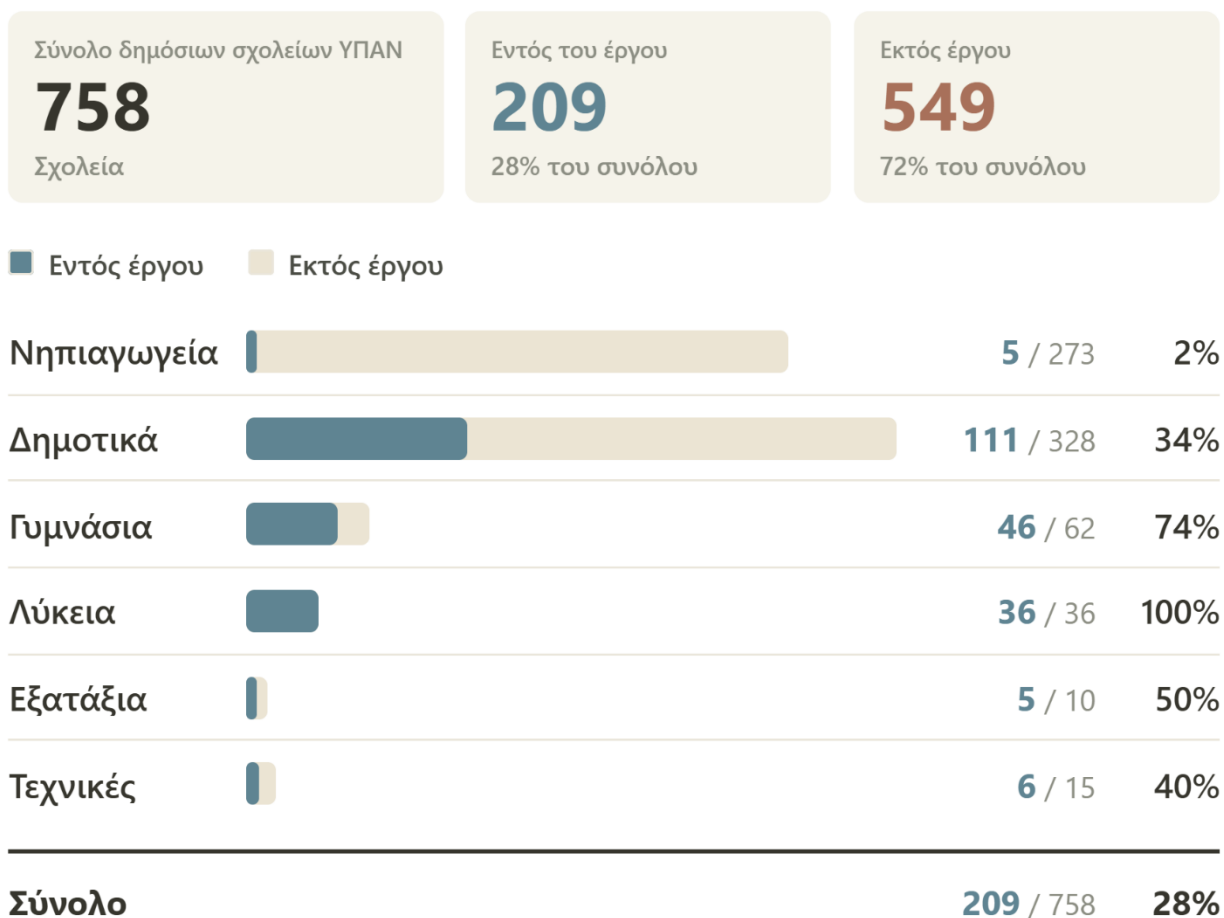


Γράφημα 1: Κάλυψη του Έργου ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

Πηγή: Αναρτημένοι κατάλογοι σχολείων στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ και στοιχεία ΥΠΑΝ Ιουνίου 2026.

3.2.2 Κατανομή επιλεγμένων δημόσιων σχολείων

Στα Γραφήματα 3 και 4 πιο κάτω παρουσιάζεται η κατανομή των 209 επιλεγμένων σχολείων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά επαρχία. Στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται η κατανομή τους ανά φάση υλοποίησης. Σημειώνεται ότι το σύνολο ανέρχεται σε 219, καθώς, όπως αναλύεται πιο πάνω, 10 σχολεία περιλαμβάνονται σε δύο διαφορετικές φάσεις.

Κατανομή επιλεγμένων σχολείων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

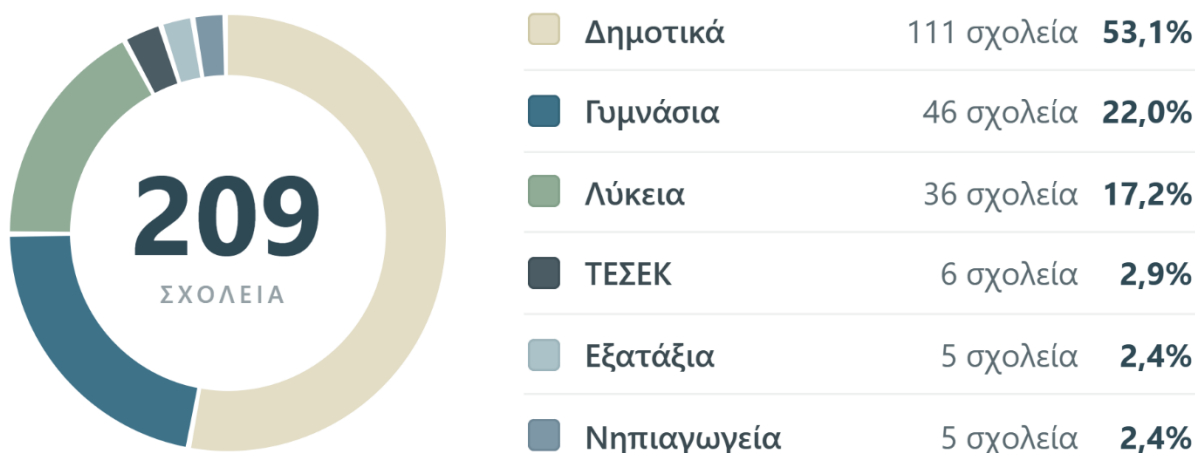

Γράφημα 2: Κατανομή σχολείων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από το ΥΠΑΝ και ΣχΕφ μέχρι τον Ιούλιο 2026.


Κατανομή επιλεγμένων σχολείων ανά επαρχία



Γράφημα 3: Κατανομή επιλεγμένων σχολείων ανά επαρχία.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από το ΥΠΑΝ και ΣχΕφ μέχρι τον Ιούλιο 2026.

Κατανομή εργασιών ανά φάση υλοποίησης

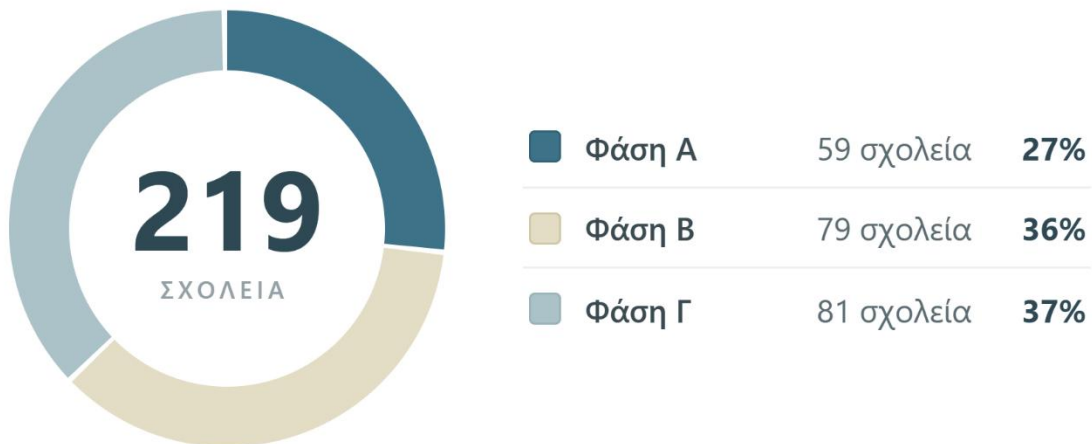

Γράφημα 4: Κατανομή επιλεγμένων σχολείων ανά φάση υλοποίησης του Έργου (εμφανίζονται 219 περιπτώσεις υλοποίησης εργασιών σε σχολεία αντί 209, όπως επεξηγείται στην παρ. 3.2 και στον Πίνακα 1 πιο πάνω).

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από το ΥΠΑΝ και ΣχΕφ μέχρι τον Ιούλιο 2026.

3.2.3 Υλοποίηση από Σχολικές Εφορείες

Στις υποπαραγράφους που ακολουθούν και στα αντίστοιχα Γραφήματα 6-22, παρουσιάζεται η υλοποίηση του Έργου για κάθε ΣχΕφ. Για σκοπούς παρακολούθησης των σχετικών γραφημάτων, παρουσιάζονται οι πιο κάτω αναφορές με την αντίστοιχη επεξήγηση:

Μη έναρξη εργασιών: Έχει επιλεγεί το σχολείο για ένταξη στο Έργο, αλλά δεν έχουν αρχίσει οποιεσδήποτε εργασίες, περιλαμβανομένης της ετοιμασίας των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.

Εγκατάσταση κλιματιστικών: Έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, προκηρυχθεί και κατακυρωθεί σχετικός διαγωνισμός και η εγκατάσταση των κλιματιστικών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ηλεκτρολογικές εργασίες: Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιματιστικών και εκκρεμούν ή βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες, όπως η σύνδεση των κλιματιστικών στους ηλεκτρολογικούς πίνακες, η αναβάθμιση του ηλεκτρικού φορτίου ή/και η κατασκευή υποσταθμού.

Έλεγχος από ΑΗΚ: Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιματιστικών και οι ηλεκτρολογικές εργασίες και εκκρεμεί ο έλεγχος από την ΑΗΚ.

Ολοκλήρωση εργασιών: Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιματιστικών και, όπου απαιτείται, οι αναγκαίες ηλεκτρολογικές εργασίες, καθώς και ο έλεγχος από την ΑΗΚ με επιτυχή αποτελέσματα.

3.2.3.1 Υλοποίηση από Σχολική Εφορεία Λευκωσίας

Η ΣχΕφ Λευκωσίας έχει επιλέξει συνολικά 88 δημόσια σχολεία για εγκατάσταση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό αναφορά Έργου. Σε ένα από αυτά εκτελούνται

εργασίες σε δύο διαφορετικές φάσεις. Ως εκ τούτου, το σύνολο ανέρχεται σε 89 σχολεία, από τα οποία τα 15 έχουν συμπεριληφθεί στη Φάση Α, τα 26 στη Φάση Β και τα 48 στη Φάση Γ του Έργου.

Για τη Φάση Α, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στα 13 από τα 15 σχολεία, ενώ εκκρεμούν οι ηλεκτρολογικές εργασίες και ακολούθως ο έλεγχος από την ΑΗΚ σε δύο σχολεία. Η κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Α σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Λευκωσίας παρουσιάζεται στο Γράφημα 5.

ΣχΕφ Λευκωσίας - Φάση Α: Κατάσταση Εργασιών



Κατάσταση	Σχολεία	%
Ηλεκτρολογικές εργασίες	2 σχολεία	13%
Ολοκλήρωση εργασιών	13 σχολεία	87%

Γράφημα 5: Κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Α της ΣχΕφ Λευκωσίας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λευκωσίας τον Ιούλιο 2026.

Για τη Φάση Β, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στα πέντε από τα 26 σχολεία, σε ένα σχολείο εκκρεμεί ο έλεγχος από την ΑΗΚ, ενώ σε 20 σχολεία έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιματιστικών και εκκρεμούν οι ηλεκτρολογικές εργασίες και ο έλεγχος από την ΑΗΚ. Η κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Β σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Λευκωσίας παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.

ΣχΕφ Λευκωσίας - Φάση Β: Κατάσταση Εργασιών



Κατάσταση	Σχολεία	%
Ηλεκτρολογικές εργασίες	20 σχολεία	77%
Έλεγχος από ΑΗΚ	1 σχολείο	4%
Ολοκλήρωση εργασιών	5 σχολεία	19%

Γράφημα 6: Κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Β της ΣχΕφ Λευκωσίας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λευκωσίας τον Ιούλιο 2026.

Για τη Φάση Γ, σε 15 από τα 48 σχολεία βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση των κλιματιστικών, ενώ σε 33 σχολεία έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιματιστικών αλλά εκκρεμούν οι ηλεκτρολογικές εργασίες και ο έλεγχος από την ΑΗΚ. Η κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Γ σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Λευκωσίας παρουσιάζεται στο Γράφημα 7.

ΣχΕφ Λευκωσίας - Φάση Γ: Κατάσταση Εργασιών




Κατάσταση	Σχολεία	%
 Εγκατάσταση κλιματιστικών	15 σχολεία	31%
 Ηλεκτρολογικές εργασίες	33 σχολεία	69%

Γράφημα 7: Κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Γ της ΣχΕφ Λευκωσίας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λευκωσίας τον Ιούλιο 2026.

Η συνολική κατάσταση υλοποίησης του Έργου σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Λευκωσίας παρουσιάζεται στο Γράφημα 8.

Συνολική Κατάσταση Υλοποίησης - ΣχΕφ Λευκωσίας

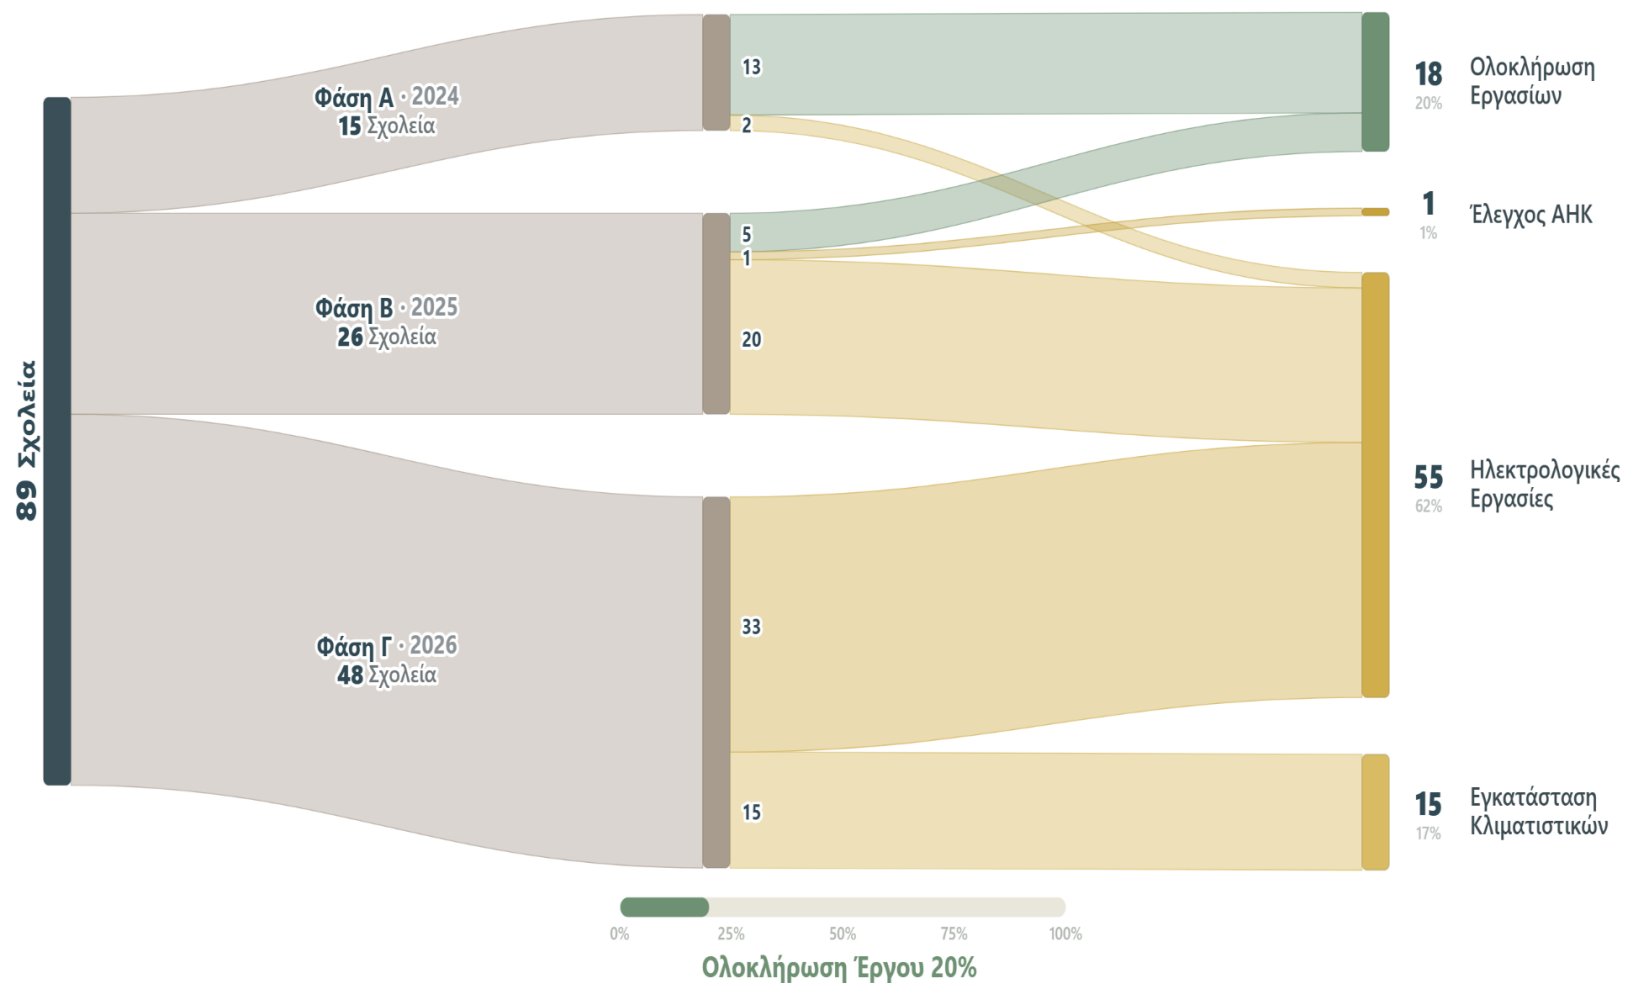

Γράφημα 8: Συνολική κατάσταση υλοποίησης ΣχΕφ Λευκωσίας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λευκωσίας τον Ιούλιο 2026.

3.2.3.2 Υλοποίηση από Σχολική Εφορεία Λεμεσού

Η ΣχΕφ Λεμεσού έχει επιλέξει συνολικά 54 δημόσια σχολεία για εγκατάσταση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό αναφορά Έργου. Σε τρία από αυτά εκτελούνται εργασίες σε δύο διαφορετικές φάσεις. Ως εκ τούτου, το σύνολο ανέρχεται σε 57 σχολεία, από τα οποία 12 σχολεία έχουν συμπεριληφθεί στη Φάση Α, 12 σχολεία στη Φάση Β και 33 σχολεία στη Φάση Γ του Έργου.

Για τη Φάση Α, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και στα 12 σχολεία. Η κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Α σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Λεμεσού παρουσιάζεται στο Γράφημα 9.

ΣχΕφ Λεμεσού - Φάση Α: Κατάσταση Εργασιών



Κατάσταση	Σχολεία	%
 Ολοκλήρωση εργασιών	12 σχολεία	100%

Γράφημα 9: Κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Α της ΣχΕφ Λεμεσού.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λεμεσού τον Ιούλιο 2026.

Για τη Φάση Β, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στα 11 από τα 12 σχολεία, ενώ σε ένα σχολείο εκκρεμεί ο έλεγχος από την ΑΗΚ. Η κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Β σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Λεμεσού παρουσιάζεται στο Γράφημα 10.

ΣχΕφ Λεμεσού - Φάση Β: Κατάσταση Εργασιών



Κατάσταση	Σχολεία	%
 Έλεγχος από ΑΗΚ	1 σχολείο	8%
 Ολοκλήρωση εργασιών	11 σχολεία	92%

Γράφημα 10: Κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Β της ΣχΕφ Λεμεσού.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λεμεσού τον Ιούλιο 2026.

Για τη Φάση Γ, σε 26 από τα 33 σχολεία βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση των κλιματιστικών, ενώ σε έξι σχολεία έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιματιστικών και εκκρεμούν οι ηλεκτρολογικές εργασίες και ο έλεγχος από την ΑΗΚ. Σε ένα σχολείο δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες. Η κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Γ σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Λεμεσού παρουσιάζεται στο Γράφημα 11.

ΣχΕφ Λεμεσού - Φάση Γ: Κατάσταση Εργασιών




Κατάσταση	Σχολεία	%
Μη έναρξη εργασιών	1 σχολείο	3%
Εγκατάσταση κλιματιστικών	26 σχολεία	79%
Ηλεκτρολογικές εργασίες	6 σχολεία	18%

Γράφημα 11: Κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Γ της ΣχΕφ Λεμεσού.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λεμεσού τον Ιούλιο 2026.

Η συνολική κατάσταση υλοποίησης του Έργου σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Λεμεσού παρουσιάζεται στο Γράφημα 12.

Συνολική Κατάσταση Υλοποίησης - ΣχΕφ Λεμεσού

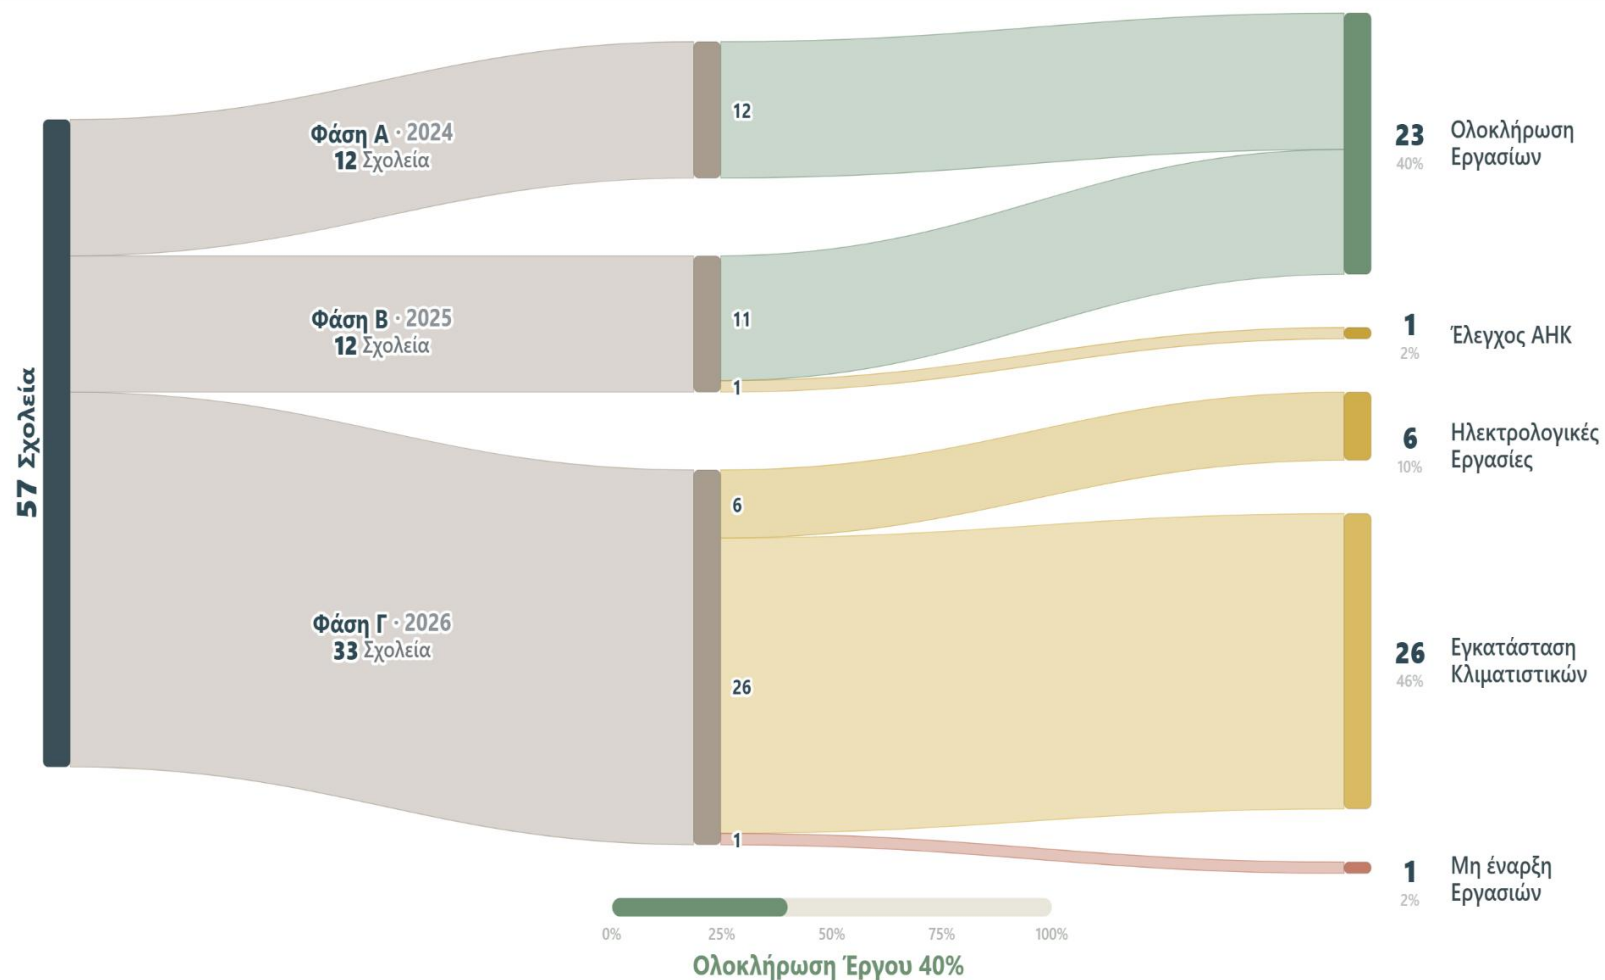

Γράφημα 12: Συνολική κατάσταση υλοποίησης της ΣχΕφ Λεμεσού.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λεμεσού τον Ιούλιο 2026.

3.2.3.3 Υλοποίηση από Σχολική Εφορεία Λάρνακας

Η ΣχΕφ Λάρνακας έχει επιλέξει συνολικά 22 δημόσια σχολεία για εγκατάσταση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό αναφορά Έργου, από τα οποία 10 σχολεία έχουν συμπεριληφθεί στη Φάση Α και 12 σχολεία στη Φάση Β του Έργου.

Για τη Φάση Α, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και στα 10 σχολεία. Η κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Α σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Λάρνακας παρουσιάζεται στο Γράφημα 13.

ΣχΕφ Λάρνακας - Φάση Α: Κατάσταση Εργασιών



Κατάσταση	Σχολεία	%
 Ολοκλήρωση Εργασιών	10 σχολεία	100%

Γράφημα 13: Κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Α της ΣχΕφ Λάρνακας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λάρνακας τον Ιούλιο 2026.

Για τη Φάση Β, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στα εννέα από τα 12 σχολεία. Σε ένα σχολείο εκκρεμεί ο έλεγχος από την ΑΗΚ, ενώ σε δύο σχολεία έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιματιστικών και εκκρεμούν οι ηλεκτρολογικές εργασίες και ο έλεγχος από την ΑΗΚ. Η κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Β σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Λάρνακας παρουσιάζεται στο Γράφημα 14.

ΣχΕφ Λάρνακας - Φάση Β: Κατάσταση Εργασιών




Κατάσταση	Σχολεία	%
Ηλεκτρολογικές Εργασίες	2 σχολεία	17%
Έλεγχος από ΑΗΚ	1 σχολείο	8%
Ολοκλήρωση Εργασιών	9 σχολεία	75%

Γράφημα 14: Κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Β της ΣχΕφ Λάρνακας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λάρνακας τον Ιούλιο 2026.

Η συνολική κατάσταση υλοποίησης του Έργου σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Λάρνακας παρουσιάζεται στο Γράφημα 15.

Συνολική Κατάσταση Υλοποίησης - ΣχΕφ Λάρνακας

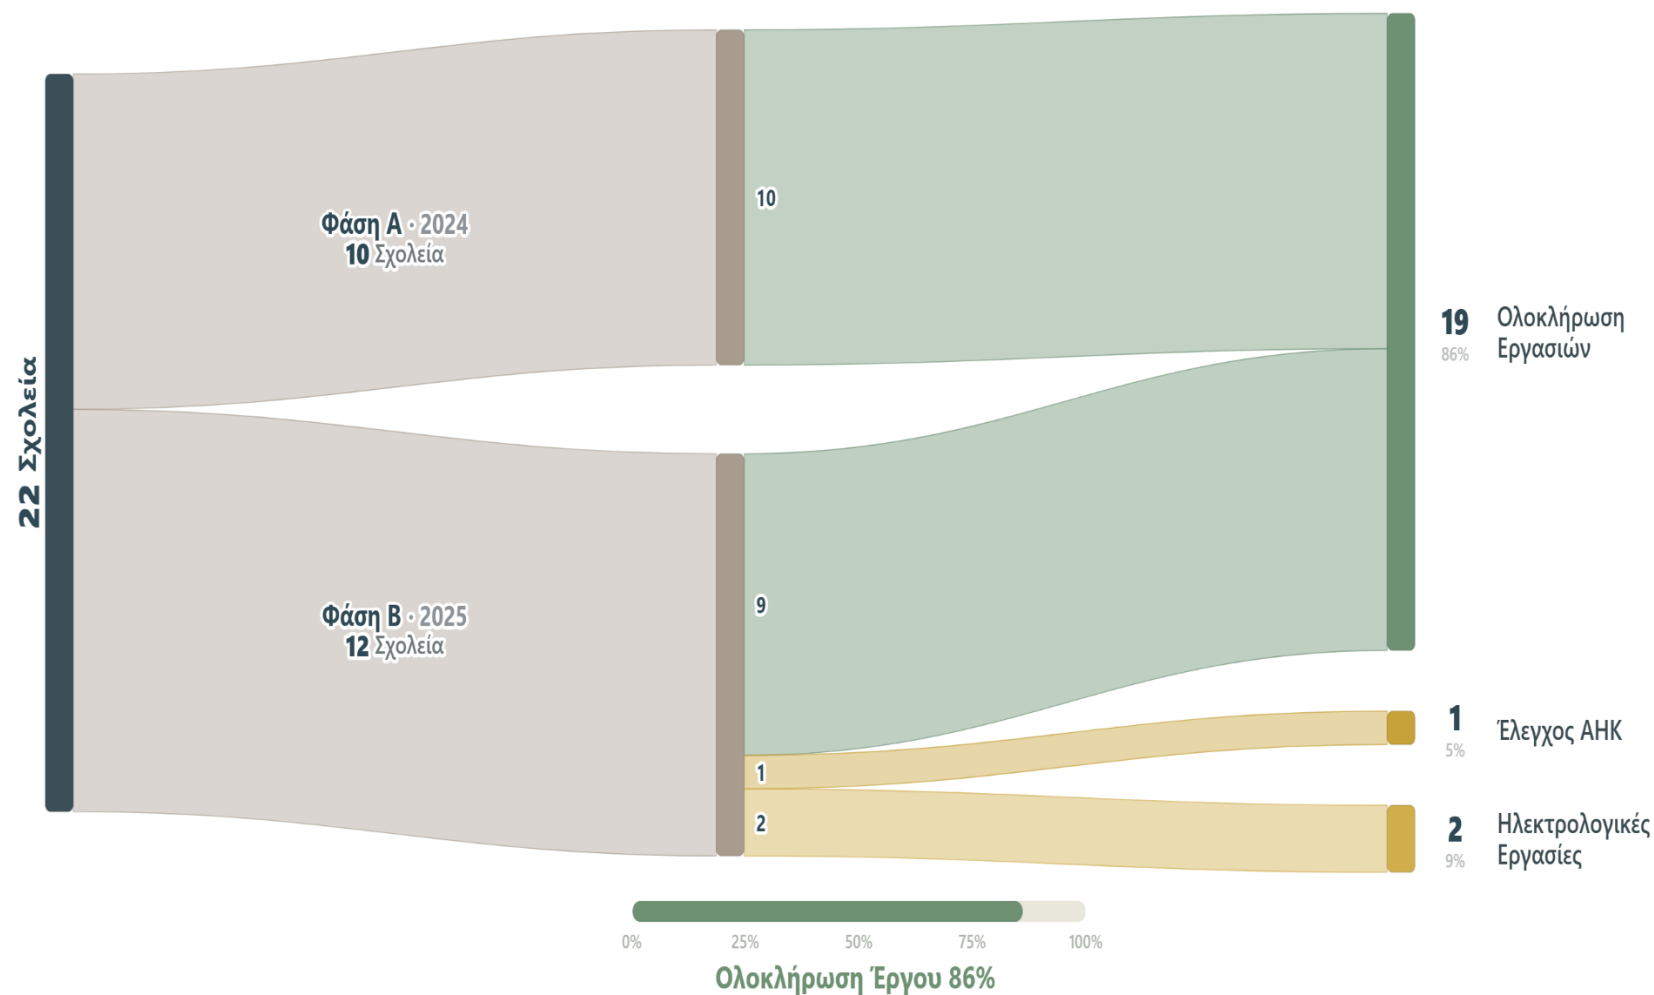

Γράφημα 15: Συνολική κατάσταση υλοποίησης της ΣχΕφ Λάρνακας.
Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λάρνακας τον Ιούλιο 2026.

3.2.3.4 Υλοποίηση από Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου-Δερύνειας

Η ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας έχει επιλέξει συνολικά 22 δημόσια σχολεία για εγκατάσταση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό αναφορά Έργου. Σε έξι από αυτά εκτελούνται εργασίες σε δύο διαφορετικές φάσεις. Ως εκ τούτου, το σύνολο ανέρχεται σε 28 σχολεία, από τα οποία 12 σχολεία έχουν συμπεριληφθεί στη Φάση Α και 16 σχολεία στη Φάση Β του Έργου.

Για τη Φάση Α, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και στα 12 σχολεία. Η κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Α σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας παρουσιάζεται στο Γράφημα 16.

ΣχΕφ Παραλιμνίου - Δερύνειας - Φάση Α: Κατάσταση Εργασιών



Κατάσταση	Σχολεία	%
 Ολοκλήρωση Εργασιών	12 σχολεία	100%

Γράφημα 16: Κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Α της ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας τον Ιούνιο 2026.

Για τη Φάση Β, και στα 16 σχολεία έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιματιστικών και εκκρεμούν οι ηλεκτρολογικές εργασίες και ο έλεγχος από την ΑΗΚ. Η κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Β σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας παρουσιάζεται στο Γράφημα 17.

ΣχΕφ Παραλιμνίου - Δερύνειας - Φάση Β: Κατάσταση Εργασιών




Κατάσταση	Σχολεία	%
 Ηλεκτρολογικές εργασίες	16 σχολεία	100%

Γράφημα 17: Κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Β της ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας τον Ιούνιο 2026.

Η συνολική κατάσταση υλοποίησης του Έργου σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας παρουσιάζεται στο Γράφημα 18.

Συνολική Κατάσταση Υλοποίησης - ΣχΕφ Παραλιμνίου - Δερύνειας

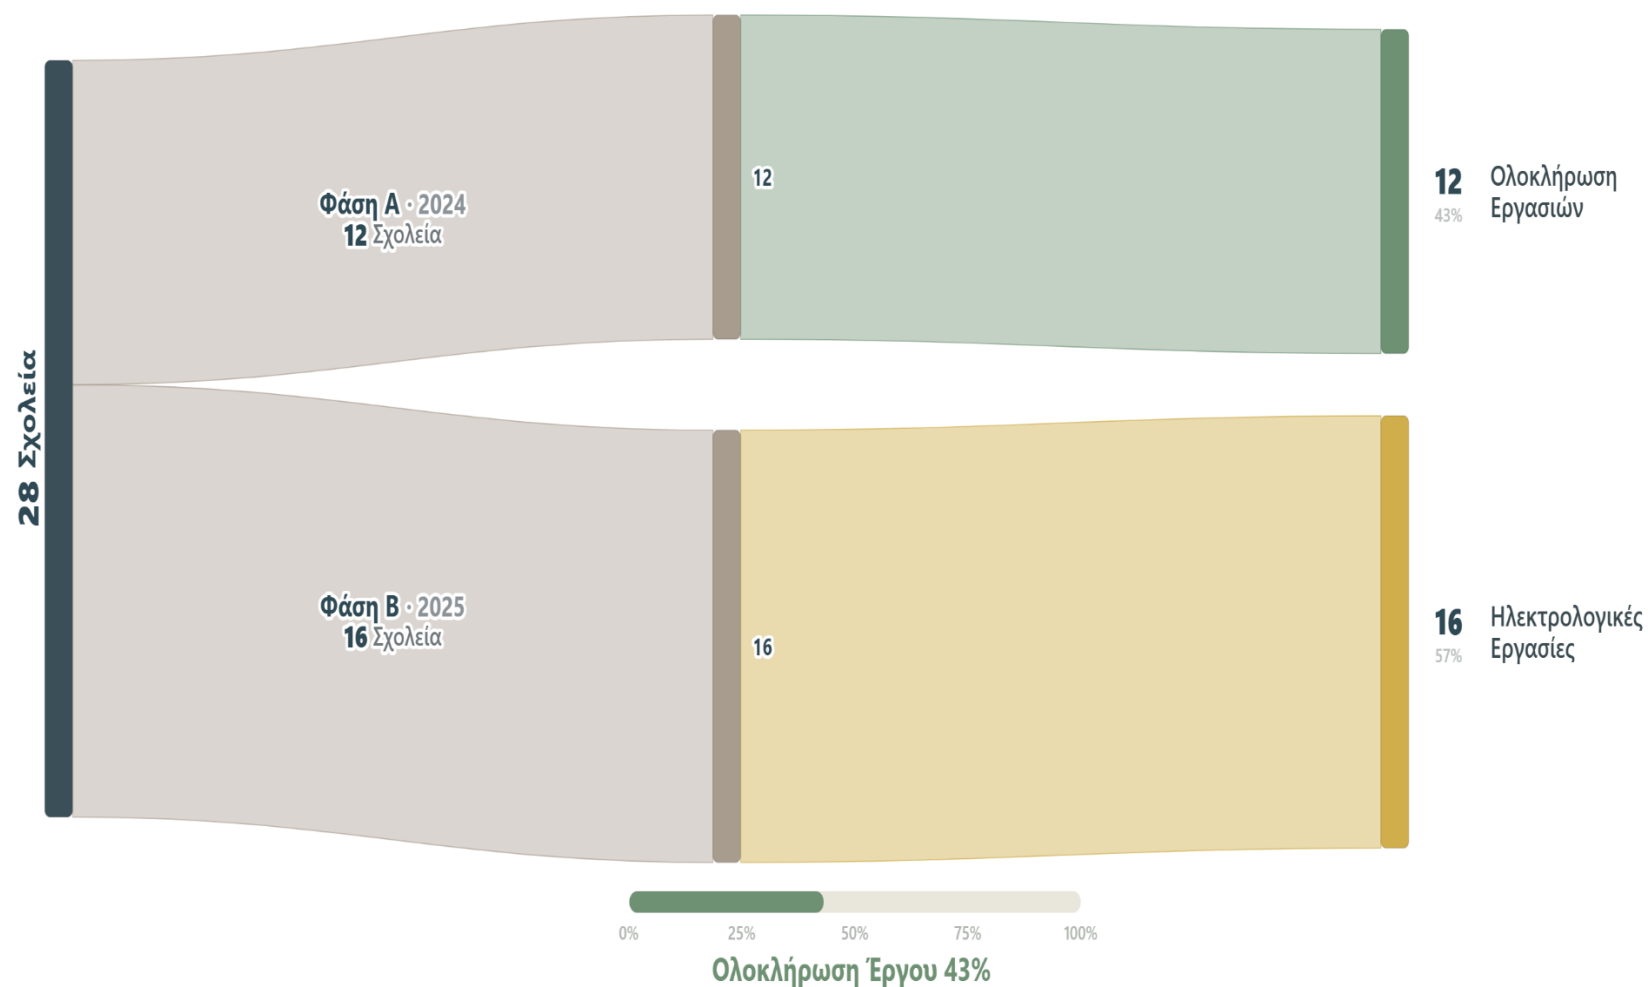

Γράφημα 18: Συνολική κατάσταση υλοποίησης της ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας.
Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας τον Ιούνιο 2026.

3.2.3.5 Υλοποίηση από Σχολική Εφορεία Πάφου

Η ΣχΕφ Πάφου έχει επιλέξει συνολικά 23 δημόσια σχολεία για εγκατάσταση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό αναφορά Έργου, από τα οποία 10 σχολεία έχουν συμπεριληφθεί στη Φάση Α και 13 σχολεία στη Φάση Β του Έργου.

Για τη Φάση Α, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στα επτά από τα 10 σχολεία, ενώ σε τρία σχολεία εκκρεμεί ο έλεγχος από την ΑΗΚ. Η κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Α σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Πάφου παρουσιάζεται στο Γράφημα 19.

ΣχΕφ Πάφου - Φάση Α: Κατάσταση Εργασιών



Κατάσταση	Σχολεία	%
 Έλεγχος από ΑΗΚ	3 σχολεία	30%
 Ολοκλήρωση Εργασιών	7 σχολεία	70%

Γράφημα 19: Κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Α της ΣχΕφ Πάφου.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Πάφου τον Ιούλιο 2026.

Για τη Φάση Β, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στα δύο από τα 13 σχολεία, ενώ στα υπόλοιπα 11 σχολεία βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση των κλιματιστικών. Η κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Β σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Πάφου παρουσιάζεται στο Γράφημα 20.

ΣχΕφ Πάφου - Φάση Β: Κατάσταση Εργασιών




Κατάσταση	Σχολεία	%
 Εγκατάσταση κλιματιστικών	11 σχολεία	85%
 Ολοκλήρωση Εργασιών	2 σχολεία	15%

Γράφημα 20: Κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Β της ΣχΕφ Πάφου.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Πάφου τον Ιούλιο 2026.

Η συνολική κατάσταση υλοποίησης του Έργου σε δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Πάφου παρουσιάζεται στο Γράφημα 21.

Συνολική Κατάσταση Υλοποίησης - ΣχΕφ Πάφου

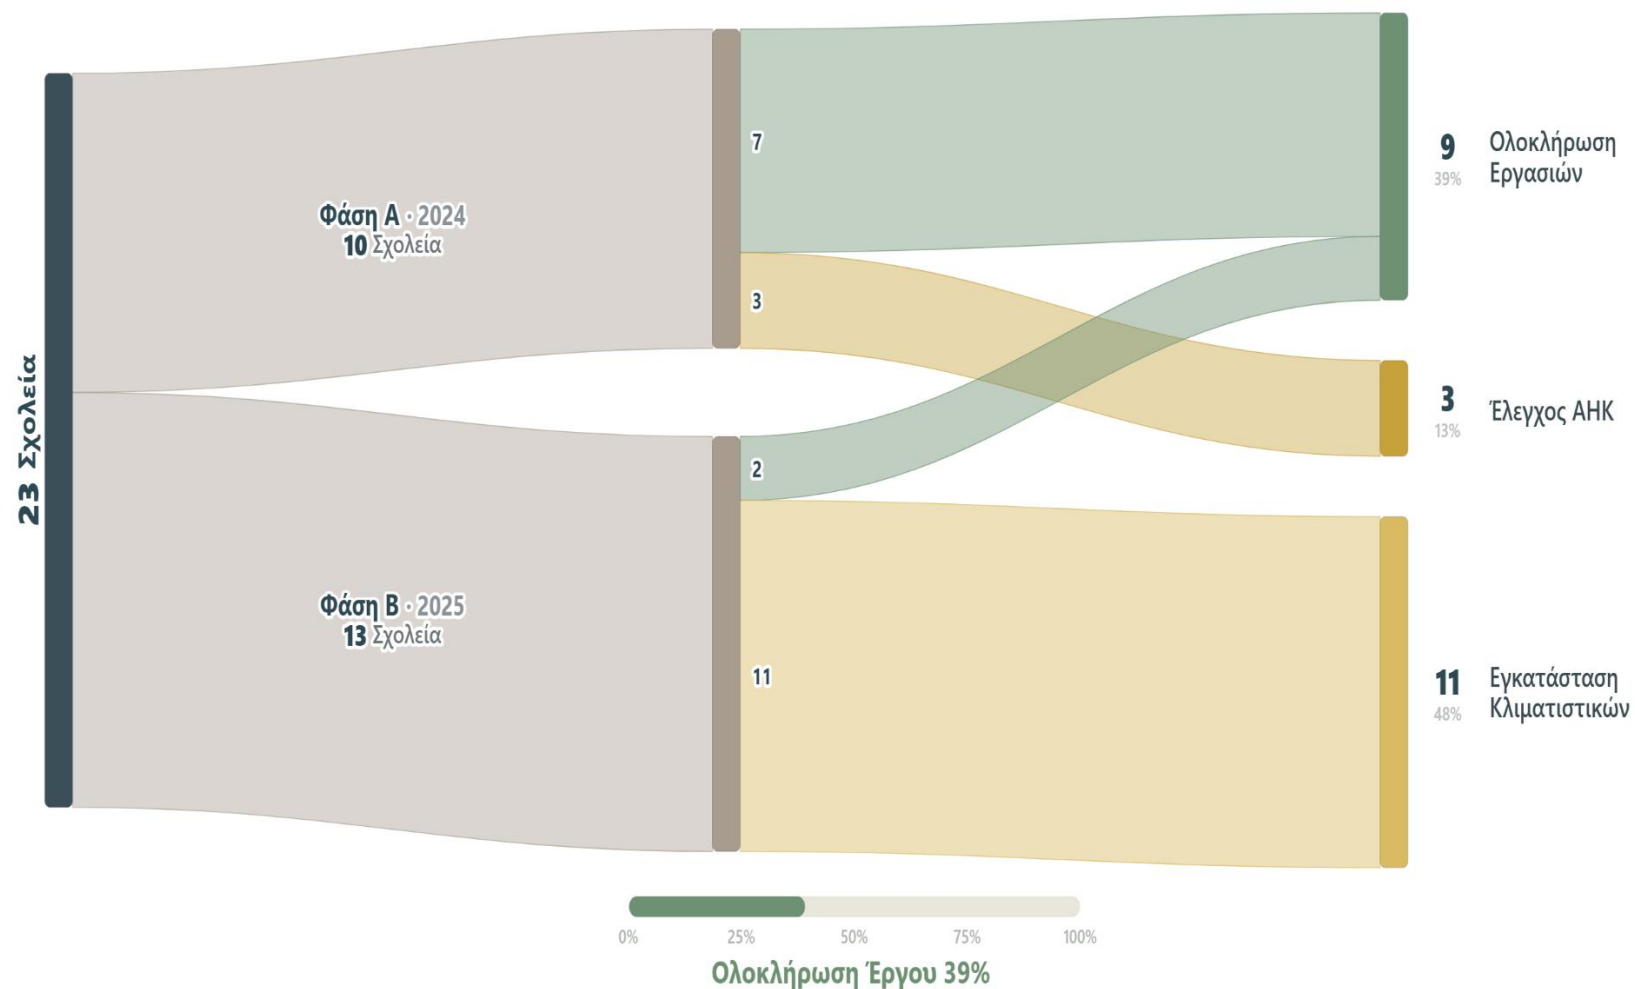

Γράφημα 21: Συνολική κατάσταση υλοποίησης της ΣχΕφ Πάφου.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Πάφου τον Ιούλιο 2026.

3.2.4 Συνολική κατάσταση Έργου

Ποσοστό υλοποίησης εργασιών

Στα Γραφήματα 23 -25 παρουσιάζεται η συνολική κατάσταση των εργασιών ανά Φάση υλοποίησης του Έργου.

Κατάσταση Φάσης Α μέχρι τον Ιούλιο 2026



Γράφημα 22: Κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Α μέχρι τον Ιούλιο του 2026.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από ΣχΕφ τον Ιούλιο 2026.


Κατάσταση Φάσης Β μέχρι τον Ιούλιο 2026



Γράφημα 23: Κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Β μέχρι τον Ιούλιο του 2026.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από ΣχΕφ τον Ιούλιο 2026.

Κατάσταση Φάσης Γ μέχρι τον Ιούλιο 2026

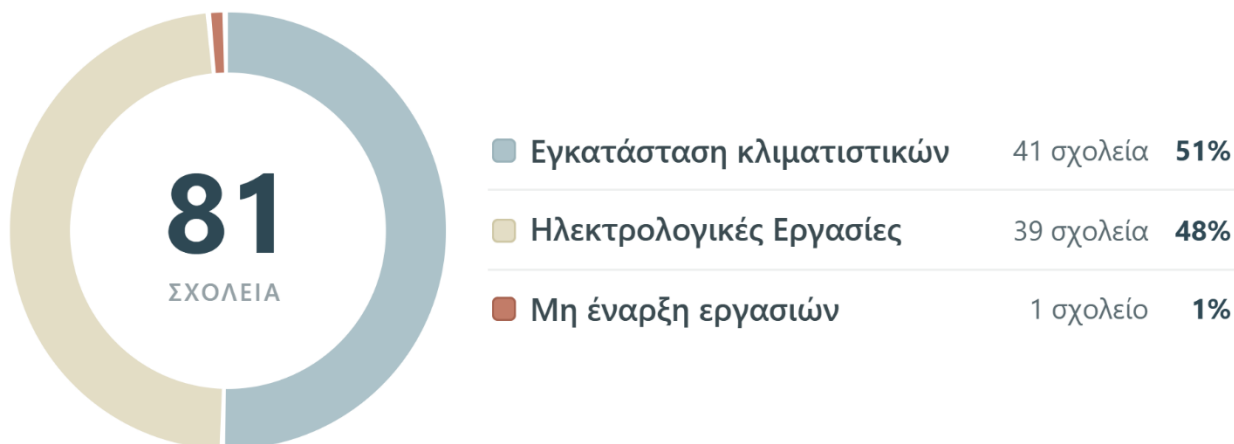

Γράφημα 24: Κατάσταση υλοποίησης της Φάσης Γ μέχρι τον Ιούλιο του 2026.


Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από ΣχΕφ τον Ιούλιο 2026.

Συνολικά, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε 81 από τις 219 περιπτώσεις ένταξης δημόσιων σχολείων που έχουν ενταχθεί στο υπό αναφορά Έργο, με το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασιών να ανέρχεται σε 37%. Σε έξι σχολεία εκκρεμεί ο έλεγχος από την ΑΗΚ, ενώ σε 79 σχολεία έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιματιστικών και εκκρεμούν οι ηλεκτρολογικές εργασίες και ο έλεγχος από την ΑΗΚ. Σε 52 σχολεία βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση των κλιματιστικών, ενώ σε ένα σχολείο δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες.

Από την εικόνα της συνολικής κατάστασης υλοποίησης του Έργου, όπως φαίνεται στο Γράφημα 25 που ακολουθεί, και λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, φαίνεται ότι ο στόχος υλοποίησης του Έργου μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026, όπως ήταν και ο αρχικός προγραμματισμός, θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

Επίσης, η παρατηρούμενη χρονική περίοδος που μεσολαβεί από την εγκατάσταση των κλιματιστικών μέχρι την ολοκλήρωση των ηλεκτρολογικών εργασιών και τον έλεγχό τους από την ΑΗΚ, δημιουργεί κίνδυνο να περιοριστεί η πραγματική αξιοποίηση της εγγύησης καλής λειτουργίας τους, ανάλογα με τους σχετικούς όρους της κάθε σύμβασης.

Συνολική Κατάσταση Υλοποίησης Έργου

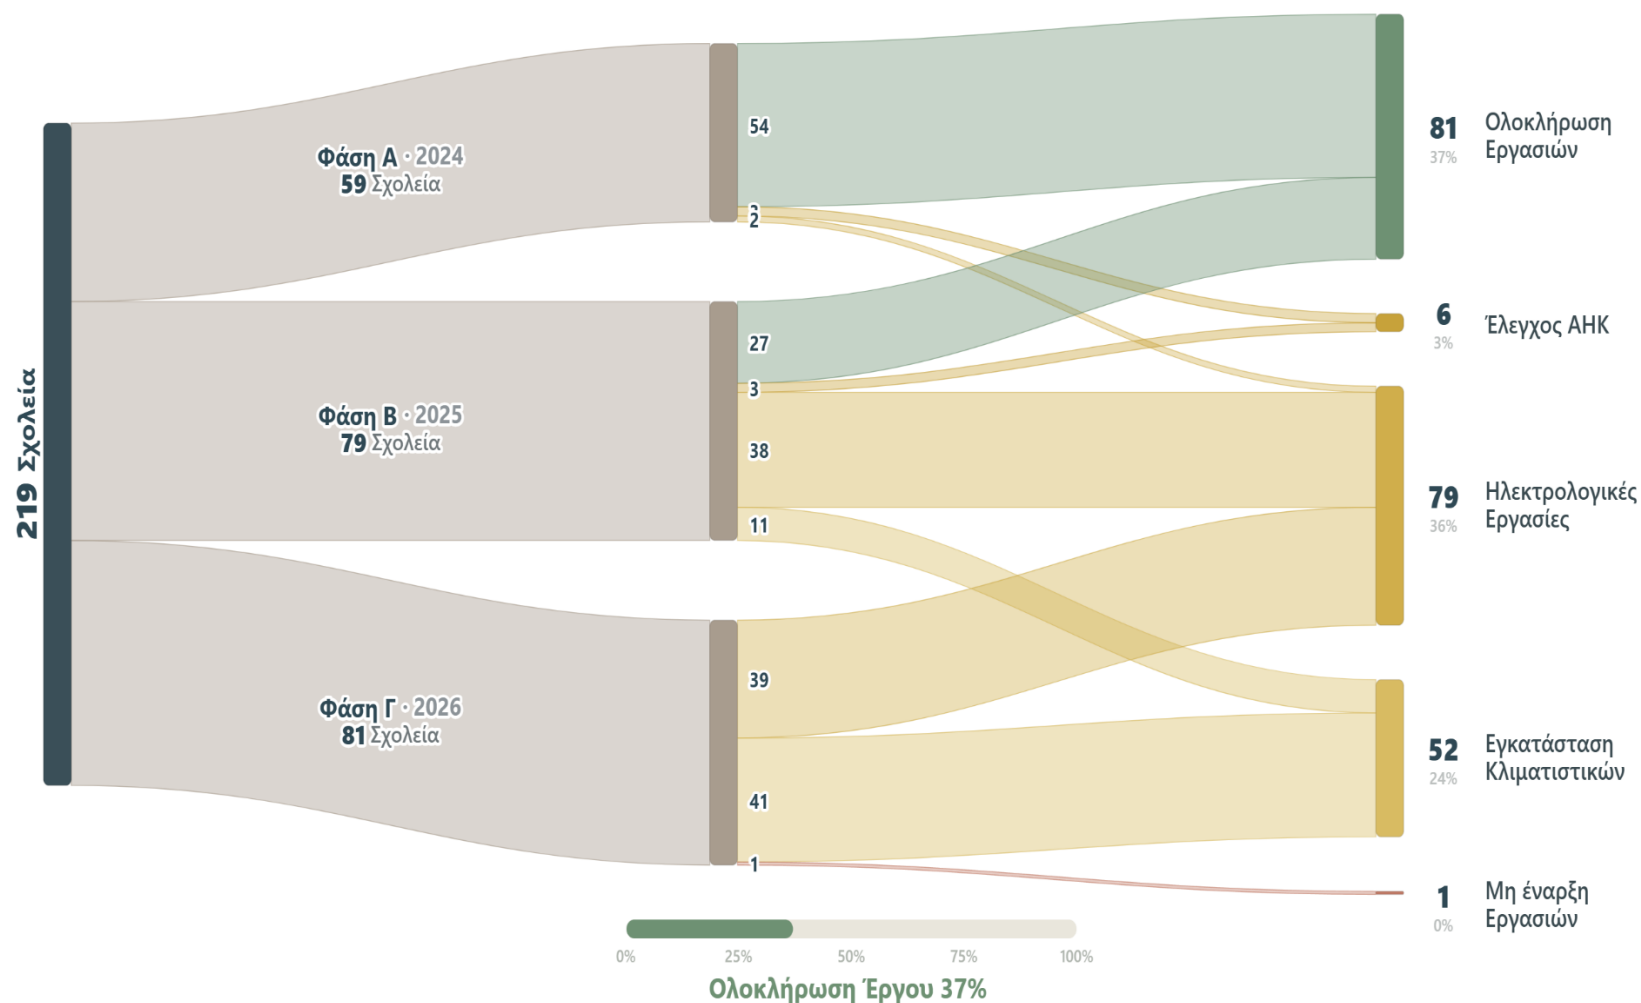

Γράφημα 25: Συνολική κατάσταση υλοποίησης του Έργου - Ιούλιος 2026.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από το ΥΠΑΝ και ΣχΕφ τον Ιούλιο 2026.

Τρέχον κόστος υλοποίησης Έργου

Με βάση τα στοιχεία τα οποία μάς είχαν δοθεί από τις ΣχΕφ, μέχρι τον Ιούλιο 2026 το τρέχον κόστος του Έργου ανερχόταν σε €9.819.430 πλέον ΦΠΑ, όπως αναλύεται ανά είδος εργασιών στο Γράφημα 26 που ακολουθεί.

Τρέχον κόστος Έργου μέχρι τον Ιούλιο 2026




Γράφημα 26: Τρέχον κόστος του Έργου ανά είδος μέχρι τον Ιούλιο του 2026.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από ΣχΕφ τον Ιούλιο 2026.

Αριθμός και κατασκευαστές κλιματιστικών

Ο συνολικός αριθμός κλιματιστικών που περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό του Έργου για εγκατάσταση ανέρχεται σε 5.165. Από αυτά, τα 1.278 κλιματιστικά έχουν εγκατασταθεί στη Φάση Α, ενώ στις Φάσεις Β και Γ έχουν εγκατασταθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία εγκατάστασης 2.123 και 1.764 κλιματιστικά, αντίστοιχα.

Αριθμός κλιματιστικών ανά φάση υλοποίησης

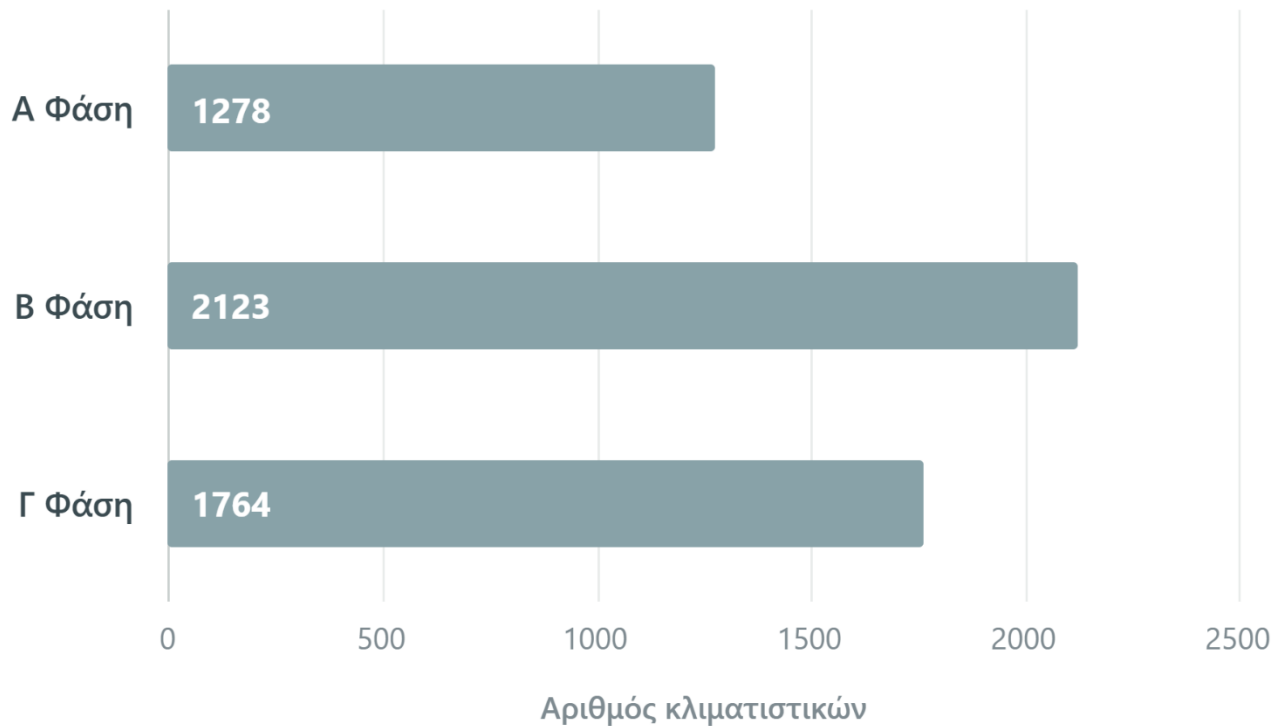


Γράφημα 27: Αριθμός κλιματιστικών ανά φάση υλοποίησης του Έργου.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από το ΥΠΑΝ και ΣχΕφ.

Από το σύνολο των 5.165 κλιματιστικών που έχουν εγκατασταθεί ή βρίσκονται υπό εγκατάσταση, τα 4.526 (ποσοστό 88%) είναι από τον κατασκευαστή Midea, ενώ τα υπόλοιπα 639 (ποσοστό 12%) είναι από τον κατασκευαστή Gree.

Αριθμός κλιματιστικών ανά κατασκευαστή

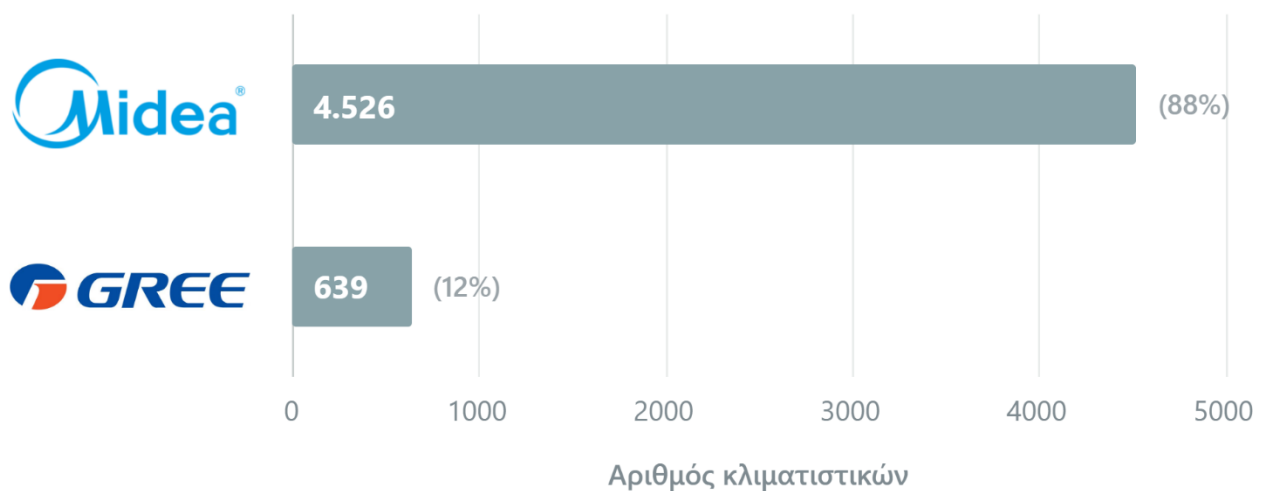

Γράφημα 28: Αριθμός κλιματιστικών ανά κατασκευαστή.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από το ΥΠΑΝ και ΣχΕφ.

Η συγκέντρωση του συνόλου των κλιματιστικών σε δύο κατασκευαστές καταδεικνύει την ανάγκη εξέτασης των παραγόντων που οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, χωρίς αυτό να συνιστά από μόνο του ένδειξη περιορισμού του ανταγωνισμού.

Διερεύνηση ανώνυμης καταγγελίας σχετικά με φωτογραφικές προσφορές εγκατάστασης κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία

Τον Μάρτιο 2026, στάλθηκε με επιστολή μας στον ΓΔ του ΥΠΑΝ ανώνυμη καταγγελία που είχε υποβληθεί στην Υπηρεσία μας κατά τη διάρκεια διενέργειας του παρόντος ελέγχου, στην οποία περιλαμβάνονταν διάφοροι ισχυρισμοί εναντίον λειτουργιών του Υπουργείου του και αφορούσαν μεταξύ άλλων ισχυρισμό ότι τροχοδρομούσαν τον καθορισμό φωτογραφικών προδιαγραφών σε διαγωνισμούς εγκατάστασης κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και το γεγονός ότι φαινόταν οι εν λόγω ισχυρισμοί να σχετίζονταν με καταγγελία που σύμφωνα με δημοσιεύματα είχε παραπεμφθεί κοντά τους από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για διερεύνηση, και ήδη διεξαγόταν σχετική έρευνα με οδηγίες της Υπουργού, ζητήσαμε όπως:

(α) Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται από το Υπουργείο τους διερευνήσουν και τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονταν στην πιο πάνω καταγγελία.

(β) Ενημερώσουν την Υπηρεσία μας για τα αποτελέσματα της έρευνας τους, όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Τον Ιούλιο 2026, ο ΓΔ του ΥΠΑΝ μάς πληροφόρησε ότι το Υπουργείο του είχε προβεί σε προκαταρκτική διοικητική έρευνα των πιο πάνω καταγγελιών εναντίον των συγκεκριμένων λειτουργιών, από την οποία προέκυψε ότι αυτές στερούνταν πραγματικής βάσης, δεν βασίζονταν σε αποδείξεις και γεγονότα και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να τεκμηριωθούν ή να επιβεβαιωθούν.

Συστάσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας

- Το ΥΠΑΝ, να λάβει μέτρα επίσπευσης των διαδικασιών υλοποίησης του έργου στη βάση των μέχρι σήμερα εμπειριών του και των σχετικών εισηγήσεων της παρούσας Έκθεσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί κατά το δυνατόν η ολοκλήρωση του Έργου εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.
- Σε μελλοντικά έργα παρόμοιας φύσεως, να γίνεται κατάλληλος σχεδιασμός έτσι ώστε να εκτελούνται οι απαιτούμενες εργασίες συντονισμένα με τη σειρά που ενδείκνυται, δηλαδή να προηγούνται οι απαιτούμενες μελέτες και η εξασφάλιση του απαιτούμενου ηλεκτρικού φορτίου, και να προκηρύσσονται διαγωνισμοί για ολόκληρα/ενιαία έργα ανά σχολείο/α. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται καθυστερήσεις που επηρεάζουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα (π.χ. έγκαιρη υλοποίηση των εργασιών, μειωμένες εγγυήσεις εξοπλισμού κλπ.), αλλά και θα διασφαλίζεται η ευρύτητα συμμετοχής και ο υγιής ανταγωνισμός προς όφελος του δημοσίου.
- Να σχεδιαστεί/προγραμματιστεί έγκαιρα πλάνο επίβλεψης της προβλεπόμενης από τις πιο πάνω συμβάσεις συντήρησης των εγκατεστημένων κλιματιστικών, η οποία αφορά σε ένα σημαντικό κόστος του όλου Έργου (€90 - €100+ΦΠΑ/κλιματιστικό/έτος για δύο επισκέψεις), με στόχο να μην παρουσιαστούν οι αδυναμίες που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση του Έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τις αδυναμίες/ελλείψεις των ΣχΕφ που περιλαμβάνονται στην παρούσα Έκθεση. Τα πιο πάνω θα μπορούσαν να διασφαλιστούν μέσω της ετοιμασίας ενός Οδηγού από το ΥΠΑΝ προς τις ΣχΕφ, με οδηγίες για την ορθή επίβλεψη των πιο πάνω εργασιών, έτσι ώστε να

διασφαλίζεται ότι θα παρέχονται οι προβλεπόμενες υπηρεσίες οι οποίες να πιστοποιούνται από αρμόδιο πρόσωπο ως προϋπόθεση για την πληρωμή τους.

3.3 Θέμα: Διαγωνισμοί υλοποίησης του Έργου

Για την υλοποίηση του Έργου έχουν προκηρυχθεί από τις ΣΧΕΦ διάφοροι διαγωνισμοί, με διάφορες διαδικασίες, όπως αναλύεται στις πιο κάτω υποπαραγράφους.

3.3.1 Δυναμικά Συστήματα Αγορών

Το ΓΛΤΔ, σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ, δημιούργησε τα ακόλουθα τέσσερα Δυναμικά Συστήματα Αγορών (ΔΣΑ) για την κάλυψη των αναγκών του Έργου (Εγκατάσταση Συστημάτων Κλιματισμού Διαιρεμένου Τύπου για ψύξη και θέρμανση) σε Σχολικά Κτήρια σε Παγκύπρια κάλυψη:

Αριθμός ΔΣΑ	Περιγραφή	Συνοτομογραφία
ΔΣΑ ΓΛ 08/2024	Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού Διαιρεμένου Τύπου, στη βάση καθορισμένων ελάχιστων κριτηρίων συμμετοχής σχετικά με ελάχιστο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού με συγκεκριμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα. Ημερομηνία δημιουργίας: Απρίλιος 2024	ΔΣΑ Εγκαταστατών
ΔΣΑ ΓΛ 24/2024	Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης και Εποπτείας, στη βάση καθορισμένων ελάχιστων κριτηρίων συμμετοχής σχετικά με την Ομάδα Έργου - τουλάχιστον ένα άτομο με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού, το οποίο να πληροί τα προβλεπόμενα ελάχιστα προσόντα και εμπειρία και να διαθέτει ισχύουσα εγγραφή μέλους στο ΕΤΕΚ. Ημερομηνία δημιουργίας: Νοέμβριος 2024	ΔΣΑ Μελετητών
ΓΛ ΔΣΑ/ΕΔ/03	Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, στη βάση καθορισμένων ελάχιστων κριτηρίων συμμετοχής σχετικά με την Ομάδα Έργου και την εμπειρία σε παρόμοια έργα. Ημερομηνία δημιουργίας: Μάρτιος 2025	ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων
ΔΣΑ ΓΛ 13/2026	Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων που να μην ξεπερνούν τα 150 kVA, στη βάση καθορισμένων ελάχιστων κριτηρίων συμμετοχής σχετικά με την Ομάδα Έργου και την εμπειρία σε παρόμοια έργα. Ημερομηνία δημιουργίας: Μάιος 2026	ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων 150 kVA

Πίνακας 3: ΔΣΑ που δημιουργήθηκαν για την υλοποίηση του Έργου.

Πλατφόρμα e-Agora

Πέραν των πιο πάνω ΔΣΑ, το ΓΛΤΔ, επιδιώκοντας να στηρίξει και τους μικρότερους ΟΦ που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ΣΧΕΦ, δημιούργησε τον Φεβρουάριο 2026 μια δεύτερη ανεξάρτητη διαδικασία όπου μέσω αυτής παρέχεται η δυνατότητα σε ικανούς ΟΦ να εγγραφούν στην e-Agora ώστε να είναι διαθέσιμοι προς τις ΣΧΕΦ, εφόσον επιλέξουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Η ένταξη στην e-Agora μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για ικανούς ΟΦ που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκτέλεση εργασιών κάτω των €25.000 σε μικρότερες σχολικές μονάδες. Μέσω της πλατφόρμας παρέχεται η δυνατότητα προβολής των υπηρεσιών τους, επιτρέποντας στις Αναθέτουσες Αρχές (ΑΑ) να διενεργούν έρευνα αγοράς και να απευθύνονται στους ΟΦ για υποβολή προσφοράς, διευκολύνοντας έτσι την ανάθεση εργασιών σε ΟΦ που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια αλλά δεν μπορούν

να εγκριθούν στο ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων, λόγω των ελάχιστων κριτηρίων τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων που καθορίζονταν στα έγγραφα του ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων

Παρόλο ότι το υπό αναφορά Έργο εξαγγέλθηκε από το ΥΠΑΝ το 2023, με υλοποίηση του μέσω εκπόνησης τριετούς σχεδιασμού για την τριετία 2024–2026, τα ΔΣΑ και η πλατφόρμα e-Agora δημιουργήθηκαν μεταγενέστερα μεταξύ Απριλίου 2024 – Μαΐου 2026, όπως αναφέρεται αναλυτικά πιο πάνω.

Συμμετέχοντες ΟΦ στα ΔΣΑ (με βάση στοιχεία μέχρι την ολοκλήρωση του παρόντος ελέγχου)

Στο Γράφημα 29 που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο αριθμός των συμμετεχόντων ΟΦ στα τέσσερα ΔΣΑ που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες του Έργου, καθώς και ο χρόνος έναρξης τους στο κάθε ένα από αυτά.

Συμμετέχοντες ΟΦ στα ΔΣΑ

Γράφημα 29: Συμμετέχοντες ΟΦ στα ΔΣΑ.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από το ΓΛτΔ τον Ιούνιο 2026.

Από τον έλεγχο των πιο πάνω διαδικασιών παρατηρήθηκε από την Υπηρεσία μας περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων ΟΦ στα τέσσερα ΔΣΑ. Μέχρι τον Ιούνιο 2026, είχαν εγκριθεί τέσσερις ΟΦ στα ΔΣΑ Εγκαταστατών και Ηλεκτρολόγων αντίστοιχα, ένας ΟΦ στο ΔΣΑ Μελετητών, ενώ δεν είχε εγκριθεί μέχρι την ολοκλήρωση του παρόντος ελέγχου κανένας ΟΦ στο νεοσύστατο ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων 150 kVA. Ως εκ τούτου, η μειωμένη συμμετοχή ΟΦ στα ΔΣΑ έχει οδηγήσει σε υποβολή πολύ μικρού αριθμού προσφορών στους σχετικούς διαγωνισμούς που είχαν προκηρυχθεί μέσω των ΔΣΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, με αποτέλεσμα να μην έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικός ανταγωνισμός.

3.3.2 Διαγωνισμοί από τις Σχολικές Εφορείες

Ενόψει του γεγονότος ότι η δημιουργία των ΔΣΑ δεν είχε γίνει στο στάδιο πριν την έναρξη υλοποίησης του Έργου, οι ΣχΕφ προκήρυξαν διαγωνισμούς μέσω άλλων διαδικασιών στα αρχικά στάδια υλοποίησής του. Η Υπηρεσία μας διεξήγαγε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε διάφορους διαγωνισμούς που

προκηρύχθηκαν από τις ΣχΕφ για την υλοποίηση του Έργου, περιλαμβανομένων διαγωνισμών μέσω των ΔΣΑ, και ακολουθεί η σχετική εικόνα για κάθε ΣχΕφ.

Τα ποσά που αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

3.3.2.1 Διαγωνισμοί Μελετητών

Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν, παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία για τις αναθέσεις των διαγωνισμών μελετητών που έγιναν ανά Φάση και ανά Επαρχία.

ΣχΕφ Λευκωσίας

A/A	Αριθμός Διαγωνισμού	Ημερομηνία Κατακύρωσης	Εκτιμώμενη Αξία	Ποσό Σύμβασης	Διαδικασία	Αριθμός Προσφορών	Ανάδοχος
Φάση Α							
1	Π27/2023-2024	26.3.2024	Δ/Υ*	€23.650	Δ/Υ*	2	ET Energy Box Ltd

Δ/Υ: Δεν υπάρχουν/δόθηκαν στοιχεία.

Πίνακας 4: Διαγωνισμοί Μελετητών της ΣχΕφ Λευκωσίας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λευκωσίας.

ΣχΕφ Λεμεσού

Α/Α	Αριθμός Διαγωνισμού	Ημερομηνία Κατακύρωσης	Εκτιμώμενη Αξία	Ποσό Σύμβασης	Απόκλιση από εκτίμηση		Διαδικασία	Αριθμός Προσφορών	Ανάδοχος
					€	%			
Φάση Α									
1	67/2023-2024	17.6.2024	€22.000	€20.150	-€1.850	-8,4%	ΣΔ*	2	ET Energy Box Ltd
Φάση Β									
2	12/2024-2025	17.1.2025	€40.000	€39.000	-€1.000	-2,5%	ΣΔ	Δ/Υ	ET Energy Box Ltd
Σύνολο			€62.000	€59.150	-€2.850	-4,6%			

*ΣΔ: Συνοπτική Διαδικασία

Πίνακας 5: Διαγωνισμοί Μελετητών της ΣχΕφ Λεμεσού.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λεμεσού και από το eProcurement.


Διαγωνισμοί Μελετητών - ΣχΕφ Λεμεσού

ΦΑΣΗ Α

ET Energy Box Ltd
Ιούνιος 2024
Εκτιμώμενη αξία €22.000
Ποσό σύμβασης €20.150

ΦΑΣΗ Β

ET Energy Box Ltd
Ιανουάριος 2025
Εκτιμώμενη αξία €40.000
Ποσό σύμβασης €39.000

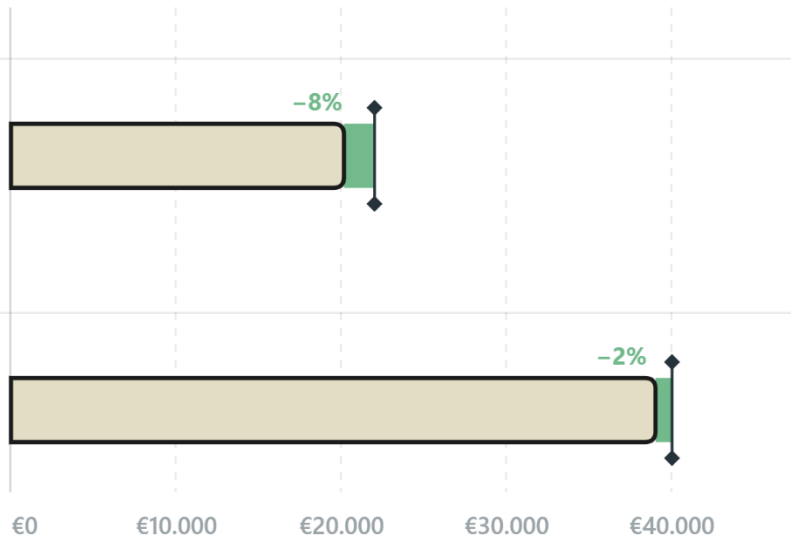

Ποσό σύμβασης Εξοικονόμηση Εκτιμώμενη αξία

Γράφημα 30: Διαγωνισμοί Μελετητών της ΣχΕφ Λεμεσού.
Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λεμεσού.

3.3.2.2 Διαγωνισμοί Εγκαταστατών Κλιματιστικών

Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν, παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία για τις αναθέσεις των διαγωνισμών εγκαταστατών κλιματιστικών που έγιναν ανά Φάση και ανά Επαρχία.

Σχολική Εφορεία Λευκωσίας

Α/Α	Αριθμός Διαγωνισμού	Ημερομηνία Κατακύρωσης	Εκτιμώμενη Αξία	Ποσό Σύμβασης	Απόκλιση από εκτίμηση		Διαδικασία	Αριθμός Προσφορών	Ανάδοχος
					€	%			
Φάση Α									
1	8 (2023/2024)	17.06.2024	€280.000	€570.670	€290.670	103,8%	ΔΣΑ*	1	Blue Sun Automation Ltd
Φάση Β									
2	6 (2024/2025)	26.03.2025	€900.000	€1.079.514	€179.514	19,9%	ΔΣΑ	1	Blue Sun Automation Ltd
Φάση Γ									
3	5 (2025/2026)	3.3.2026	€1.500.000	€1.661.030	€161.030	10,7%	ΔΣΑ	2	Blue Sun Automation Ltd
Σύνολο			€2.680.000	€3.311.214	+€631.214	+23,6%			

*ΔΣΑ: Δυναμικό Σύστημα Αγορών


Πίνακας 6: Διαγωνισμοί ΔΣΑ Εγκαταστατών της ΣχΕφ Λευκωσίας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λευκωσίας και από το eProcurement.

Διαγωνισμοί ΔΣΑ Εγκαταστατών - ΣχΕφ Λευκωσία


ΦΑΣΗ Α

Blue Sun Automation Ltd
Ιούνιος 2024
Εκτιμώμενη αξία €280.000
Ποσό σύμβασης €570.670



ΦΑΣΗ Β

Blue Sun Automation Ltd
Μάρτιος 2025
Εκτιμώμενη αξία €900.000
Ποσό σύμβασης €1.079.514



ΦΑΣΗ Γ

Blue Sun Automation Ltd
Μάρτιος 2026
Εκτιμώμενη αξία €1.500.000
Ποσό σύμβασης €1.661.030



Ποσό σύμβασης
 Υπέρβαση
 Εκτιμώμενη αξία

Γράφημα 31: Διαγωνισμοί ΔΣΑ Εγκαταστατών της ΣχΕφ Λευκωσίας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λευκωσίας και από το eProcurement.

Σχολική Εφορεία Λεμεσού

Α/Α	Αριθμός Διαγωνισμού	Ημερομηνία Κατακύρωσης	Εκτιμώμενη Αξία	Ποσό Σύμβασης	Απόκλιση από εκτίμηση		Διαδικασία	Αριθμός Προσφορών	Ανάδοχος
					€	%			
Φάση Α									
1	68/2023-2024/ΑΔ	2.8.2024	€125.000	€216.000	€91.000	72,8%	ΔΣΑ	1	Teklima Ltd
2	75/2023-2024/ΑΔ	6.9.2024	€97.500	€128.875	€31.375	32,2%	ΣΔ	1	Chanat Ltd
Φάση Β									
3	19/2024-2025/ΑΔ	24.3.2025	€174.000	€198.300	€24.300	14,0%	ΔΣΑ	2	Teklima Ltd
4	27/2024-2025/ΑΔ	7.4.2025	€159.000	€194.830	€35.830	22,5%	ΔΣΑ	2	Blue Sun Automation Ltd
5	34/2024-2025/ΑΔ	23.4.2025	€157.500	€185.150	€27.650	17,6%	ΔΣΑ	1	Teklima Ltd
Φάση Γ									
6	17/2025-2026/ΑΔ	5.3.2026	€150.000	€178.500	€28.500	19,0%	ΔΣΑ	2	Chanat Ltd
7	35/2025-2026/ΑΔ	22.4.2026	€309.000	€371.650	€62.650	20,3%	ΔΣΑ	2	Teklima Ltd
8	38/2025-2026/ΑΔ	26.5.2026	€221.000	€252.350	€31.350	14,2%	ΔΣΑ	1	Chanat Ltd
9	40/2025-2026/ΑΔ	17.6.2026	€144.500	€161.525	€17.025	11,8%	ΔΣΑ	1	Teklima Ltd
Σύνολο			€1.537.500	€1.887.180	+€349.680	+22,7%			

Πίνακας 7: Διαγωνισμοί ΔΣΑ Εγκαταστατών της ΣχΕφ Λεμεσού.


Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λεμεσού και από το eProcurement.

Διαγωνισμοί ΔΣΑ Εγκαταστατών - ΣχΕφ Λεμεσού

ΦΑΣΗ Α

Teklima Ltd
Αύγουστος 2024
Εκτιμώμενη αξία €125.000
Ποσό σύμβασης €216.000

Chanat Ltd
Σεπτέμβριος 2024
Εκτιμώμενη αξία €97.500
Ποσό σύμβασης €128.875

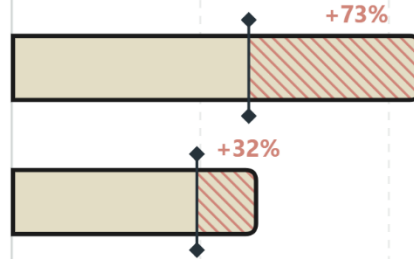


ΦΑΣΗ Β

Teklima Ltd
Μάρτιος 2025
Εκτιμώμενη αξία €174.000
Ποσό σύμβασης €198.300

Blue Sun Automation Ltd
Απρίλιος 2025
Εκτιμώμενη αξία €159.000
Ποσό σύμβασης €194.830

Teklima Ltd
Απρίλιος 2025
Εκτιμώμενη αξία €157.500
Ποσό σύμβασης €185.150

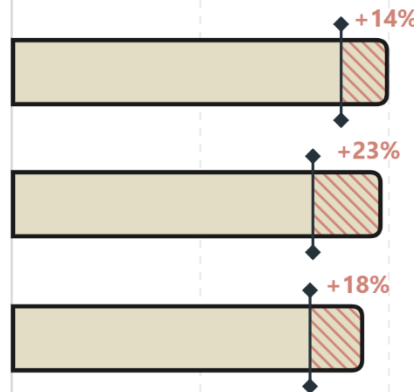


ΦΑΣΗ Γ

Chanat Ltd
Μάρτιος 2026
Εκτιμώμενη αξία €150.000
Ποσό σύμβασης €178.500

Teklima Ltd
Απρίλιος 2026
Εκτιμώμενη αξία €309.000
Ποσό σύμβασης €371.650

Chanat Ltd
Μάιος 2026
Εκτιμώμενη αξία €221.000
Ποσό σύμβασης €252.350

Teklima Ltd
Ιούνιος 2026
Εκτιμώμενη αξία €144.500
Ποσό σύμβασης €161.525

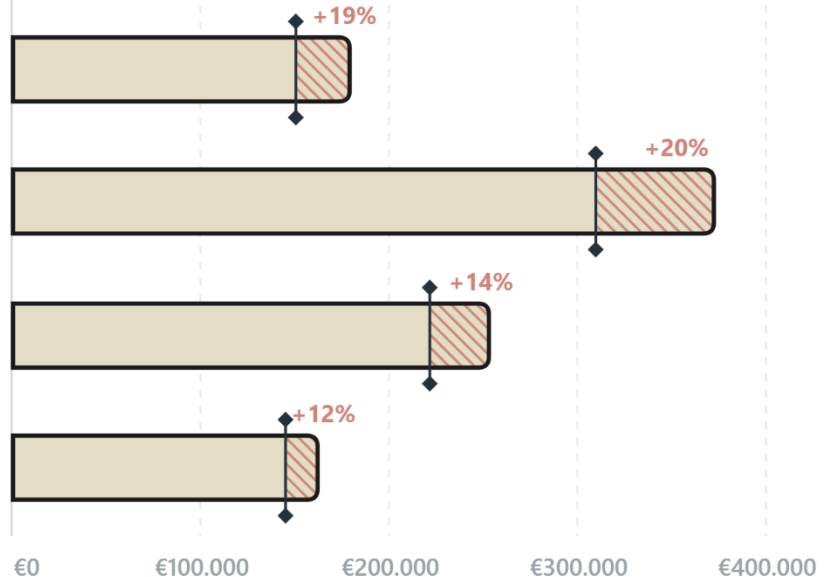

Ποσό σύμβασης Υπέρβαση Εκτιμώμενη αξία

Γράφημα 32: Διαγωνισμοί ΔΣΑ Εγκαταστατών της ΣχΕφ Λεμεσού.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λεμεσού και από το eProcurement.

Σχολική Εφορεία Λάρνακας

Α/Α	Αριθμός Διαγωνισμού	Ημερομηνία Κατακύρωσης	Εκτιμώμενη Αξία	Ποσό Σύμβασης	Απόκλιση από εκτίμηση		Διαδικασία	Αριθμός Προσφορών	Ανάδοχος
					€	%			
Φάση Α									
1	10/2023-2024	13.8.2024	€315.000	€349.700	€34.700	11%	ΔΣΑ	2	Teklima Ltd
Φάση Β									
2	23/2024-2025	17.7.2025	€460.000	€611.785	€151.785	33%	ΔΣΑ	2	Teklima Ltd
Σύνολο			€775.000	€961.485	+186.485	+24,1%			

Πίνακας 8: Διαγωνισμοί ΔΣΑ Εγκαταστατών της ΣχΕφ Λάρνακας.


Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λάρνακας και από το eProcurement.

Διαγωνισμοί Εγκαταστατών - ΣχΕφ Λάρνακας**ΦΑΣΗ Α**

Teklima Ltd
Αύγουστος 2024
Εκτιμώμενη αξία €315.000
Ποσό σύμβασης €349.700

ΦΑΣΗ Β

Teklima Ltd
Ιούλιος 2025
Εκτιμώμενη αξία €460.000
Ποσό σύμβασης €611.785

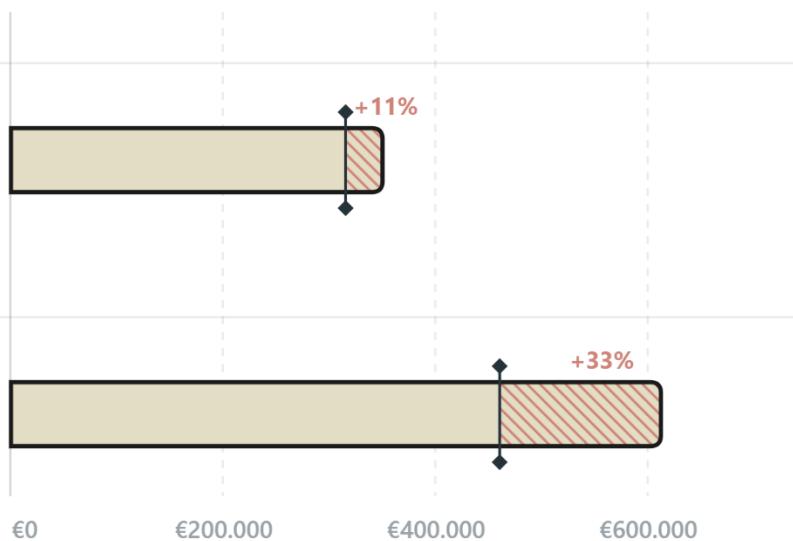

Ποσό σύμβασης Υπέρβαση Εκτιμώμενη αξία

Γράφημα 33: Διαγωνισμοί ΔΣΑ Εγκαταστατών της ΣχΕφ Λάρνακας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λάρνακας και από το eProcurement.

Σχολική Εφορεία Πάφου

Α/Α	Αριθμός Διαγωνισμού	Ημερομηνία Κατακύρωσης	Εκτιμώμενη Αξία	Ποσό Σύμβασης	Απόκλιση από εκτίμηση		Διαδικασία	Αριθμός Προσφορών	Ανάδοχος
					€	%			
Φάση Α									
1	8/2023-2024	Δ/Υ*	€180.000	€307.125	€127.125	70,6%	ΔΣΑ	2	Teklima Ltd
Φάση Β									
2	ΑΔ3/2025-2026	Δ/Υ	€355.000	€391.800	€36.800	10,4%	ΔΣΑ	2	Chanat Ltd
Σύνολο			€535.000	€698.925	+€163.925	+30,6%			

*Δ/Υ: Δεν υπάρχουν/δόθηκαν στοιχεία.

Πίνακας 9: Διαγωνισμοί ΔΣΑ Εγκαταστατών της ΣχΕφ Πάφου.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Πάφου και από το eProcurement.


Διαγωνισμοί Εγκαταστατών - ΣχΕφ Πάφου

ΦΑΣΗ Α

Teklima Ltd
Ιούλιος 2024
Εκτιμώμενη αξία €180.000
Ποσό σύμβασης €307.125

ΦΑΣΗ Β

Chanat Ltd
Ιανουάριος 2026
Εκτιμώμενη αξία €355.000
Ποσό σύμβασης €391.800

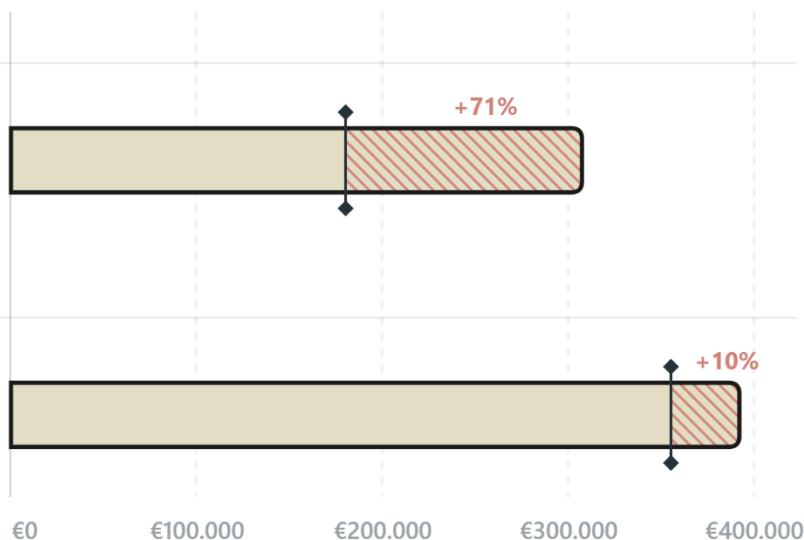

Ποσό σύμβασης Υπέρβαση Εκτιμώμενη αξία

Γράφημα 34: Διαγωνισμοί ΔΣΑ Εγκαταστατών της ΣχΕφ Πάφου.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Πάφου και από το eProcurement.

Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου-Δερύνειας

Α/Α	Αριθμός Διαγωνισμού	Ημερομηνία Κατακύρωσης	Εκτιμώμενη Αξία	Ποσό Σύμβασης	Απόκλιση από εκτίμηση		Διαδικασία	Αριθμός Προσφορών	Ανάδοχος
					€	%			
Φάση Α									
1	23/2023-2024	29.7.2024	€72.500	€88.190	€15.690	21,6%	ΔΣΑ	1	Blue Sun Automation Ltd
2	31/2023-2024	7.10.2024	€250.000	€289.520	€39.520	15,8%	ΔΣΑ	2	Blue Sun Automation Ltd
Φάση Β									
3	5/2025-2026	6.10.2025	€494.000	€578.020	€84.020	17,0%	ΔΣΑ	2	Chanat Ltd
Σύνολο			€816.500	€955.730	+€139.230	+17,1%			

Πίνακας 10: Διαγωνισμοί ΔΣΑ Εγκαταστατών της ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας και από το eProcurement.

Διαγωνισμοί Εγκαταστατών - ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας

ΦΑΣΗ Α

Blue Sun Automation Ltd

Ιούλιος 2024

Εκτιμώμενη αξία €72.500

Ποσό σύμβασης €88.190

Blue Sun Automation Ltd

Οκτώβριος 2024

Εκτιμώμενη αξία €250.000

Ποσό σύμβασης €289.520


ΦΑΣΗ Β

Chanat Ltd

Οκτώβριος 2025

Εκτιμώμενη αξία €494.000

Ποσό σύμβασης €578.020

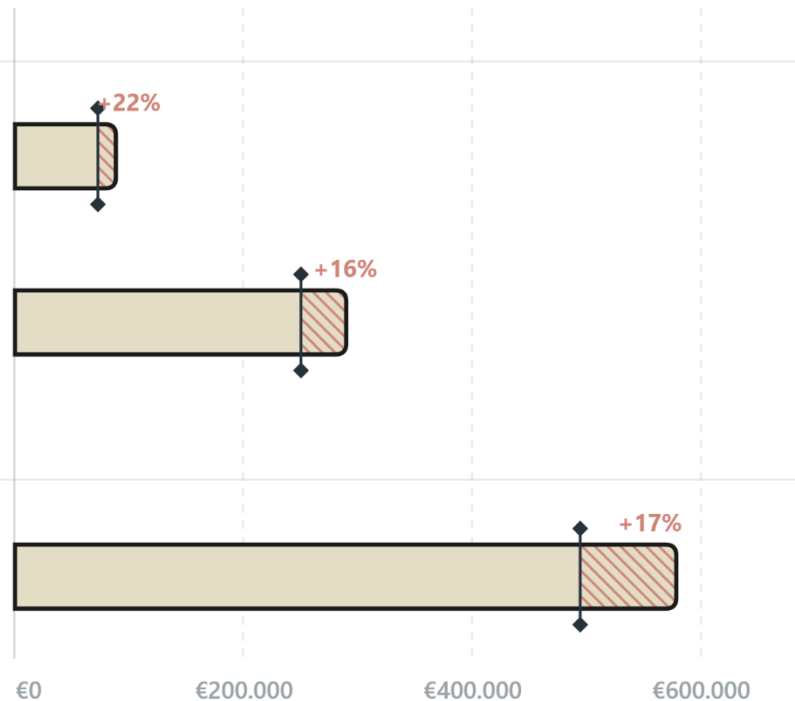

Ποσό σύμβασης Υπέρβαση Εκτιμώμενη αξία

Γράφημα 35: Διαγωνισμοί ΔΣΑ Εγκαταστατών της ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας και από το eProcurement.

3.3.2.3 Διαγωνισμοί Ηλεκτρολόγων

Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν, παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία για τις αναθέσεις των διαγωνισμών ηλεκτρολόγων που έγιναν ανά Φάση και ανά Επαρχία.

Σχολική Εφορεία Λευκωσίας

A/A	Αριθμός Διαγωνισμού	Ημερομηνία Κατακύρωσης	Εκτιμώμενη Αξία	Ποσό Σύμβασης	Διαδικασία	Αριθμός Προσφορών	Ανάδοχος
1	Π42/2023-2024	26.7.2024	Δ/Υ*	€48.700	Δ/Υ*	2	K.S Socratous Ltd

*Δ/Υ: Δεν υπάρχουν/δόθηκαν στοιχεία.

Πίνακας 11: Διαγωνισμοί Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών της ΣχΕφ Λευκωσίας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λευκωσίας.

Σχολική Εφορεία Λεμεσού

Α/Α	Αριθμός Διαγωνισμού	Ημερομηνία Κατακύρωσης	Εκτιμώμενη Αξία	Ποσό Σύμβασης	Απόκλιση από εκτίμηση		Διαδικασία	Αριθμός Προσφορών	Ανάδοχος
					€	%			
Φάση Α									
1	05/2024-2025/ΣΔ	24.10.2024	€34.000	€30.762	-€3.238	-9,5%	ΣΔ	Δ/Υ*	K.S. Socratous Ltd
2	9/2024-2025/ΑΔ	17.2.2025	€136.000	€127.590	-€8.410	-6,2%	ΑΔ*	Δ/Υ	K.S. Socratous Ltd
Φάση Β									
3	30/2024-2025/ΣΔ	7.4.2025	€70.000	€67.780	-€2.220	-3,2%	ΣΔ	Δ/Υ	ΟΦ Α
4	31/2024-2025/ΣΔ	7.4.2025	€60.000	€59.390	-€610	-1,0%	ΣΔ	Δ/Υ	K.S. Socratous Ltd
5	35/2024-2025/ΣΔ	8.5.2025	€53.000	€52.500	-€500	-0,9%	ΣΔ	Δ/Υ	K.S. Socratous Ltd
Φάση Γ									
6	34/2025-2026/ΑΔ	8.5.2026	€56.000	€63.500	€7.500	13,4%	ΔΣΑ	1	Y.A. Mouskos Electroteam Ltd
7	37/2025-2026/ΑΔ	4.6.2026	€74.200	€88.000	€13.800	18,6%	ΔΣΑ	2	Y.A. Mouskos Electroteam Ltd
Σύνολο			€483.200	€489.522	+€6.322	+1,3%			

*ΑΔ: Ανοικτή Διαδικασία

*Δ/Υ: Δεν υπάρχουν/δόθηκαν στοιχεία.

Πίνακας 12: Διαγωνισμοί Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών της ΣχΕφ Λεμεσού.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λεμεσού και από το eProcurement.

Διαγωνισμοί Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών - ΣχΕφ Λεμεσού

ΦΑΣΗ Α

K.S. Socratous Ltd
Οκτώβριος 2024
Εκτιμώμενη αξία €34.000
Ποσό σύμβασης €30.762

-10%

K.S. Socratous Ltd
Φεβρουάριος 2025
Εκτιμώμενη αξία €136.000
Ποσό σύμβασης €127.590

-6%

ΦΑΣΗ Β

Γιώργος Γενεθλίου
Απρίλιος 2025
Εκτιμώμενη αξία €70.000
Ποσό σύμβασης €67.780

-3%

K.S. Socratous Ltd
Απρίλιος 2025
Εκτιμώμενη αξία €60.000
Ποσό σύμβασης €59.390

-1%

K.S. Socratous Ltd
Μάιος 2025
Εκτιμώμενη αξία €53.000
Ποσό σύμβασης €52.500

-1%

ΦΑΣΗ Γ

Y.A. Mouskos Electroteam Ltd
Μάιος 2026
Εκτιμώμενη αξία €56.000
Ποσό σύμβασης €63.500

+13%

Y.A. Mouskos Electroteam Ltd
Ιούνιος 2026
Εκτιμώμενη αξία €74.200
Ποσό σύμβασης €88.000

+19%

€0 €50.000 €100.000 €150.000

Ποσό σύμβασης Υπέρβαση Εξοικονόμηση Εκτιμώμενη αξία

Γράφημα 36: Διαγωνισμοί Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών - ΣχΕφ Λεμεσού.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λεμεσού και από το eProcurement.

Σχολική Εφορεία Λάρνακας

Α/Α	Αριθμός Διαγωνισμού	Ημερομηνία Κατακύρωσης	Εκτιμώμενη Αξία	Ποσό Χορηγιών**	Απόκλιση από εκτίμηση		Διαδικασία	Αριθμός Προσφορών	Ανάδοχος
					€	%			
Φάση Α									
1	4/2024-2025/ΑΔ	Δ/Υ		€44.850	-	-	ΑΔ	Δ/Υ*	Υ.Α. Mouskos Electroteam Ltd
2	5/2024-2025/ΑΔ	Δ/Υ		€58.700	-	-	ΑΔ	Δ/Υ	Παντελής Ξιούρουππας ΑΤΔ
3	6/2024-2025/ΑΔ	Δ/Υ		€66.800	-	-	ΑΔ	Δ/Υ	
4	10/2024-2025/ΑΔ	Δ/Υ		€57.650	-	-	ΑΔ	Δ/Υ	
5	11/2024-2025/ΑΔ	Δ/Υ		€67.712	-	-	ΑΔ	Δ/Υ	
6	13/2024-2025/ΑΔ	Δ/Υ		€67.090	-	-	ΑΔ	Δ/Υ	
7	16/2024-2025/ΑΔ	Δ/Υ		€112.000	-	-	ΑΔ	Δ/Υ	Μιχάλης Τζιούρου ΑΤΔ
8	18/2024-2025/ΑΔ	Δ/Υ		€65.313	-	-	ΑΔ	Δ/Υ	
9	20/2024-2025/ΑΔ	Δ/Υ		€105.822	-	-	ΑΔ	Δ/Υ	Α.Μ.ΕΛ Ltd
10	21/2024-2025/ΑΔ	Δ/Υ		€97.565	-	-	Δ/Υ	Δ/Υ	
Φάση Β									
11	5/2025-2026/ΑΔ	Δ/Υ		€59.900	-	-	ΑΔ	Δ/Υ	Α.Μ.ΕΛ Ltd
12	2/2025-2026/ΑΔ	Δ/Υ		€74.680	-	-	ΑΔ	Δ/Υ	Υ.Α. Mouskos Electroteam Ltd
13	6/2025-2026/ΑΔ	Δ/Υ		€41.146	-	-	ΑΔ	Δ/Υ	Μιχάλης Τζιούρου ΑΤΔ
14	3/2025-2026/ΑΔ	Δ/Υ		€59.000	-	-	ΑΔ	Δ/Υ	Υ.Α. Mouskos Electroteam Ltd
15	4/2025-2026/ΑΔ	Δ/Υ		€58.424	-	-	ΑΔ	Δ/Υ	Υ.Α. Mouskos Electroteam Ltd
17	8/2025-2026/ΑΔ	Δ/Υ		€23.962	-	-	ΑΔ	Δ/Υ	Μιχάλης Τζιούρου ΑΤΔ
18	9/2025-2026	Δ/Υ		€36.410	-	-	Δ/Υ	Δ/Υ	
Σύνολο					-	-			

*Δ/Υ: Δεν υπάρχουν/δόθηκαν στοιχεία.

**Στην περίπτωση της ΣχΕφ Λάρνακας μάς δόθηκαν τα ποσά χορηγιών αντί τα ποσά κατακύρωσης.

Πίνακας 13: Πίνακας χορηγιών για τους διαγωνισμούς Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών της ΣχΕφ Λάρνακας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λάρνακας και από το eProcurement.

Σχολική Εφορεία Πάφου


Α/Α	Αριθμός Διαγωνισμού	Ημερομηνία Κατακύρωσης	Εκτιμώμενη Αξία	Ποσό Σύμβασης	Απόκλιση από εκτίμηση		Διαδικασία	Ανάδοχος
					€	%		
Φάση Β								
1	ΑΔ2/2024-2025	16.1.2025	€130.000	€153.390	€23.390	18,0%	ΑΔ	K.S. Socratous Ltd
Σύνολο			€130.000	€153.390	+€23.390	+18,0%		

Πίνακας 14: Διαγωνισμοί Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών της ΣχΕφ Πάφου.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Πάφου και από το eProcurement.

Διαγωνισμοί Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών - ΣχΕφ Πάφου**ΦΑΣΗ Β**

K.S. Socratous Ltd
Ιανουάριος 2025
Εκτιμώμενη αξία €130.000
Ποσό σύμβασης €153.390

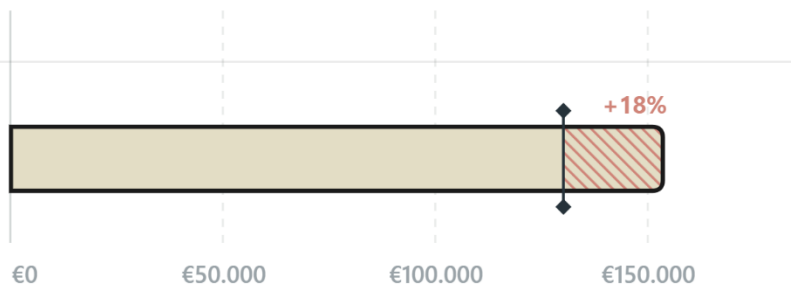

Ποσό σύμβασης Υπέρβαση Εκτιμώμενη αξία

Γράφημα 37: Διαγωνισμοί Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών της ΣχΕφ Πάφου.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Πάφου και από το eProcurement.

Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου-Δερύνειας

Α/Α	Αριθμός Διαγωνισμού	Ημερομηνία Κατακύρωσης	Εκτιμώμενη Αξία	Ποσό Σύμβασης	Απόκλιση από εκτίμηση		Διαδικασία	Ανάδοχος
					€	%		
Φάση Β								
1	30/2023-2024	29.8.2024	€102.750	€133.460	€30.710	29,9%	ΑΔ	Μιχάλης Τζιούρου ΛΤΔ
Σύνολο			€102.750	€133.460	+€30.710	+29,9%		

Πίνακας 15: Διαγωνισμοί Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών της ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας και από το eProcurement.

Διαγωνισμοί Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών - ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας


ΦΑΣΗ Β

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΟΥΡΡΟΥ ΛΤΔ

Αύγουστος 2024

Εκτιμώμενη αξία €102.750

Ποσό σύμβασης €133.460

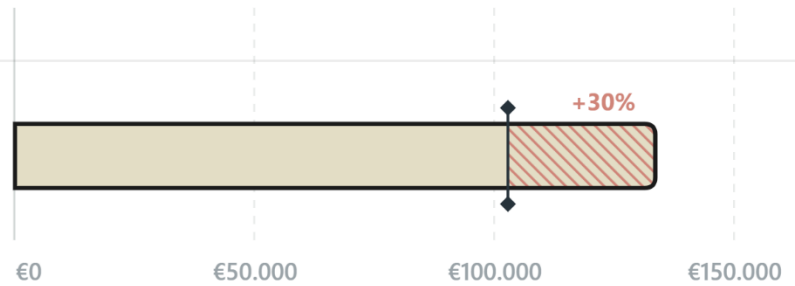

Ποσό σύμβασης Υπέρβαση Εκτιμώμενη αξία

Γράφημα 38: Διαγωνισμοί Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών της ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Παραλιμνίου-Δερύνειας και από το eProcurement.

Από τα πιο πάνω στοιχεία διαπιστώνεται υπέρβαση της εκτιμώμενης δαπάνης στους πλείστους διαγωνισμούς, σε υψηλά μάλιστα ποσοστά σε αρκετές περιπτώσεις. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον μειωμένο αριθμό ΟΦ που λάμβανε μέρος στους διαγωνισμούς, καταδεικνύει ότι οι τεχνικές και επαγγελματικές απαιτήσεις που είχαν καθοριστεί ως προϋποθέσεις συμμετοχής, εκ του αποτελέσματος, δεν διασφάλισαν την ευρύτητα συμμετοχής και την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Τα πιο πάνω οδήγησαν σε υπερβάσεις των συμβάσεων από τις εκτιμήσεις κόστους καθώς και καθυστέρηση στην υλοποίηση του Έργου. Πέραν των πιο πάνω, διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες περιπτώσεις όπου υπήρξε υπέρβαση στην εκτίμηση δαπάνης αφορούν σε διαδικασίες ανάθεσης μέσω των ΔΣΑ. Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται σε αυτήν καθαυτή τη διαδικασία, η οποία διεξάγεται μεν από το ΓΛΤΔ αλλά οι απαιτήσεις/προϋποθέσεις συμμετοχής που έχουν περιληφθεί σε αυτήν καθορίζονται από το ΥΠΑΝ.

Συστάσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας

- Ο σχεδιασμός και η προκήρυξη διαγωνισμών και κατ' επέκταση η ανάθεση των αντίστοιχων συμβάσεων για την υλοποίηση έργων και, κυρίως μεγάλων και πολύπλοκων όπως το υπό αναφορά Έργο, να γίνονται έγκαιρα έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η υλοποίηση τους τόσο σε χρόνο όσο και σε κόστος με όλες τις συνεπακόλουθες συνέπειες. Επίσης, οι απαιτήσεις/προϋποθέσεις συμμετοχής στους εκάστοτε διαγωνισμούς να καθορίζονται μέσα από ενδελεχή έρευνα της αγοράς και να είναι αναλογικές των απαιτήσεων της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Οι πιο πάνω διαπιστώσεις και συστάσεις να ληφθούν σοβαρά υπόψη από το ΥΠΑΝ για το υπόλοιπο της ολοκλήρωσης του παρόντος Έργου, αλλά και σε μελλοντικά παρόμοια έργα για την εγκατάσταση κλιματιστικών στα υπόλοιπα δημόσια σχολεία όπου απαιτείται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτητα συμμετοχής και η διασφάλιση του ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου.
- Όπου τεκμηριώνεται να εξετάζεται η προκήρυξη διαγωνισμών με ενοποίηση ομοειδών προμηθειών και εργασιών σε έναν ενιαίο διαγωνισμό ανά φάση, με διαίρεση του αντικειμένου σε τμήματα ανά ομάδα σχολικών μονάδων και δυνατότητα ανάθεσης σε περισσότερους του ενός αναδόχους. Η προσέγγιση αυτή δύναται να συμβάλει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, στη μείωση του διοικητικού κόστους και στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του Έργου.

3.3.3 Παράπονο ΟΦ σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής στο ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων

Τον Ιανουάριο 2026, ενδιαφερόμενος ΟΦ είχε υποβάλει γραπτό παράπονο/καταγγελία στο ΥΠΑΝ, στο ΓΛΤΔ, στην Υπηρεσία μας, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στη ΣΧΕΦ Λεμεσού και σε Επαγγελματικούς Συνδέσμους για τα ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής που είχαν καθοριστεί στο ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων, με τον ισχυρισμό ότι είχαν δημιουργήσει ουσιαστικούς και δυσανάλογους φραγμούς χωρίς να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους σε σχέση με τη φύση και την έκταση των εν λόγω ηλεκτρολογικών εργασιών, αποκλείοντας μεγάλο αριθμό επαγγελματιών ηλεκτρολόγων εργοληπτών, οι οποίοι διέθεταν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και εμπειρία.

Τον Φεβρουάριο 2026, το ΓΛΤΔ απάντησε στον παραπονούμενο ΟΦ επεξηγώντας τους λόγους καθορισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, οι οποίοι σχετίζονταν κυρίως με το γεγονός ότι οι εργασίες θα εκτελούνταν σε σχολικές μονάδες, οι οποίες αποτελούν ευαίσθητα κτήρια με αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας και καθημερινή παρουσία παιδιών και εργαζομένων. Παράλληλα, το ΓΛΤΔ, επιδιώκοντας να στηρίξει και τους μικρότερους ΟΦ που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ΣΧΕΦ, είχε δημιουργήσει μια δεύτερη ανεξάρτητη διαδικασία μέσω της οποίας παρέχονταν η δυνατότητα σε ικανούς ΟΦ να εγγραφούν στην e-Agora ώστε να είναι διαθέσιμοι προς τις ΣΧΕΦ, εφόσον επιλέξουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Τέλος, τον πληροφόρησε ότι το ΥΠΑΝ είχε καθορίσει τις προδιαγραφές και τα ελάχιστα οικονομικά και επαγγελματικά/τεχνικά κριτήρια συμμετοχής του ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων, τα οποία εφαρμόζονται οριζόντια σε όλους τους ΟΦ, και σε περίπτωση που διαφωνούσε μπορούσε να αποταθεί στο ΥΠΑΝ, αρμόδιο φορέα υλοποίησης του Έργου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης του πιο πάνω παραπόνου από την Υπηρεσία μας, πληροφορήσαμε με επιστολή μας τον Φεβρουάριο 2026 το ΥΠΑΝ ότι είχαμε διαπιστώσει περιορισμένη συμμετοχή από αδειούχους ηλεκτρολόγους εργολήπτες σε διαγωνισμούς που είχαν προκηρύξει οι ΣΧΕΦ, με αποτέλεσμα να μην είχε αναπτυχθεί ικανοποιητικός ανταγωνισμός. Επίσης, οι ΣΧΕΦ ακολουθούσαν διαφορετικούς τύπους διαγωνισμών [Συνοπτικές Διαδικασίες, Ανοικτό Διαγωνισμό, Δυναμικά Συστήματα Αγορών (ΔΣΑ)] για την κάλυψη των αναγκών τους για τη διενέργεια ηλεκτρολογικών εργασιών από ηλεκτρολόγους εργολήπτες σε δημόσια σχολεία. Ενόψει των πιο πάνω παρατηρήσεων μας, ζητήθηκε από το ΥΠΑΝ να μας πληροφορήσει για τα μέτρα που θα λάμβαναν για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στους πιο πάνω δημόσιους διαγωνισμούς που προκηρύσσονταν μέσω του ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων. Την πιο πάνω επιστολή μας κοινοποιήσαμε και στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ), από το οποίο ζητήσαμε τυχόν απόψεις του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και συγκεκριμένα κατά πόσο οι προϋποθέσεις ένταξης/συμμετοχής που είχαν καθοριστεί στα έγγραφα του ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων αποτελούσαν μέτρα διασφάλισης της ασφάλειας των παιδιών και της ομαλής λειτουργίας των σχολείων.

Τον Απρίλιο 2026, το Τμήμα ΗΜΥ μάς υπέβαλε τα σχόλια του επί των θεμάτων που τίθεντο, πληροφορώντας μας μεταξύ άλλων ότι κάθε ΑΑ καθορίζει, ανάλογα με την έκταση και το είδος των εργασιών, τις ελάχιστες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες που πρέπει να κατέχει ο ανάδοχος, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητά του να εκτελέσει με επιτυχία τη σύμβαση. Όσον αφορά στην απαίτηση των πιο πάνω εγγράφων όπως ο ΟΦ εργοδοτεί τουλάχιστον έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Πρώτης Τάξης, αυτή θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με το εγκατεστημένο φορτίο των σχολικών μονάδων, αφού ο συγκεκριμένος Μηχανικός καλύπτει τις απαιτήσεις εγκαταστάσεων οποιασδήποτε τάσης και απεριόριστης ισχύος. Από τα στοιχεία δε που διαθέτει το ΗΜΥ, η πλειοψηφία (ίσως και η ολότητα) των σχολικών μονάδων, δεν εμπίπτει στη συγκεκριμένη κατηγορία εγκαταστάσεων. Τέλος, το Τμήμα ΗΜΥ εξέφρασε την άποψη ότι ο διαγωνισμός θα μπορούσε να διαχωριστεί σε τμήματα, ανάλογα με την έκταση και την ισχύ της κάθε εγκατάστασης, με αντίστοιχη διαφοροποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής σε κάθε τμήμα.

Τον Ιούνιο 2026, το ΥΠΑΝ μάς ενημέρωσε ότι είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπροσώπους του ΓΛΤΔ και του Συνδέσμου Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΕΗΚ) τον Απρίλιο 2026. Μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση, το ΥΠΑΝ απέστειλε εισηγήσεις, διευκρινίσεις και προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΓΛΤΔ, για προώθηση τροποποιήσεων του ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων και, στο πλαίσιο των συζητήσεων που ακολούθησαν με το ΓΛΤΔ αποφασίστηκε όπως προχωρήσει η εφαρμογή ενός νέου ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων για έργα μέχρι 150 kVA, παράλληλα με το υφιστάμενο ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων, στη βάση της ήδη διαμορφωμένης δομής του συστήματος και των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του Έργου. Μέσω της ίδιας επιστολής, το ΥΠΑΝ μας πληροφόρησε και για τις απόψεις του σχετικά με τα σημεία τα οποία είχαν τεθεί από το Τμήμα ΗΜΥ, αιτιολογώντας τον καθορισμό των συγκεκριμένων κριτηρίων/προϋποθέσεων συμμετοχής. Στο πλαίσιο των εισηγήσεων που το ΥΠΑΝ απέστειλε προς το ΓΛΤΔ τον Απρίλιο 2026, περιλαμβανόταν η μείωση των σχετικών ορίων εμπειρίας και αξίας έργων, ώστε να διευρυνθεί η συμμετοχή ΟΦ στο ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων. Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ, η πιο πάνω προσέγγιση σύναδε και με τις θέσεις του ΗΜΥ, αναφέροντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική ακολουθούσε τα πρότυπα έγγραφα του ΓΛΤΔ. Μας πληροφόρησε επίσης ότι η κάθε ΑΑ, στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων μέσω του ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων, έχει τη δυνατότητα να προχωρεί είτε σε ομαδοποίηση σχολείων είτε σε ξεχωριστές αναθέσεις συμβάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. Ενδεικτικά, δύναται να προκηρύσσει έναν ή περισσότερους διαγωνισμούς μαζί, να διαχωρίζει σχολεία ανά κατηγορία ή γεωγραφική περιοχή ή να ακολουθεί άλλη προσέγγιση που κρίνεται καταλληλότερη, με στόχο τόσο την εξασφάλιση της βέλτιστης οικονομικής προσφοράς όσο και τη δυνατότητα ορθής και αποτελεσματικής εκτέλεσης των εργασιών από τον επιτυχόντα ΟΦ. Όσον αφορά τον πιο πάνω παραπονούμενο ΟΦ, μετά από επανεξέταση των εγγράφων του διαγωνισμού και καλύτερης κατανόησης των σχετικών προνοιών, είχε υποβάλει εκ νέου αίτηση συμμετοχής στο ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων, αξιολογήθηκε και είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο Ηλεκτρολόγων με δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής προσφοράς σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται μέσω του υπό αναφορά ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων.

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι δεν είχε διαπιστώσει αποκλεισμό της συμμετοχής σημαντικού αριθμού αδειούχων ηλεκτρολόγων εγκαταστατών από το ΔΣΑ Ηλεκτρολόγων, με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών. Τα κριτήρια συμμετοχής αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της αναγκαίας τεχνικής επάρκειας για την εκτέλεση των εργασιών σε σχολικά κτήρια και δεν περιόριζαν τη συμμετοχή στο ΔΣΑ, επισημαίνοντας ότι το ισχύον πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα των ΟΦ να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλου ή άλλων φορέων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 63 του Ν.73(Ι)/2016.

Παρά τις πιο πάνω διορθωτικές ενέργειες οι οποίες είχαν γίνει από το ΥΠΑΝ, καθυστερημένα κατά την άποψή μας εφόσον θα έπρεπε αυτές να μην είχαν καταστεί αναγκαίες μέσα από μια επαρκή έρευνα αγοράς, από τον έλεγχο των πιο πάνω διαδικασιών παρατηρήθηκε από την Υπηρεσία μας περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων ΟΦ στο ΔΣΑ ηλεκτρολόγων. Η μειωμένη συμμετοχή οδήγησε σε υποβολή πολύ μικρού αριθμού προσφορών στους σχετικούς διαγωνισμούς που είχαν προκηρυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, με αποτέλεσμα να μην έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικός ανταγωνισμός, γεγονός που, πέραν των οικονομικών επιπτώσεων, ήταν και ένας από τους κύριους λόγους καθυστέρησης στην υλοποίηση του Έργου.

Σύσταση Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Το ΥΠΑΝ, σε συνεργασία με το ΓΛΤΔ, να αξιολογήσει τους λόγους της περιορισμένης συμμετοχής ΟΦ στα ΔΣΑ και, πριν από την προκήρυξη νέων διαγωνισμών να καταρτίσει σχέδιο δράσης/ενεργειών για την ενίσχυση/αύξηση της συμμετοχής ΟΦ. Το σχέδιο δράσης να περιλαμβάνει συγκεκριμένα

μέτρα/ενέργειες, όπως επανεξέταση των όρων/κριτηρίων συμμετοχής ΟΦ στα ΔΣΑ, ενημέρωση της αγοράς και παρακολούθηση του αριθμού συμμετεχόντων ΟΦ ανά ΔΣΑ. Στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση των συμμετεχόντων και η υποβολή περισσότερων προσφορών και ανταγωνιστικών τιμών στους διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν στο επόμενο διάστημα για υλοποίηση/ολοκλήρωση του Έργου, καθώς και μελλοντικών παρόμοιων έργων.

3.4 Θέμα: Επιτόπιοι Έλεγχοι

Στο πλαίσιο του παρόντος ελέγχου, διενεργήθηκαν δειγματοληπτικά επιτόπιοι έλεγχοι από την Υπηρεσία μας σε αριθμό σχολείων. Σκοπός των ελέγχων ήταν η επιβεβαίωση της προόδου υλοποίησης του έργου καθώς και ο έλεγχος της αξιοπιστίας της αναλυτικής κατάστασης που μας υποβλήθηκε από το ΥΠΑΝ τον Σεπτέμβριο 2026, με την οποία αμφισβητούσε την ορθότητα του περιεχομένου της κατάστασης την οποία ετοίμασε η Υπηρεσία μας για τα 209 σχολεία.

Σχετικές φωτογραφίες από τους επιτόπιους ελέγχους περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(α) Στις 24.9.2026 διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος σε πέντε σχολεία στην Επαρχία Λευκωσίας, τα αποτελέσματα του οποίου καταγράφονται στον πιο κάτω πίνακα.

A/A	Σχολείο	Κατάσταση Κλιματιστικών σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥ από το ΥΠΑΝ (Σεπτέμβριο 2026)	Κατάσταση Κλιματιστικών σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥ από τη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας (Ιούνιο 2026)	Ευρήματα επιτόπιου δειγματοληπτικού έλεγχου στις 24 Σεπτεμβρίου 2026	Παρατηρήσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας
1	Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου	Σε Λειτουργία	Εκκρεμούν Ηλεκτρολογικές Εργασίες ή/και αναβάθμιση του ηλεκτρικού φορτίου	Σημαντικά Θέματα Ασφάλειας	Σημαντικά θέματα ασφάλειας στην λειτουργία των κλιματιστικών και γενικότερα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σχολείου
				Εκκρεμούν Ηλεκτρολογικές Εργασίες ή/και αναβάθμιση του ηλεκτρικού φορτίου	Μεγάλος αριθμός κλιματιστικών μη ηλεκτρολογικά συνδεδεμένος (χωρίς παροχή ηλεκτρισμού)
					Εκ περιτροπής λειτουργία όσων κλιματιστικών είναι ηλεκτρολογικά συνδεδεμένα
2	Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Α' (ΚΑ+ΚΒ)	Σε Λειτουργία	Δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα	Εκκρεμούν Ηλεκτρολογικές Εργασίες ή/και αναβάθμιση του ηλεκτρικού φορτίου και έλεγχος από την ΑΗΚ	Εκ περιτροπής λειτουργία των κλιματιστικών λόγω μη ικανοποιητικού φορτίου
3	Δημοτικό Σχολείο Λυκαβηττού (ΚΑ+ΚΒ)	Σε Λειτουργία	Εκκρεμούν Ηλεκτρολογικές Εργασίες ή/και αναβάθμιση του ηλεκτρικού φορτίου	Εκκρεμεί αναβάθμιση του ηλεκτρικού φορτίου	Εκ περιτροπής λειτουργία των κλιματιστικών λόγω μη ικανοποιητικού φορτίου
4	Δημοτικό Σχολείο Αγλατζιάς ΣΤ'	Σε Λειτουργία	Ολοκλήρωση Εργασιών	Διερευνώνται οι λόγοι πτώσης του	Εκ περιτροπής λειτουργία των κλιματιστικών λόγω μη ικανοποιητικού φορτίου

				κεντρικού διακόπτη.	Συχνή πτώση του κεντρικού διακόπτη από την υπερφόρτωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατά την κανονική λειτουργία του σχολείου
5	Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμειας	Σε Λειτουργία	Εκκρεμούν Ηλεκτρολογικές Εργασίες	Σε Λειτουργία	

Πίνακας 16: Δειγματοληπτικοί επιτόπιοι έλεγχοι πραγματικής κατάστασης υλοποίησης
Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από το ΥΠΑΝ

Από τα αποτελέσματα του πιο πάνω ελέγχου και στη βάση πληροφόρησης από τις διευθύνσεις των σχολείων διαπιστώνεται ότι οι αναφορές του ΥΠΑΝ στην αναλυτική κατάσταση που μας απέστειλε τον Σεπτέμβριο 2026 για την υλοποίηση του έργου δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η αναφορά στην πιο πάνω κατάσταση του ΥΠΑΝ ότι τα εν λόγω σχολεία θεωρούνται ολοκληρωμένα και τα κλιματιστικά τους σε λειτουργία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, εφόσον είτε δεν ήταν όλα συνδεδεμένα και σε λειτουργία, είτε είχαν εγκατασταθεί αλλά εκκρεμούσαν οι ηλεκτρολογικές εργασίες ή/και η αναβάθμιση του ηλεκτρικού φορτίου που απαιτείται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους.

Πέραν των πιο πάνω, και μετά από πληροφόρηση των σχολικών διευθύνσεων διαπιστώθηκε ότι παρόλο ότι δεν έχει ακόμα αναβαθμιστεί το ηλεκτρικό φορτίο σε κάποια σχολεία, τα κλιματιστικά τα οποία εγκαταστάθηκαν τίθενται σε λειτουργία με αποτέλεσμα να διακόπτεται η ηλεκτροδότηση του σχολείου λόγω υπερφόρτωσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Ως ενδιάμεση λύση, η οποία όμως και πάλι εγκυμονεί κινδύνους όσον αφορά σε θέματα ασφάλειας, σε ορισμένα σχολεία τίθενται σε λειτουργία τα κλιματιστικά εκ περιτροπής για αποφυγή της διακοπής της ηλεκτροδότησης τους.

Ανησυχία προκαλεί επίσης το γεγονός ότι στο Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού στον Στρόβολο διαπιστώθηκαν πρόχειρες συνδέσεις κλιματιστικών με σκοπό να τεθούν σε λειτουργία μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών εργασιών (ενδεικτικές είναι και οι φωτογραφίες για το στο **Παράρτημα III**), γεγονός το οποίο εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών και των καθηγητών, καθώς και των εργαζομένων στα σχολικά κτήρια.

(β) Στις 17.11.2025 διενεργήθηκε επιτόπιος δειγματοληπτικός έλεγχος σε δύο δημόσια σχολεία (στο Λύκειο Παλλουριώτισσας και στο Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου τα οποία είχαν περιληφθεί στη Φάση Α του Έργου) της ΣχΕφ Λευκωσίας από κλιμάκιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με την εγκατάσταση κλιματιστικών στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό αναφορά Έργου. Επίσης, προσωπικό της ΣχΕφ Λευκωσίας παρείχε ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών εγκατάστασης κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Λευκωσίας που είχαν επιλεγεί.

Κόστος Προμήθειας και Εγκατάστασης Κλιματιστικών

Οι Πίνακες 16 και 17 παρουσιάζουν τις κλιματιστικές μονάδες που εγκαταστάθηκαν στο Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου και στο Λύκειο Παλλουριώτισσας αντίστοιχα, καθώς και το κόστος για διάφορες συναφείς εργασίες.

Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο με ΦΠΑ
Κλιματιστικό 12000 BTU	9	€680	19%	€6.120	€7.282,80
Κλιματιστικό 18000 BTU	38	€910	19%	€34.580	€41.150,20
Κλιματιστικό 24000 BTU	5	€1.110	19%	€5.550	€6.604,50
Βάση Κλιματιστικού	6	€60	19%	€360	€428,40
Απεγκατάσταση Κλιματιστικού	11	€35	19%	€385	€458,15
Επιπρόσθετες Σωληνώσεις	205	€35	19%	€7.175	€8.538,25
Διάνοιξη τρύπας	6	€60	19%	€360	€428,40
Περονοφόρο / Ανυψωτικό	15	€80	19%	€1.200	€1.428,00
Σύνολο				€55.730	€66.318,70

Πίνακας 17: Κλιματιστικές μονάδες και κόστος εργασιών στο Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λευκωσίας.

Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο με ΦΠΑ
Κλιματιστικό 12000 BTU	1	€680	19%	€680	€809,20
Κλιματιστικό 18000 BTU	5	€910	19%	€4.550	€5.414,50
Κλιματιστικό 24000 BTU	37	€1.110	19%	€41.070	€48.873,30
Βάση Κλιματιστικού	23	€60	19%	€1.380	€1.642,20
Απεγκατάσταση Κλιματιστικού	7	€35	19%	€245	€291,55
Επιπρόσθετες Σωληνώσεις	165	€35	19%	€5.775	€6.872,25
Διάνοιξη τρύπας	0	€60	19%	€0	€0
Περονοφόρο / Ανυψωτικό	3	€80	19%	€240	€285,60
Σύνολο				€53.940	€64.188,60

Πίνακας 18: Κλιματιστικές μονάδες και κόστος εργασιών στο Λύκειο Παλλουριώτισσας.

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΣχΕφ Λευκωσίας.

Παροχή επιπρόσθετου φορτίου

Για τις ανάγκες των νέων κλιματιστικών απαιτήθηκε παροχή επιπρόσθετου φορτίου και στις δύο σχολικές μονάδες από την ΑΗΚ. Για το Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου, παροχή επιπρόσθετου φορτίου 52 kVA υλοποιήθηκε με τελικό κόστος €7.995 + ΦΠΑ, ενώ για το Λύκειο Παλλουριώτισσας, παροχή επιπρόσθετου φορτίου 60 kVA υλοποιήθηκε με τελικό κόστος €9.026 + ΦΠΑ.

(γ) Στις 28.01.2026 διενεργήθηκε επιτόπιος δειγματοληπτικός έλεγχος σε δύο δημόσια σχολεία (στο Λύκειο Αγίου Νικολάου-Φάση Α και στο Λανίτειο Λύκειο-Φάση Β) της ΣχΕφ Λεμεσού από κλιμάκιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με την εγκατάσταση κλιματιστικών στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό αναφορά Έργου.

Επίσης, προσωπικό της ΣχΕφ Λεμεσού παρείχε ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών εγκατάστασης κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία της ΣχΕφ Λεμεσού που είχαν επιλεγεί.

Στο Λανίτειο Λύκειο εγκαταστάθηκαν κλιματιστικές μονάδες ισχύος 24.000 BTU. Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης ανά μονάδα ανήλθε σε €1.120 + ΦΠΑ, των πρόσθετων σωληνώσεων σε €190 + ΦΠΑ και το κόστος πενταετούς συντήρησης σε €420 + ΦΠΑ, με συνολικό κόστος ανά μονάδα €1.730 + ΦΠΑ.

Από τον πιο πάνω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση των κλιματιστικών στα συγκεκριμένα σχολεία είχε γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες των αντίστοιχων σχετικών συμβάσεων.

Σύσταση Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Το ΥΠΑΝ, να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο όλων των σχολείων στα οποία εγκαταστάθηκαν ή βρίσκεται σε εξέλιξη εγκατάσταση κλιματιστικών, με σκοπό:

- (i) Να διαπιστωθούν οι όποιες αποκλίσεις σε θέματα ασφάλειας και να ληφθούν άμεσα μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν την ασφάλεια των μαθητών, καθηγητών, προσωπικού και εγκαταστάσεων των σχολείων.
- (ii) Να επικαιροποιήσει και να δημοσιοποιήσει την αναλυτική κατάσταση προόδου του έργου, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα της όλης κατάστασης.

Σχόλια Ελεγχόμενου Φορέα

Το προσχέδιο της παρούσας Ειδικής Έκθεσης διαβιβάστηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ελεγχόμενο φορέα, με την παράκληση όπως έχουμε τα δικά του σχόλια και απόψεις ώστε να συμπεριληφθούν στην τελική μορφή της Ειδικής Έκθεσης. Οι αυτούσιες απαντητικές επιστολές του ελεγχόμενου φορέα παρουσιάζονται στο **Παράρτημα IV**. Σημειώνεται ότι, όπου στην απάντηση του ελεγχόμενου φορέα γίνεται αναφορά σε θέματα που υπήρχαν στο προσχέδιο της Ειδικής Έκθεσης αλλά τελικά δεν έχουν συμπεριληφθεί στην τελική της μορφή, κατά την κρίση της Υπηρεσίας μας αυτά έχουν απαντηθεί επαρκώς ή/και έχουν επιλυθεί μέσα από την απάντηση του ελεγχόμενου φορέα. Σημειώνεται επίσης ότι, στη δεύτερη απαντητική επιστολή του ΥΠΑΝ ημερ. 23.9.2026 δεν έχουμε συμπεριλάβει την αναλυτική κατάσταση με τα σχολεία και το στάδιο στο οποία βρίσκεται η εγκατάσταση των κλιματιστικών, όπως μας έχει ζητηθεί από το ίδιο το ΥΠΑΝ με την επιστολή του, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Τέλος, σημειώνεται ότι τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου, ο οποίος διεξήχθη μετά την ολοκλήρωση του κανονικού ελέγχου και την ετοιμασία προσχεδίου της Έκθεσης, στάλθηκαν στο ΥΠΑΝ για σχόλια την προηγούμενη της δημοσίευσης της Έκθεσης και η απάντηση του ΥΠΑΝ για το συγκεκριμένο θέμα επισυνάπτεται αυτούσια επίσης στο **Παράρτημα IV**.

Ωστόσο, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι το ΥΠΑΝ οφείλει να δημοσιοποιήσει άμεσα αναλυτική κατάσταση όλων ανεξαιρέτως των δημόσιων σχολείων, αναφέροντας για το καθένα αν και πότε προγραμματίζεται η εγκατάσταση κλιματιστικών και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση, και η κατάσταση αυτή να επικαιροποιείται συστηματικά. Η πιο πάνω δημοσιοποίηση καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική, λαμβάνοντας υπόψη και τα σοβαρά θέματα ασφάλειας που διαπιστώθηκαν σε ένα εκ των πέντε σχολείων στα οποία έγιναν επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από την Υπηρεσία μας, για τους οποίους γίνεται αναφορά πιο πάνω, στα οποία σύμφωνα με την κατάσταση που μας στάλθηκε από το ΥΠΑΝ τα κλιματιστικά βρίσκονται σε λειτουργήσιμη κατάσταση.

4. Παραρτήματα

Παράρτημα Ι: Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού, ή τα αποτελέσματα ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο λογαριασμών οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ' αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002). Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων έχουν τεθεί ενώπιόν της.

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων.

Ουδμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνεται κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. Τονίζεται, επίσης, ότι οι συστάσεις και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς και

οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν προβεί κατ' ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας Έκθεσης.

Αρμοδιότητες Γενικού Ελεγκτή

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014).

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ασκεί κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του αναθέτονται διά Νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης, Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικού οργανισμού και κρατικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε Κονδυλίου οφείλει να διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου Προϋπολογισμού, στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή, να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.

Παράρτημα II: Μεθοδολογία


Πρότυπα ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει.

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAI) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Τα Πρότυπα ISSAI διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους, τους ελέγχους συμμόρφωσης και τους διαχειριστικούς ελέγχους. Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων:



Το θεμελιώδες Πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (Διακήρυξη της Λίμα). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η "Magna Carta" στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα αναγνωρίστηκαν από τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 19.12.2014). Το Πρότυπο INTOSAI-P1, όπως και το Πρότυπο INTOSAI-P10 (Διακήρυξη του Μεξικού), αποτελούν μέρος του κοινοτικού κεκτημένου.

Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους τους ελέγχους του δημόσιου τομέα.

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων.

Ελεγκτική προσέγγιση

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το ΥΠΑΝ, τις ΣΧΕΦ και το ΓΛΤΔ, καθώς και σε στοιχεία που αντλήθηκαν από το eProcurement και από σχετική αλληλογραφία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του Έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού στα Σχολικά Κτήρια», καθώς και στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την ανάθεση συμβάσεων προμήθειας και εγκατάστασης κλιματιστικών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και ηλεκτρολογικών εργασιών.

Στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάστηκαν, σε δειγματοληπτική βάση, έγγραφα διαγωνισμών, πρακτικά αξιολόγησης, στοιχεία προόδου των φάσεων υλοποίησης, στοιχεία συμμετοχής οικονομικών φορέων στα Δυναμικά Συστήματα Αγορών, καθώς και στοιχεία που αφορούσαν την κατάσταση των σχολικών μονάδων και τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από την ΑΗΚ.

Περαιτέρω, διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε επιλεγμένες ΣΧΕΦ και σχολικές μονάδες, με σκοπό την επιβεβαίωση, σε δειγματοληπτική βάση, της προόδου υλοποίησης του Έργου, της εγκατάστασης του εξοπλισμού και της εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, τις αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της διασφάλισης υγιούς ανταγωνισμού.

Ο έλεγχος καλύπτει την περίοδο Νοέμβριο 2023 – Ιούλιο 2026

Διευκρινίζουμε ότι, για σκοπούς δημοσίευσης της παρούσας Ειδικής Έκθεσης, έχουν απαλειφθεί όλες οι αναφορές που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα. Κατ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται ουσιαστικά η κοινοποίηση των ευρημάτων και διαπιστώσεων της Υπηρεσίας μας που επιβάλλουν τα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα.

Κριτήρια ελέγχου

Για σκοπούς του παρόντος ελέγχου συμμόρφωσης, ως κριτήρια ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις του Θεσμικού Πλαισίου ως ακολούθως:


- Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος (Ν.73(I)/2016).
- Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Γενικοί Κανονισμοί (ΚΔΠ 201/2007)


- γ. Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί (ΚΔΠ 138/2016).
- δ. Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών

(Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμούς (ΚΔΠ 249/2009).

- ε. Οδηγό Εγκατάστασης Συστημάτων Κλιματισμού σε Σχολικά Κτήρια του ΥΠΑΝ.
- στ. Οι περί Σχολικών Εφορειών Νόμοι του 1997 (Ν.108(Ι)/1997).


Παράρτημα III: Φωτογραφικό υλικό από τον επιτόπιο έλεγχο της Υπηρεσίας μας

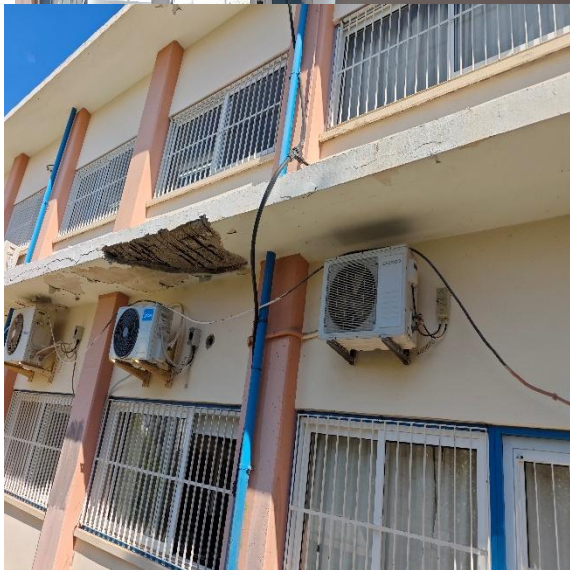

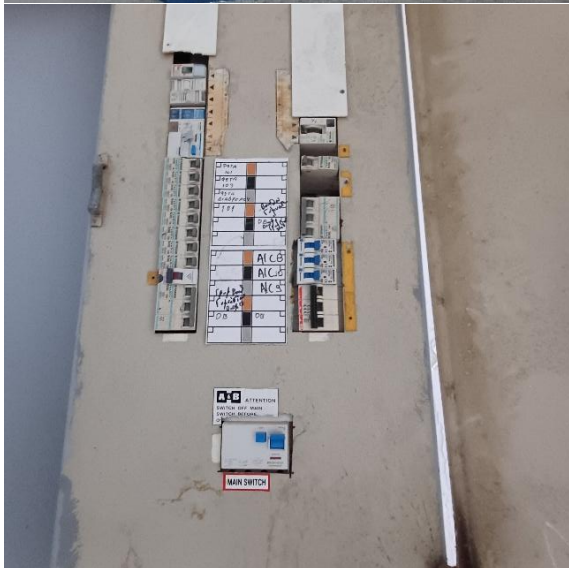





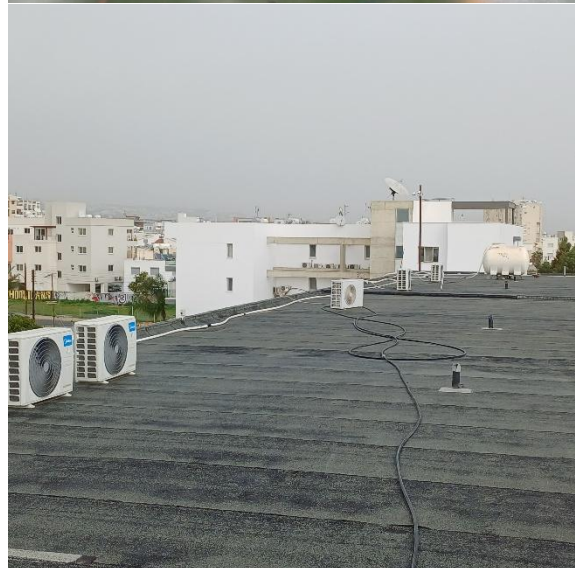

Παράρτημα IV: Αυτούσιες απαντητικές επιστολές από ΥΠΑΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Γραφείο Γενικού Διευθυντή

Αρ. Φακ. [REDACTED]

17 Σεπτεμβρίου 2026

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ

Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας

**Προσχέδιο Ειδικής Έκθεσης με θέμα «Έλεγχος προόδου του έργου για την εγκατάσταση κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία»**

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματος της Υπηρεσίας σας, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2026, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το προσχέδιο της υπό αναφορά Ειδικής Έκθεσης, σημειώνουμε ότι η Ειδική Έκθεση, παρόλο που αφορά σε στοιχεία της πρώτης κυρίως χρονιάς (2023-2024), αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο βελτίωσης των διαδικασιών για το εν λόγω έργο, τόσο για τις Σχολικές Εφορείες, όσο και για το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ). Πιο κάτω παρατίθενται οι θέσεις του ΥΠΑΝ για τα επιμέρους θέματα:

1. Πλάνο Εγκατάστασης Κλιματιστικών στις Σχολικές Μονάδες

(α) Κατ' αρχάς, σημειώνεται ότι το ΥΠΑΝ είχε ξεκάθαρο στόχο, ο οποίος αφορούσε στην εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία παγκύπρια. Αυτός, εξάλλου, εξαγγέλθηκε από τον ίδιο τον ΠτΔ, τον Σεπτέμβριο του 2023. Αρχικά, το 2023, το πλάνο αναφερόταν σε τρεις φάσεις εγκατάστασης, ενώ στη συνέχεια το πλάνο, από το 2024 και εξής, αφορούσε σε όλα τα σχολεία παγκύπρια, χωρίς διακριτές φάσεις.

Συνεπώς, διαπιστώνουμε ότι τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η υπό αναφορά έκθεση δεν είναι επικαιροποιημένα, αφού αυτά αναφέρονται στις φάσεις υλοποίησης του έργου που ίσχυσαν μόνο κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του αρχικού πλάνου. Δυστυχώς, διαπιστώθηκε περαιτέρω ότι στα στοιχεία που αποστέλλονταν κατά καιρούς στην Ελεγκτική Υπηρεσία, είτε από το ΥΠΑΝ, είτε από τις Σχολικές Εφορείες, δεν γινόταν ξεκάθαρο ότι το πλάνο από το 2024 και μετά διαφοροποιήθηκε και αφορούσε σε όλα τα σχολεία παγκύπρια, χωρίς διακριτές φάσεις. Σημειώνουμε, συναφώς, ότι και τα ίδια τα ερωτήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρέπεμπαν στο αρχικό πλάνο του ΥΠΑΝ. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι ενδείκνυται η έκθεση να τύχει αναδιαμόρφωσης στη βάση των πραγματικών δεδομένων, όπως αυτά λαμβάνονται τόσο μέσω των Σχολικών Εφορειών, όσο και μέσω των ίδιων των σχολικών μονάδων (παρατίθενται πιο κάτω).

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην επιστολή του ΥΠΙΑΝ προς τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, (ημερ. 29/11/2023, αρ. φακ.: 05.28.014.001), ο σχεδιασμός του ΥΠΙΑΝ αφορά στην εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλες τις δημόσιες σχολικές μονάδες, εξαιρουμένων των σχολικών μονάδων που διαθέτουν ήδη κλιματιστικά ή στις οποίες, λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής (βλ. ορεινές περιοχές), δεν κρίνεται αναγκαία η εγκατάστασή τους. Στην ίδια επιστολή γινόταν λόγος για ολοκλήρωση του έργου σε τρεις φάσεις, μέχρι το τέλος του 2026, στις οποίες θα εντάσσονταν όλα τα δημόσια σχολεία, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Ωστόσο, όταν άρχισε η υλοποίηση της πρώτης φάσης από τις τότε Σχολικές Εφορείες, διαπιστώθηκε ότι ο ταυτόχρονος έλεγχος και αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολείων ήταν χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία, για διάφορους τεχνικούς λόγους. Συνεπώς, για την αποφυγή των καθυστερήσεων που πιθανόν να προέκυπταν από τεχνικούς λόγους, και με γνώμονα τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, καθώς και του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των σχολείων, το αρχικό πλάνο αναθεωρήθηκε, ώστε να μην περιλαμβάνει διακριτές φάσεις, χωρίς όμως να διαφοροποιείται ο βασικός στόχος του ΥΠΙΑΝ, για εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Η ανάγκη για ταυτόχρονη αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολικών κτηρίων είχε επισημανθεί και σε επιστολές του ΥΠΙΑΝ προς τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2025 και 6 Φεβρουαρίου 2026 (αρ. φακ. 05.28.014.001). Παράλληλα, στην ανάγκη αναθεώρησης του αρχικού πλάνου συνέβαλε η τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Σχολικών Εφορειών, καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών τους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2024. Στο πλαίσιο αυτό, άλλαξαν, μεταξύ άλλων, οι Πρόεδροι των τεσσάρων από τις πέντε Μητροπολιτικές Σχολικές Εφορείες, καθώς και τα μέλη τους, γεγονός που δημιούργησε πρόσθετη ανάγκη για περαιτέρω συντονισμό των διαδικασιών υλοποίησης του έργου.

(β) Το αρχικό πλάνο αφορούσε στην αποκεντρωμένη διαδικασία προσφορών από τις ίδιες τις Σχολικές Εφορείες. Στη συνέχεια, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ετοίμασε και εισήγαγε, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΙΑΝ, το Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ), το οποίο χρησιμοποιείται έκτοτε από τις Σχολικές Εφορείες, πάντοτε με την καθοδήγηση του Γενικού Λογιστηρίου. Σημαντική πρόκληση αποτέλεσε η έλλειψη ενδιαφέροντος από αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες για συμμετοχή στο ΔΣΑ που έχει δημιουργήσει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του Προέδρου των Σχολικών Εφορειών και εκπροσώπων του Γενικού Λογιστηρίου με εκπροσώπους του Συνδέσμου Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου. Κατά τις συναντήσεις αυτές, επεξηγήθηκε η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΔΣΑ, καθώς και τα χαρακτηριστικά των έργων και των απαιτούμενων υπηρεσιών. Παρά τις ενέργειες αυτές, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από ικανοποιητικό αριθμό ηλεκτρολόγων εγκαταστατών για συμμετοχή στο ΔΣΑ.

Παρά τις πιο πάνω προκλήσεις, το πλάνο του ΥΠΙΑΝ εξελίσσεται σταδιακά, με κάθε περίπτωση να αξιολογείται σε τεχνικό επίπεδο και να προωθείται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τόσο την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών, όσο και την πλήρη τήρηση των προβλεπόμενων προτύπων ασφάλειας από τις Σχολικές Εφορείες. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνεται από τις Σχολικές Εφορείες και τη βάση δεδομένων που έχει αναπτύξει το ΥΠΙΑΝ, σε επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες, παρατίθενται πιο κάτω τα εξής στοιχεία, τα οποία ίσχυαν στις 2 Σεπτεμβρίου 2026:

Πίνακας 1: Εγκατάσταση κλιματιστικών στα Λύκεια

ΕΠΑΡΧΙΑ	Πλήρης Λειτουργία	Τελικό Στάδιο Λειτουργίας*	Προγραμματίζεται
ΛΕΥΚΩΣΙΑ	21%	79%	
ΛΕΜΕΣΟΣ	90%	10%	
ΛΑΡΝΑΚΑ	100%		
ΠΑΦΟΣ	33%	33%	33%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ	33%	67%	

* Ολοκληρώθηκε μέρος του έργου ή θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Πίνακας 2: Εγκατάσταση κλιματιστικών στα Γυμνάσια

ΕΠΑΡΧΙΑ	Πλήρης Λειτουργία	Τελικό Στάδιο Λειτουργίας*	Προγραμματίζεται
ΛΕΥΚΩΣΙΑ	18%	64%	18%
ΛΕΜΕΣΟΣ	39%	61%	
ΛΑΡΝΑΚΑ	45%	55%	
ΠΑΦΟΣ	37.5%	62.5%	
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ	50%	50%	

* Ολοκληρώθηκε μέρος του έργου ή θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Πίνακας 3: Εγκατάσταση κλιματιστικών στα Δημοτικά

ΕΠΑΡΧΙΑ	Πλήρης Λειτουργία	Τελικό Στάδιο Λειτουργίας*	Προγραμματίζεται
ΛΕΥΚΩΣΙΑ	24%	46%	30%
ΛΕΜΕΣΟΣ	46%	29%	25%
ΛΑΡΝΑΚΑ	39%	10%	51%
ΠΑΦΟΣ	16%	22%	62%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ	65%	35%	

* Ολοκληρώθηκε μέρος του έργου ή θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Όσον αφορά στα νηπιαγωγεία, τα κλιματιστικά λειτουργούν στην πλειοψηφία τους, σε ποσοστό άνω του 80%. Σημειώνεται ότι τα κλιματιστικά έχουν εγκατασταθεί με τη συνδρομή των Συνδέσμων Γονέων, στη βάση των προδιαγραφών των Τεχνικών Υπηρεσιών. Στα υπόλοιπα, προγραμματίζεται η συμπλήρωση / εγκατάσταση / λειτουργία ενός μικρού αριθμού κλιματιστικών.

Στον σχεδιασμό του ΥΠΑΝ δεν περιλαμβάνονται συνολικά 37 σχολικές μονάδες, οι οποίες είτε βρίσκονται σε ορεινές ή κατεχόμενες περιοχές, είτε πρόκειται να τερματίσουν/τερματίσαν τη λειτουργία τους ή να μεταστεγαστούν σε άλλο κτήριο.

Οι πιο πάνω προκλήσεις και δυσκολίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου, σε συνδυασμό με τη διαρκή αλλαγή των διαθέσιμων στοιχείων, τα οποία μεταβάλλονται διαρκώς ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών, καθιστούν αναγκαία τη συνεχή επικαιροποίηση και επαλήθευσή τους. Η διαδικασία αυτή διενεργείται από το ΥΠΑΝ σε τακτή βάση.

2. Συντονισμός και Υλοποίηση του Έργου

Ο γενικός συντονισμός του έργου ασκείται, από την αρχή, από τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή του ΥΠΑΝ, υπό την εποπτεία της Υπουργού. Ειδικά για τις τεχνικές προκλήσεις που προέκυψαν κατά την πορεία υλοποίησης του έργου, το ΥΠΑΝ όρισε αρμόδιο συντονιστή τον [REDACTED]. Στη συνέχεια, αρμόδιος συντονιστής ορίστηκε ο [REDACTED].

Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, υπάρχει τακτική επικοινωνία και πραγματοποιούνται συναντήσεις με τους Προέδρους των πέντε Μητροπολιτικών Σχολικών Εφορειών ανά δίμηνο, με σκοπό τον συντονισμό, την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν. Επίσης, όπου προκύπτουν διαδικαστικά ή τεχνικά ζητήματα, αυτά εξετάζονται και επιλύονται μέσα από τη θεσμική συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών, του Γενικού Λογιστηρίου και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

3. Προϋπολογισμός Έργου – Οικονομικά Θέματα

Για όλα τα οικονομικά θέματα και τον προϋπολογισμό του έργου ακολουθήθηκαν οι συστάσεις του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Τα ποσά προϋπολογισμού του ΥΠΑΝ για το συγκεκριμένο θέμα προβλέφθηκαν στο Κεφ. 20.01 Διοίκηση άρθρο 04.323 Έκτακτες χορηγίες. Η κατανομή του ποσού ανά έτος και η πληρωμή προς τις Σχολικές Εφορείες γίνεται ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης. Το Λογιστήριο του ΥΠΑΝ διαθέτει όλα τα σχετικά στοιχεία.

4. Οδηγός Εγκατάστασης Συστημάτων Κλιματισμού σε Σχολικά Κτήρια - Τεχνικές Προδιαγραφές

Όσον αφορά στα σχόλια αναφορικά με τον «Οδηγό Εγκατάστασης Συστημάτων Κλιματισμού σε Σχολικά Κτήρια» και το Δυναμικό Σύστημα Αγορών, αυτά έχουν απαντηθεί στις επιστολές του ΥΠΑΝ προς τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 10/06/2026 και 23/06/2026 (αρ. φακ. 05.28.014.001). Σημειώνεται ότι στις προδιαγραφές περιλαμβάνονται και τα θέματα συντήρησης.

5. Άλλες Πληροφορίες

Το ΥΠΑΝ θεωρεί ότι η πληροφόρηση/στατιστική ανάλυση που παρουσιάζεται στη σελ. 2 (σημ. 1.5) και στη σελ. 3 (Γράφημα ανά Σχολική Εφορεία) δεν αποτυπώνει τη συνολική προσπάθεια της κάθε Σχολικής Εφορείας, όπως εξάλλου επισημαίνεται στο προσχέδιο της Ειδικής Έκθεσης.

Τέλος, το ΥΠΑΝ εισηγείται τη διαφοροποίηση της διατύπωσης συγκεκριμένων αναφορών, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα για τη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται για την επιτυχή υλοποίηση του εν λόγω σύνθετου και απαιτητικού έργου (π.χ. σελ. 7, σημείο

1.18. «Τα στρατηγικά λάθη του ΥΠΙΑΝ στην υλοποίηση του έργου». Σελ. 1, σημείο 1.2. «δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο ποιο είναι το πραγματικό πλάνο του ΥΠΙΑΝ. Θα τοποθετηθούν, σε κάποια άλλη φάση κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία; Θα τοποθετηθούν κλιματιστικά μόνο στα σχολεία που απαιτείται; Αν θα τοποθετηθούν μόνο εκεί που απαιτείται, θα τοποθετηθούν μόνο στα 209 σχολεία;»). Εξάλλου, πιο πάνω απαντώνται όλα τα σημεία που αναφέρονται ως «λάθη», αφού επεξηγούμε το θέμα του συντονισμού, του πλάνου του ΥΠΙΑΝ, καθώς και θέματα που αφορούν στις διαδικασίες του ΔΣΑ.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω στοιχεία κατά τη διαμόρφωση της τελικής έκθεσης.



Μάριος Παναγίδης
Γενικός Διευθυντής



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Γραφείο Γενικού Διευθυντή



Αρ. Φακ.: [REDACTED]

23 Σεπτεμβρίου 2026

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας

Προσχέδιο Ειδικής Έκθεσης με θέμα «Έλεγχος προόδου του έργου για την εγκατάσταση κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της απαντητικής επιστολής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2026, σας αποστέλλεται συμπληρωματικά αρχείο excel, στο οποίο παρουσιάζεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η διαδικασία εγκατάστασης κλιματιστικών σε κάθε σχολική μονάδα.


2. Όπως σημειώνεται και στην υπό αναφορά επιστολή μας, το ΥΠΑΝ παρακολουθεί, καταγράφει και επικαιροποιεί σε τακτή βάση την πορεία υλοποίησης του έργου σε κάθε σχολική μονάδα, αξιοποιώντας τόσο την ενημέρωση που λαμβάνει από τις πέντε Μητροπολιτικές Σχολικές Εφορείες όσο και την πληροφόρηση που προκύπτει από την επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες. Επισημαίνεται ότι τα δεδομένα που αφορούν την πορεία εγκατάστασης κλιματιστικών στις σχολικές μονάδες μεταβάλλονται σε συνεχή βάση, ανάλογα με την πρόοδο και την εξέλιξη των εργασιών, την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων υλοποίησης, καθώς και τις τεχνικές ή άλλες προκλήσεις/δυσκολίες που ενδέχεται να προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου. Ως εκ τούτου, το εν λόγω αρχείο αποτελεί εργαλείο εσωτερικής παρακολούθησης και αποτυπώνει την κατάσταση του έργου σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

3. Υπό το φως των πιο πάνω και λόγω της δυναμικής φύσης και συνεχούς εξέλιξης του έργου, το ΥΠΑΝ επιθυμεί όπως το εν λόγω αρχείο μη συμπεριληφθεί ως παράρτημα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην Ειδική Έκθεση που πρόκειται να δημοσιευθεί.


[REDACTED]
Μάριος Παναγίδης
Γενικός Διευθυντής




ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

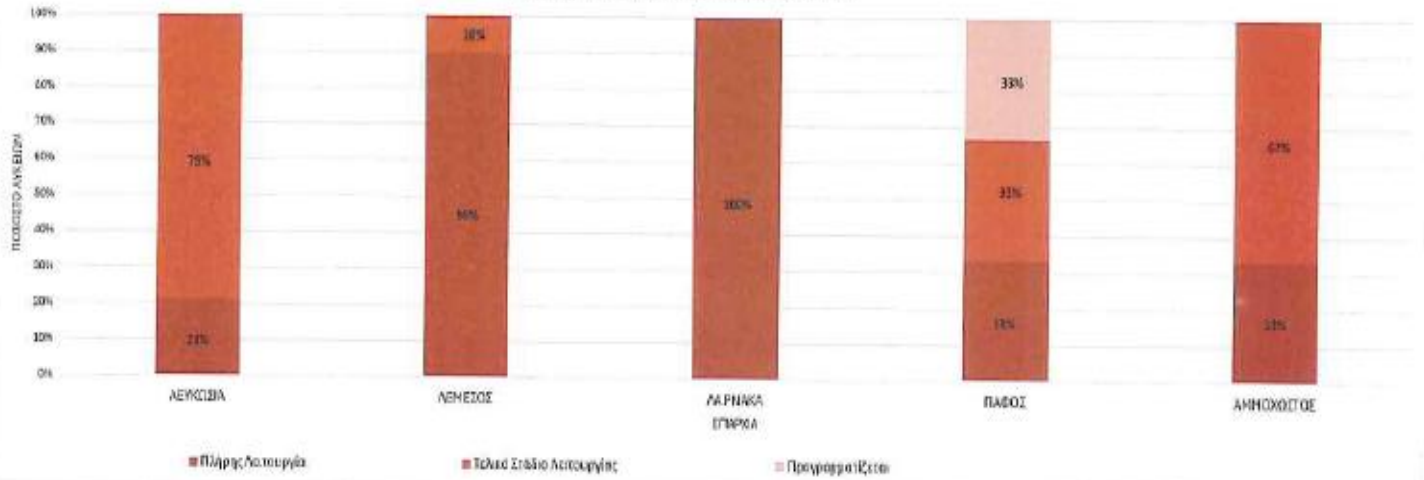

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

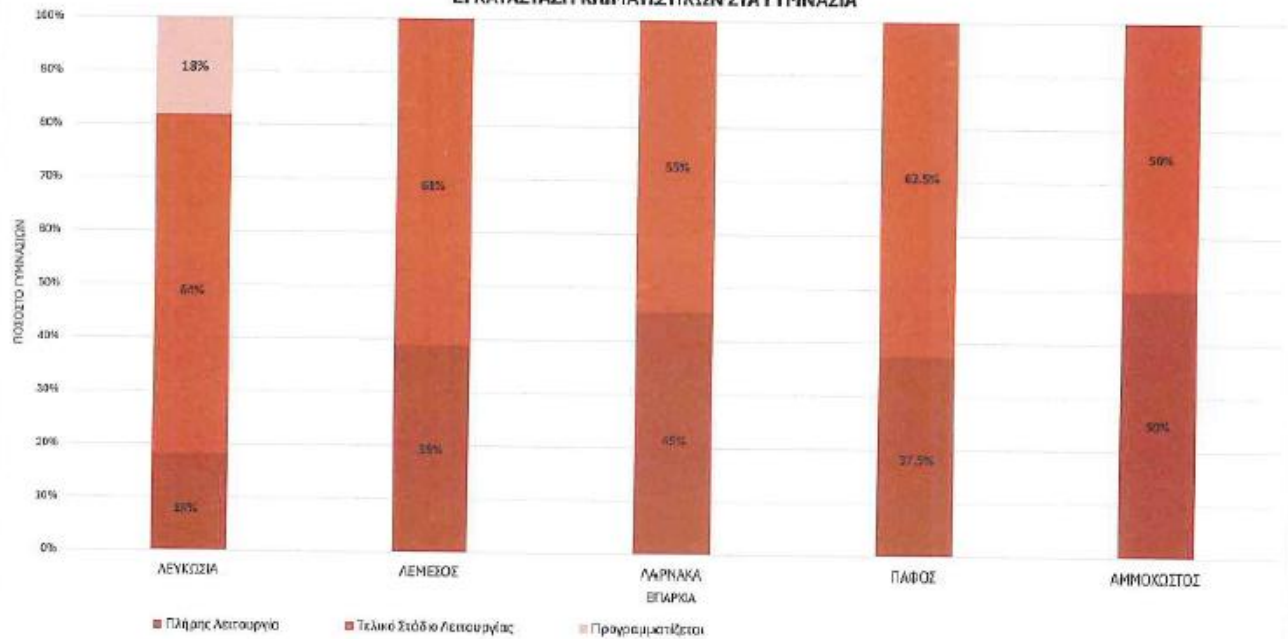

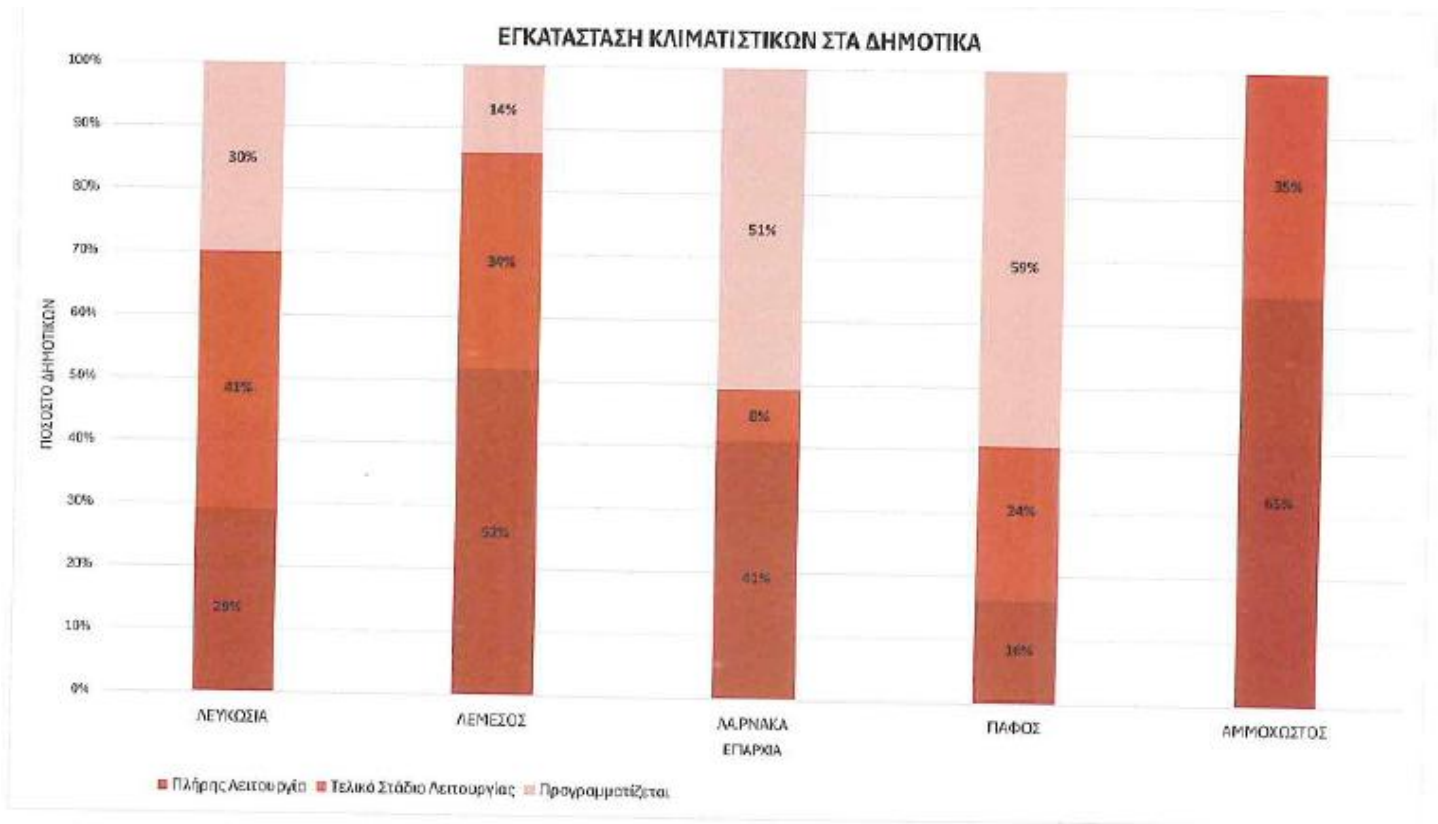

Re: Fw: Προσχέδιο Ειδικής Έκθεσης για τα κλιματιστικά στα σχολεία



To [Redacted]
Cc Cyprus Audit Office; MOEC Permanent Secretary



12:53 μμ

You forwarded this message on 28/9/2026 12:56 μμ.
If there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.

CAUTION: THIS EMAIL ORIGINATED FROM OUTSIDE OF THE ORGANIZATION. DO NOT CLICK LINKS OR OPEN ATTACHMENTS UNLESS YOU RECOGNIZE THE SENDER AND KNOW THE CONTENT IS SAFE.

Αγαπητέ [Redacted]

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και σε απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματος από την Υπηρεσία σας, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2026, υπενθυμίζεται ότι, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση των εργασιών για την εγκατάσταση των κλιματιστικών στις σχολικές μονάδες γίνονται με πρωταρχικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών, καθώς και του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των σχολείων.

Σχετικά με το αρχείο που σας είχε αποσταλεί με την επιστολή του ΥΠΑΝ, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2026, στο οποίο περιλαμβάνονταν πληροφορίες για το στάδιο που βρίσκεται η διαδικασία εγκατάστασης κλιματιστικών σε κάθε σχολική μονάδα, επαναλαμβάνεται ότι αυτό αποτελεί εργαλείο εσωτερικής παρακολούθησης και αποτυπώνει την κατάσταση του έργου σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, βάσει της πληροφόρησης που λαμβάνεται τόσο από τις Σχολικές Εφορείες όσο και μέσα από επικοινωνία με τις Σχολικές Μονάδες. Λόγω της δυναμικής φύσης και της συνεχούς εξέλιξης του έργου, τα καταγεγραμμένα στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο και επικαιροποιούνται όταν προκύπτει νεότερη πληροφόρηση. Για τον σκοπό αυτό έχει αποσταλεί εκ νέου, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026, ηλεκτρονική φόρμα προς τις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με την οποία γίνεται επικαιροποίηση του σταδίου εγκατάστασης για κάθε σχολική μονάδα. Διευκρινίζεται, παράλληλα, ότι οι οδηγίες του ΥΠΑΝ για τη λειτουργία κλιματιστικών, παραμένουν στη βάση των όσων αναφέρονται στον Οδηγό Εγκατάστασης Συστημάτων Κλιματισμού σε Σχολικά Κτήρια.

2. Όσον αφορά στα σχολεία στα οποία έχει γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, σημειώνεται ότι στο Δημοτικό Σχολείο Λυκαβηπού, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας, έχει διενεργηθεί επιτυχής έλεγχος από την ΑΗΚ. Ωστόσο, η επιπρόσθετη αύξηση φορτίου που ζητήθηκε εκ των υστέρων παραμένει σε εκκρεμότητα. Αντίστοιχα, στο Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Στ' έχει διενεργηθεί επιτυχής έλεγχος από την ΑΗΚ και διερευνάται η αιτία της πτώσης του κεντρικού διακόπτη. Στο Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Α', τα κλιματιστικά έχουν τοποθετηθεί από τον Σύνδεσμο Γονέων και αφορούν υφιστάμενη εγκατάσταση και έτσι δεν ζητήθηκε ακόμη έλεγχος από την ΑΗΚ. Τέλος, όσον αφορά το Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες.

3. Υπό το φως των πιο πάνω, το ΥΠΑΝ εισηγείται όπως στην Ειδική Έκθεση γίνει αναφορά στους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί, χωρίς να κατονομάζονται οι σχολικές μονάδες, δεδομένου ότι τα επιμέρους στοιχεία αποτυπώνουν την κατάσταση σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ενδέχεται να μεταβληθούν βάσει νεότερης πληροφόρησης. Αντιλαμβάνεστε ότι, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η διαδικασία εγκατάστασης είναι δυναμική και μπορεί να προκύψουν προβλήματα αναφορικά με το ηλεκτρικό φορτίο και μετά τον έλεγχο της ΑΗΚ.

Παράρτημα V: Πίνακες υλοποίησης φάσεων εγκατάστασης κλιματιστικών

Σχολική Εφορία Αμμοχώστου-Παραλιμνίου

A/A	ΕΠΑΡΧΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ – ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ	Α Φάση	20	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
2	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ – ΑΧΕΡΙΤΟΥ	Α Φάση	15	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
3	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ Α	Β Φάση	15	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
4	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ Β	Α Φάση	15	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
5	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ Β	Β Φάση	3	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
6	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΟΥΣ ΑΧΝΑΣ – «ΦΩΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ»	Α Φάση	13	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
7	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ Α	Β Φάση	14	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
8	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ Β	Α Φάση	15	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
9	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ Γ	Β Φάση	17	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
10	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ Α	Β Φάση	15	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
11	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ Β	Α Φάση	17	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
12	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ Β	Β Φάση	3	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
13	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Α	Α Φάση	20	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
14	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Α	Β Φάση	4	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
15	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Β	Α Φάση	11	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
16	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Γ	Α Φάση	20	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
17	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Δ	Β Φάση	24	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
18	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ Α	Β Φάση	14	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
19	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ Γ	Β Φάση	3	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
20	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ Γ' (ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)	Α Φάση	15	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
21	Αμμόχωστος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ	Β Φάση	20	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
22	Αμμόχωστος	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (Μέρος Α')	Α Φάση	20	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
23	Αμμόχωστος	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (Μέρος Β')	Β Φάση	31	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
24	Αμμόχωστος	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ	Β Φάση	43	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
25	Αμμόχωστος	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ	Β Φάση	48	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
26	Αμμόχωστος	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (Μέρος Α')	Α Φάση	20	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
27	Αμμόχωστος	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (Μέρος Β')	Β Φάση	43	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
28	Αμμόχωστος	Εξατάξιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΣΩΤΗΡΑΣ	Β Φάση	36	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες

Σχολική Εφορία Λάρνακας

Α/Α	ΕΠΑΡΧΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	Λάρνακα	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ	Β Φάση	12	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
2	Λάρνακα	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Α' - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ (Θερινό)	Β Φάση	21	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
3	Λάρνακα	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΟΥ ΚΑ + ΚΒ (Θερινό)	Α Φάση	16	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
4	Λάρνακα	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ	Β Φάση	12	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
5	Λάρνακα	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α	Α Φάση	18	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
6	Λάρνακα	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Δ – ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ	Α Φάση	22	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
7	Λάρνακα	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΟΚΛΙΝΗΣ (Θερινό)	Β Φάση	31	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
8	Λάρνακα	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΚΑ + ΚΒ)	Α Φάση	22	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
9	Λάρνακα	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΝΩΝ	Β Φάση	20	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
10	Λάρνακα	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΠΕΡΤΗ (Θερινό)	Β Φάση	17	MIDEA	Εκκρεμεί Έλεγχος από ΑΗΚ
11	Λάρνακα	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ	Β Φάση	13	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
12	Λάρνακα	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΟΥ	Α Φάση	14	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
13	Λάρνακα	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ Α'	Α Φάση	17	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
14	Λάρνακα	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ "ΒΕΡΓΙΝΑ" ΛΑΡΝΑΚΑΣ	Α Φάση	38	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
15	Λάρνακα	Γυμνάσιο	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ	Α Φάση	30	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
16	Λάρνακα	Γυμνάσιο	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ	Α Φάση	29	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
17	Λάρνακα	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ "ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ"	Β Φάση	57	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
18	Λάρνακα	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ	Β Φάση	59	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
19	Λάρνακα	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ'	Β Φάση	68	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
20	Λάρνακα	Λύκειο	ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ	Α Φάση	42	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
21	Λάρνακα	Λύκειο	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ	Β Φάση	88	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
22	Λάρνακα	Εξατάξιο	ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ	Β Φάση	66	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών

Σχολική Εφορία Λεμεσού

A/A	ΕΠΑΡΧΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	Λεμεσός	Νηπιαγωγείο	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ	Α Φάση	3	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
2	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α'	Α Φάση	10	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
3	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β'	Α Φάση	12	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
4	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ	Α Φάση	18	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
5	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Α' - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ	Γ Φάση	3	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
6	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Β' - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Γ Φάση	10	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
7	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΙΕ' (ΚΑ + ΚΒ) - ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	Α Φάση	19	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
8	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΑ' - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ	Γ Φάση	14	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
9	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ' - ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	Γ Φάση	23	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
10	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Β' (ΚΑ + ΚΒ)	Γ Φάση	19	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
11	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Θ' (ΚΑ + ΚΒ) - ΚΑΨΑΛΟΥ	Α Φάση	10	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
12	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΓ' (ΚΑ+ΚΒ) - ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Α'	Γ Φάση	18	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
13	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΔ' - ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ	Γ Φάση	14	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
14	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑ' - ΚΟΝΤΟΒΑΘΕΙΑ	Γ Φάση	14	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
15	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΖ' - ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ	Α Φάση	20	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
16	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤ' (ΚΑ+ΚΒ) - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Γ Φάση	10	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
17	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ	Α Φάση	9	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
18	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ	Γ Φάση	0	MIDEA	Μη έναρξη εργασιών
19	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ	Γ Φάση	13	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
20	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Α'	Γ Φάση	16	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
21	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Β'	Γ Φάση	3	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
22	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Α'	Γ Φάση	15	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
23	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΩΝΑ Α'	Α Φάση	19	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
24	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΩΝΑ Β'	Γ Φάση	19	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
25	Λεμεσός	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΩΝΑ Γ'	Γ Φάση	11	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
26	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ	Γ Φάση	29	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
27	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ	Γ Φάση	14	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
28	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	Β Φάση	31	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
29	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ	Α Φάση	17	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
30	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ	Γ Φάση	33	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
31	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ	Β Φάση	19	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
32	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ	Γ Φάση	2	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
33	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	Γ Φάση	32	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
34	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ	Β Φάση	14	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
35	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ (Μέρος Β)	Γ Φάση	8	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
36	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ	Γ Φάση	23	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
37	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ	Β Φάση	19	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
38	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ	Γ Φάση	41	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
39	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ	Β Φάση	23	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
40	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Β	Γ Φάση	31	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
41	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΩΝΑ	Γ Φάση	29	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
42	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ	Γ Φάση	6	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
43	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΘΕΚΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ	Γ Φάση	14	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
44	Λεμεσός	Γυμνάσιο	ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ	Γ Φάση	20	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
45	Λεμεσός	Λύκειο	ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ	Β Φάση	60	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
46	Λεμεσός	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ	Β Φάση	30	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
47	Λεμεσός	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ	Β Φάση	22	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
48	Λεμεσός	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	Β Φάση	24	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
49	Λεμεσός	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Α Φάση	24	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
50	Λεμεσός	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ	Β Φάση	25	MIDEA	Εκκρεμεί Έλεγχος από ΔΗΚ
51	Λεμεσός	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ (Μέρος Β)	Γ Φάση	18	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
52	Λεμεσός	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ	Β Φάση	12	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
53	Λεμεσός	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ	Β Φάση	34	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
54	Λεμεσός	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ	Α Φάση	36	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
55	Λεμεσός	Λύκειο	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ	Γ Φάση	25	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
56	Λεμεσός	ΤΕΣΕΚ	Β' ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ	Γ Φάση	13	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
57	Λεμεσός	ΤΕΣΕΚ	Γ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ	Γ Φάση	25	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών

Σχολική Εφορία Λευκωσίας – Νηπιαγωγεία & Δημοτικά Σχολεία

Α/Α	ΕΠΑΡΧΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	Λευκωσία	Νηπιαγωγείο	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ	Α Φάση	5	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
2	Λευκωσία	Νηπιαγωγείο	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ	Β Φάση	5	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
3	Λευκωσία	Νηπιαγωγείο	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Γ'	Γ Φάση	1	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
4	Λευκωσία	Νηπιαγωγείο	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑΣ	Α Φάση	10	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
5	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ» (ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)	Α Φάση	20	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
6	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΡΩΝΑ	Γ Φάση	8	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
7	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ + ΚΒ)	Α Φάση	37	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
8	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑ + ΚΒ)	Β Φάση	25	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
9	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑ + ΚΒ)	Γ Φάση	25	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
10	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Γ Φάση	28	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
11	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α'	Γ Φάση	24	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
12	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β' (ΚΑ+ΚΒ)	Γ Φάση	27	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
13	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Γ'	Γ Φάση	14	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
14	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Γ'	Β Φάση	2	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
15	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ	Γ Φάση	21	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
16	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ΚΑ + ΚΒ)	Α Φάση	28	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
17	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΙΑΣ Ε' - ΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	Β Φάση	16	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
18	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΙΑΣ ΣΤ'	Α Φάση	29	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
19	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΙΑΣ Α' - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Γ Φάση	19	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
20	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΙΑΣ Δ'	Γ Φάση	27	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
21	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ	Γ Φάση	17	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
22	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΩΝΥΠΟΛΗΣ (ΚΑ+ΚΒ)	Γ Φάση	17	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
23	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ	Γ Φάση	22	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
24	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	Γ Φάση	18	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
25	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ	Γ Φάση	15	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
26	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ Α'	Γ Φάση	19	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
27	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ Β'	Γ Φάση	27	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
28	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΑ + ΚΒ)	Γ Φάση	30	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
29	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΝΕΙΟ	Β Φάση	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών	
30	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Γ' (ΚΑ + ΚΒ)	Α Φάση	38	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
31	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ	Β Φάση	14	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
32	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ Α'	Γ Φάση	11	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
33	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ Β'	Γ Φάση	19	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
34	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	Α Φάση	32	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
35	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Β' - ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ	Β Φάση	16	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
36	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Γ'	Β Φάση	12	MIDEA	Εκκρεμεί Έλεγχος από ΑΗΚ
37	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Δ' - ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	Γ Φάση	19	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
38	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Ε' - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ	Γ Φάση	24	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
39	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ ΣΤ' - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Β Φάση	13	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
40	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Α'	Γ Φάση	15	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
41	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Γ'	Γ Φάση	22	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
42	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Δ'	Γ Φάση	24	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
43	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ (ΚΑ + ΚΒ)	Α Φάση	34	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
44	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α'	Α Φάση	20	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
45	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Β'	Γ Φάση	21	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
46	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Γ' - ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ	Γ Φάση	30	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
47	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Β'	Γ Φάση	26	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
48	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Γ'	Γ Φάση	13	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
49	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ	Γ Φάση	17	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
50	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΑ+ΚΒ)	Γ Φάση	20	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
51	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ Α'	Γ Φάση	13	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
52	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ Β'	Γ Φάση	18	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
53	Λευκωσία	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑΣ (ΚΑ + ΚΒ)	Α Φάση	24	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών

Σχολική Εφορία Λευκωσίας – Γυμνάσια, Λύκεια, ΤΕΣΕΚ και Εξατάξια Σχολεία

A/A	ΕΠΑΡΧΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
54	Λευκωσία	Γυμνάσιο	Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΜΑΛΟΥΝΤΑ	Γ Φάση	29	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
55	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	Α Φάση	43	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
56	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ	Α Φάση	52	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
57	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ	Γ Φάση	39	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
58	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	Γ Φάση	38	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
59	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ	Γ Φάση	33	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
60	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ	Γ Φάση	41	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
61	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ	Γ Φάση	47	MIDEA	Εγκατάσταση κλιματιστικών
62	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ	Γ Φάση	12	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
63	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' - ΠΛΑΤΥ	Γ Φάση	38	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
64	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΙΟΥ	Γ Φάση	25	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
65	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΤΟΥ	Γ Φάση	39	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
66	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ	Γ Φάση	44	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
67	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ	Γ Φάση	43	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
68	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ	Γ Φάση	47	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
69	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ	Γ Φάση	41	GREE	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
70	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ	Γ Φάση	32	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
71	Λευκωσία	Γυμνάσιο	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ	Α Φάση	38	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
72	Λευκωσία	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ	Β Φάση	46	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
73	Λευκωσία	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ	Β Φάση	45	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
74	Λευκωσία	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ	Β Φάση	38	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
75	Λευκωσία	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ	Β Φάση	28	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
76	Λευκωσία	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ	Β Φάση	88	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
77	Λευκωσία	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ	Β Φάση	53	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
78	Λευκωσία	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ	Β Φάση	41	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
79	Λευκωσία	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Α'	Β Φάση	33	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
80	Λευκωσία	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β'	Β Φάση	38	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
81	Λευκωσία	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ	Β Φάση	36	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
82	Λευκωσία	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ	Α Φάση	46	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
83	Λευκωσία	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ	Β Φάση	19	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
84	Λευκωσία	Λύκειο	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ - Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ	Β Φάση	40	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
85	Λευκωσία	ΤΕΣΕΚ	Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ	Β Φάση	12	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
86	Λευκωσία	ΤΕΣΕΚ	Β' ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ	Β Φάση	23	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
87	Λευκωσία	ΤΕΣΕΚ	Γ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ	Β Φάση	34	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
88	Λευκωσία	Εξατάξιο	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ	Β Φάση	17	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες
89	Λευκωσία	Εξατάξιο	ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ	Β Φάση	54	MIDEA	Εκκρεμούν ηλεκτρολογικές εργασίες

Σχολική Εφορία Πάφου

A/A	ΕΠΑΡΧΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	Πάφος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ Β'	Α Φάση	13	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
2	Πάφος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΑΣ	Α Φάση	11	MIDEA	Εκκρεμεί Έλεγχος από ΑΗΚ
3	Πάφος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Η' - ΙΟΡΔΑΝΕΙΟ	Α Φάση	16	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
4	Πάφος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Θ' - ΚΟΥΠΑΤΕΙΟ	Α Φάση	20	MIDEA	Εκκρεμεί Έλεγχος από ΑΗΚ
5	Πάφος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Ι «ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ»	Α Φάση	21	MIDEA	Εκκρεμεί Έλεγχος από ΑΗΚ
6	Πάφος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΙΒ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»	Β Φάση	15	GREE	Εγκατάσταση κλιματιστικών
7	Πάφος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΙΓ	Β Φάση	20	GREE	Εγκατάσταση κλιματιστικών
8	Πάφος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ	Β Φάση	12	GREE	Εγκατάσταση κλιματιστικών
9	Πάφος	Δημοτικό	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ	Α Φάση	17	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
10	Πάφος	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α' ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ	Α Φάση	22	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
11	Πάφος	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ	Β Φάση	23	GREE	Εγκατάσταση κλιματιστικών
12	Πάφος	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑΣ	Β Φάση	26	GREE	Εγκατάσταση κλιματιστικών
13	Πάφος	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ	Α Φάση	23	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
14	Πάφος	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ	Β Φάση	25	GREE	Εγκατάσταση κλιματιστικών
15	Πάφος	Γυμνάσιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ	Β Φάση	26	GREE	Εγκατάσταση κλιματιστικών
16	Πάφος	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ Α' ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ'	Β Φάση	8	GREE	Εγκατάσταση κλιματιστικών
17	Πάφος	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	Α Φάση	19	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
18	Πάφος	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΝΑΚΗ ΤΑΛΙΩΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ	Β Φάση	37	GREE	Εγκατάσταση κλιματιστικών
19	Πάφος	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΠΑΣ	Β Φάση	37	GREE	Εγκατάσταση κλιματιστικών
20	Πάφος	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ	Β Φάση	7	GREE	Ολοκλήρωση Εργασιών
21	Πάφος	Λύκειο	ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ	Α Φάση	14	MIDEA	Ολοκλήρωση Εργασιών
22	Πάφος	Λύκειο	ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΦΟΥ	Β Φάση	6	GREE	Ολοκλήρωση Εργασιών
23	Πάφος	Εξατάξιο	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ	Β Φάση	23	GREE	Εγκατάσταση κλιματιστικών
